


PMR Public Report

Operation Number	BR-L1343	Chief of Operations Validation Date	10/18/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Programs of Opportunities and Rights in the state of Rio Grande do Sul	Loan Number	3241/OC-BR
Executing Agency	Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	PANTOJA VERA, RODRIGO ANDRES	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1343	50,000,000	50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00%	-
Aggregated	50,000,000	50,000,000	6,000,000	0	56,000,000	50,000,000	50,000,000	0.00%	-
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

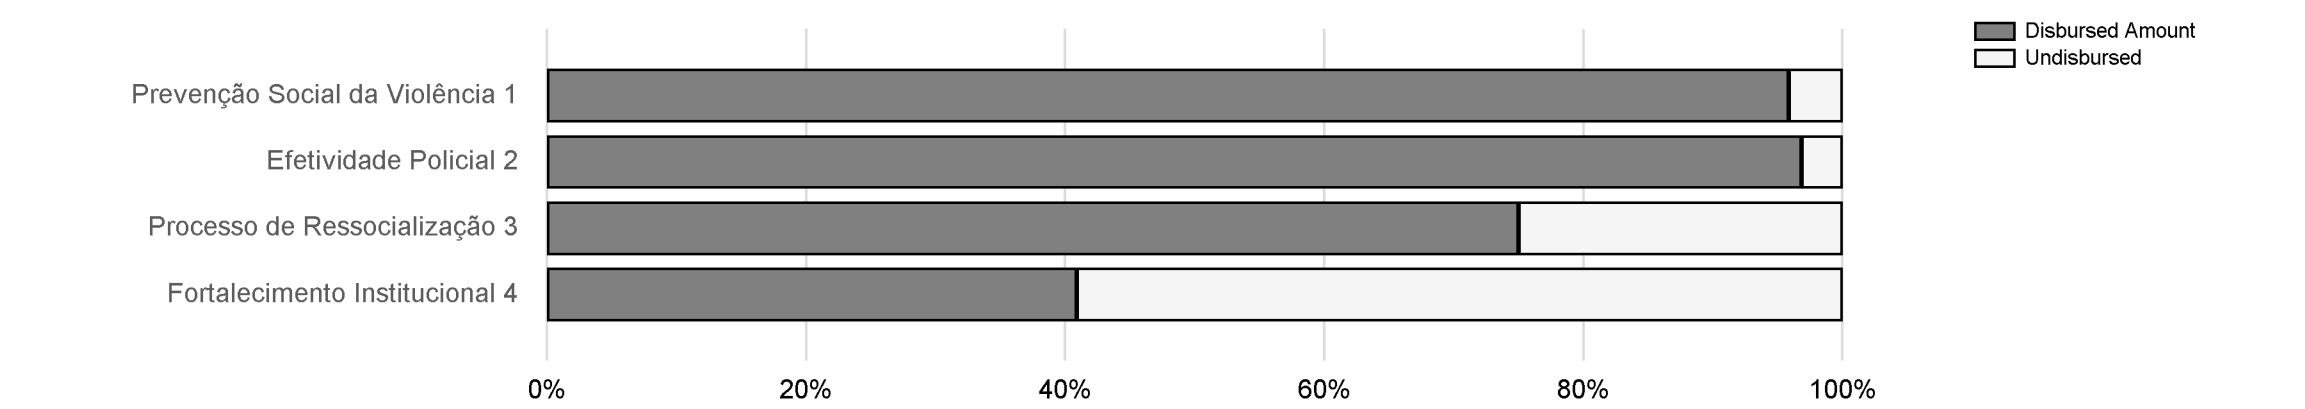

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã	Subnational governments (#)	0	2010		P	-
						A	3
Details							

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	Subnational governments benefited by citizen security projects (#) ()		
		Municipal				P	-
						A	-
		Subnational				P	-
						A	-

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir para a redução dos índices de criminalidade violenta entre jovens de 15 a 24 anos nos municípios de Alvorada, Porto Alegre e Viamão

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.1	Homicídios de jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA	taxa anual pcmh	88.8	2010		P	75.5
						A	29.99
Details							

Means of Verification: Ministério da Saúde: Datasus; Ministério da Justiça: Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública (SINESP)

Observations: O monitoramento deste e outros indicadores será realizado como parte da execução do Programa

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023
1.3	Roubos cometidos por jovens de 15 a 24 anos em ALV-POA-VIA			porcentagem	62	2010		
							P	50
							A	80
Details								

Means of Verification: SSP-RS, por meio de relatórios da DEC/DGEO

Observations: A proporção se refere aos roubos cometido spor jovens de 15 a 24 anos e que tiveram sua autoria esclarecida. Em 2010, houve um total de 1602 roubos.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Melhorar a inserção de jovens em situação de risco ao sistema educacional e ao mercado de trabalho

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2023
0.1	Jovens cursando o Ensino Médio que não abandonam a escola, nos territórios onde os professores são capacitados	Número	0	2010	P	8,900	-	13,500
					A	-	3,270	3,270

Details

Means of Verification: SJDH-RS

Observations: Este indicador refere-se aos jovens que ainda não abandonaram a escola. A meta será alcançada por meio da capacitação de 216 professores por ano. Cada professor trabalhará com a média de 30 alunos por ano, com a meta de que nenhum deles abandone a escola.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator		Unit of Measure			Baseline	Baseline Year	2018	2019	EOP 2023	
0.2	Jovens que completam o Ensino Fundamental por meio do programa de aceleração			Número	0	2010	P	1,200	-	4,800
							A	-	436	436

Details

Means of Verification: SJDH-RS

Observations: Este indicador se refere aos jovens que já abandonaram a escola. Participarão 1.000 jovens por centro a partir do segundo ano.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2018		2019	EOP 2023	
0.3	Jovens participantes do Programa em sua primeira experiência de trabalho formal			Número	0	2010	P	800	-	3,200
							A	-	324	-

Details

Means of Verification: SJDH-RS

Observations: Os beneficiários são jovens em situações de risco para os quais a experiência de trabalho reduzirá a possibilidade de se vincularem a atividades criminosas. Para facilitar a inserção ao mercado de trabalho, 2.000 jovens dos Centros POD Juventude por ano r

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar a efetividade da polícia no âmbito local

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2023
1.1	Cumprimento das recomendações das reuniões comunitárias sobre o desempenho da polícia nos territórios atendidos pelo Programa	%	0	2010	P	100	-	100
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Escritório de Projetos (SJDH-RS)								
Observations: Este indicador é evidência da efetividade do cumprimento, por parte da polícia, das recomendações registradas nas atas das reuniões mensais de coordenação com a comunidade.								

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

Specific Development Objectives Nbr. 2: Reduzir a taxa de reincidência da população jovem em conflito com a lei								
Observation:								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2023
2.0	Reincidência de adolescentes egressos da FASE que completaram um ano e meio de atendimento	Taxa	36	2010	P	32	-	25
					A	-	-	-
Details								

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator		Unit of Measure			Baseline	Baseline Year	2018	2019	EOP 2023	
2.1	Jovens de 15 a 21 anos que estiveram na FASE durante pelo menos um ano e meio e que completaram o Ensino Fundamental	%			15	2010	P	70	-	100
							A	-	-	-
Details										

Means of Verification: FASE

Observations: Em 2010 existiam 880 adolescentes na FASE, dos quais 15% tinham o Ensino Fundamental concluído. Jovens só podem entrar na FASE até os 18 anos, mas podem cumprir medidas até os 21 anos.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Means of Verification: FASE

Observations: Ainda não existe o programa de jovem aprendiz na FASE.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Melhorar a articulação dos serviços de prevenção e controle do crime destinados aos jovens em situação de alto risco								
Observation:								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	EOP 2023
3.1	Formulação por parte da SJDH-RS de políticas públicas de prevenção da violência juvenil usando dados do sistema integrado de distintos serviços de prevenção e controle do crime	Número	0	2012	P	-	-	2
					A	-	-	-
Details								

Means of Verification: SJDH-RS

Observations: As novas políticas serão formuladas tendo em conta os resultados do trablho multidisciplinário, coordenado e articulado pelas distintas entidades que desenvolvem atividades nos territórios do Programa e que compartilham informação num sistema integrado. O P

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Prevenção social e situacional da violência

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Centros POD Juventude construídos, equipados e funcionando com uma oferta de serviços socioeducativos, de formação para o trabalho e de cultura, esportes e recreação para jovens de 15 a 24 anos	Centros	P	-	6	-	9,000,000
			P (a)	4	6	2,643,553.25	19,624,226.63
			A	1	3	887,346.24	17,868,019.62
1.02	Professores das escolas nos territórios capacitados em ações destinadas à conclusão escolar do Ensino Médio	# of public officials	P	-	1,780	-	1,000,000
			P (a)	-	1,795	13,816.9	727,150.23
			A	-	1,795	13,333.33	726,666.66
1.03	Programa de capacitação de jovens aprendizes e primeira experiência de trabalho formal	programas	P	-	21	-	1,600,000
			P (a)	-	33	-	1,200,000
			A	-	33	-	1,200,000
1.04	Programa de aceleração para completar o Ensino Fundamental	programas	P	-	21	-	3,300,000
			P (a)	-	34	-	1,100,000
			A	-	34	-	1,100,000
1.05	Bolsas para jovens atuarem como promotores dos Centros de Juventude - POD	bolsas	P	-	1,700	-	1,800,000
			P (a)	25	1,700	672,224.97	1,840,785.46
			A	330	2,005	401,775.77	1,570,336.26
1.06	Foros estabelecidos para coordenar e gestionar as redes sociais de atenção aos jovens de 15 a 24 anos no território	foros	P	-	6	-	900,000
			P (a)	1	8	16,912.44	499,969.96
			A	-	7	11,816.26	494,873.78
1.07	Espaços públicos reformados para permitir a acessibilidade a jovens com deficiências físicas nas comunidades de Alvorada, Porto Alegre e Viamão	espaços	P	-	6	-	1,000,000
			P (a)	6	6	-	150,000
			A	1	1	-	150,000

Component Nbr. 2 Eficácia policial

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Formação de efetivos policiais que atuarão em serviços de polícia comunitária em Alvorada, Porto Aelgre e Viamão	# of public officials	P	-	1,200	-	850,000
			P (a)	-	1,356	-	979,394.42
			A	-	1,356	-	979,394.42
2.02	Sistema modernizado e integrado de gestão para a polícia, incluindo capacitação e formação para seu uso e em análise criminológica	Sistema	P	-	1	-	1,400,000
			P (a)	-	1	29,685.74	620,009.91
			A	-	1	20,244.99	610,569.16
2.03	Bases comunitárias integradas com Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e Conselhos Comunitários	bases	P	-	6	-	3,500,000
			P (a)	-	5	92,491.82	2,415,332.83
			A	-	5	15,582.6	2,338,423.61
2.04	Certificação do adequado funcionamento do controle interno da polícia nos territórios do Programa	certificação	P	-	9	-	250,000
			P (a)	1	9	28,158.65	373,444.19
			A	-	8	-	345,285.54

Component Nbr. 3 Modernização do processo de ressocialização

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Construção e implementação de novos centros socioeducativos e reforma do centro de capacitação Padre Cacique em Porto Alegre	Centros	P	-	4	-	21,700,000
			P (a)	1	4	3,699,479.24	16,785,456.61
			A	-	1	1,700,026.43	12,989,459.83
3.02	Sistema de planejamento estratégico e de gestão administrativa, orçamentária e financeira integrada em função de resultados	Sistema	P	-	1	-	500,000
			P (a)	1	2	132,147	4,005,686.92
			A	1	2	119,212.06	3,992,751.98
3.03	Capacitação de servidores da FASE para preencher as lacunas de conhecimento e competências requeridas para o desenho e implementação dos Planos Individuais de Atenção	# of public officials	P	-	1,200	-	1,100,000
			P (a)	-	1,248	-	439,284.8
			A	-	1,248	-	439,284.8
3.04	Processos de atenção e monitoramento do progresso individual dos adolescentes, fortalecido a partir do desenho e implementação dos PIAs, Planos coletivos, vinculação com as famílias e comunidades, avaliação de progresso dos adolescentes e do acompanhamento	processo	P	-	1	-	700,000
			P (a)	1	2	1,089,351.7	2,318,513.61
			A	1	2	740,740.74	1,969,902.65
3.05	Sistemas de video-monitoramento em unidades da FASE	Sistema	P	-	1	-	1,000,000
			P (a)	-	2	121,399.48	1,121,399.48
			A	-	2	-	1,000,000

Component Nbr. 4 Fortalecimento institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
4.01	Elaboração de planos estratégicos e operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento nos territórios do Programa	Planos	P	-	5	-	650,000
			P (a)	1	5	288,461.54	506,960.54
			A	-	-	-	218,499
4.02	Elaboração e implementação de um sistema de gestão de processos e monitoramento de atividades e produtos do Programa	Sistema	P	-	1	-	1,400,000
			P (a)	-	1	30,829.63	658,733.37
			A	-	1	17,566.23	645,469.97
4.03	Elaboração e implementação de um sistema de monitoramento dos serviços de proteção aos direitos, por meio da implementação de uma central de denúncias (observatório)	Sistema	P	-	1	-	650,000
			P (a)	1	1	106,731.18	330,067.04
			A	-	-	33,041.14	256,377
4.04	Seminários de articulação, coordenação, informação e consulta entre as entidades participantes do Programa	seminários	P	-	17	-	500,000
			P (a)	1	19	52,981.3	489,723.26
			A	-	18	23,571.22	460,313.18
4.05	Sede da SUSEPE equipada e mobiliada	Relatórios	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	855,346.08	855,346.08
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 5 Gestão do Programa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
5.01	Avaliações do Programa (de impacto, intermediária, final, econômica ex post, pesquisas de vitimização), Monitoramento e Supervisão do Programa, e equipamento para o EP	Relatório	P	-	10	-	3,200,000
			P (a)	1	10	309,237.14	2,841,303.42
			A	-	9	79,206.23	2,611,272.51

Total Cost					
	Total Cost	P	0	56,000,000	
		P (a)	10,182,808.06	59,882,788.76	
		A	4,063,463.24	51,966,899.97	

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Human Resources
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Mitigated		Planning
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		-	
	9.2	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Mitigated		Integrity
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		-	
	12.2	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy	
15	Mitigated		Systems	
	Response Actions			
	15.1	Management Strategy	Status	
		-		
	15.2	Management Strategy	Status	
		-		

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy	
18	Mitigated		Sustainability	
	Response Actions			
	18.1	Management Strategy	Status	
		-		
	18.2	Management Strategy	Status	
		-		

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy	
21	Mitigated		Fiduciary	
	Response Actions			
	21.1	Management Strategy	Status	
		-		
	21.2	Management Strategy	Status	
		-		

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy	
24	Mitigated		Integrity	
	Response Actions			
	24.1	Management Strategy	Status	
		-		
	24.2	Management Strategy	Status	
		-		

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Active		Technical Design
	Response Actions		
	27.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Active		Sustainability
	Response Actions		
	30.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
33	Materialized		Public Management and Governance
	Response Actions		
	33.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
36	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	36.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
