


# PMR Public Report

Operation Number	CO-L1261	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Develop 21st Century Skills in Colombian Adolescence and Youth	Loan Number	5187/OC-CO
Executing Agency	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Sector/Subsector	EDUCATION-SCHOOL-TO-WORK TRANSITION
Team Leader	MARAGALL, JUAN ERNESTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
CO-L1261	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	22,491,685.91	44.98%	27,508,314.09
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	22,491,685.91	44.98%	27,508,314.09

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)
---

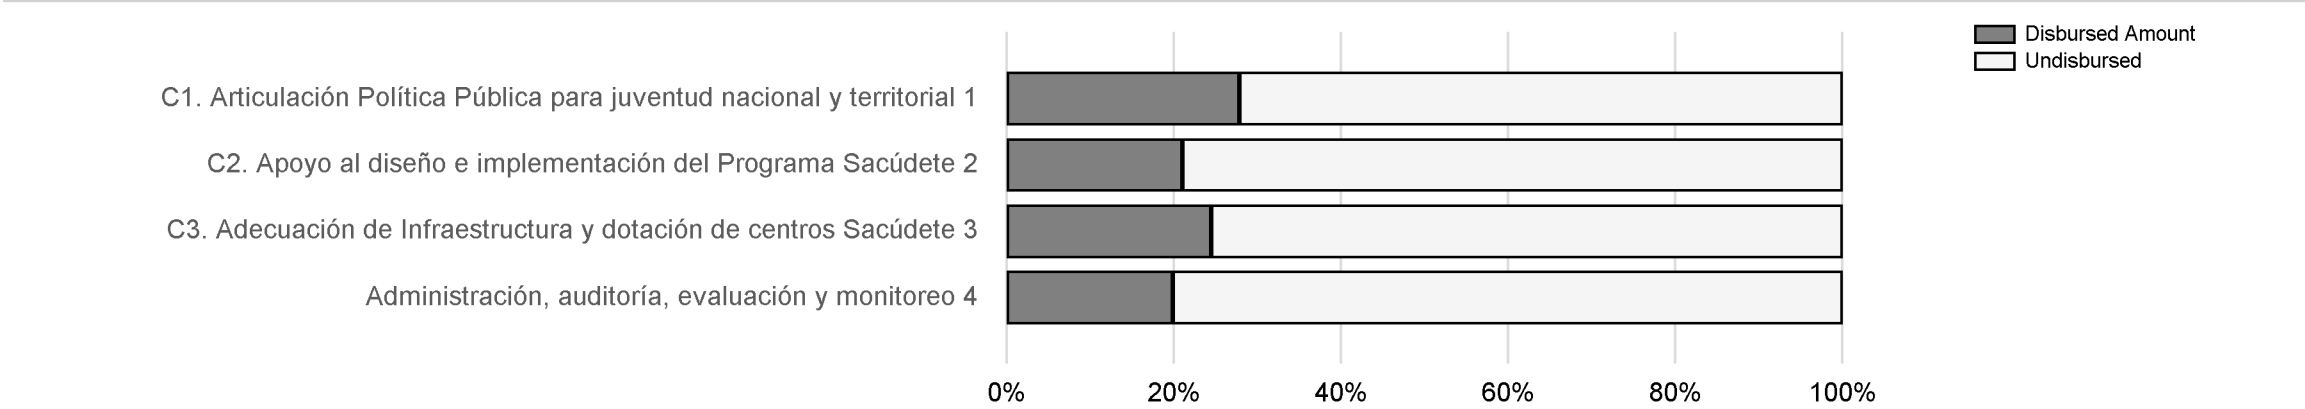

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Apoyar en los adolescentes y jóvenes colombianos el desarrollo de habilidades necesarias para formular e impulsar sus proyectos de vida y convertirse en agentes de cambio social y económico

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.0	Diferencia en el puntaje de las pruebas entre los jóvenes y adolescentes que participan en Sacúdete y los que no participan (en desviaciones estándar).	Desviación estándar	0	2021	2024	P	15
						A	-

Details

**Means of Verification:** Plataforma CLIC - BID

**Observations:** Este es un sistema de información que opera actualmente y que está orientado a apoyar la gestión y recolección de información de los servicios que ofrece el ICBF en el territorio nacional. El ingreso de los datos de forma oportuna al sistema de información hace parte del proceso de atención a la población que ofrece el ICBF y permite identificar a los beneficiarios que, por su condición de vulnerabilidad, requieren acceder de forma prioritaria a los servicios. La información se generará a través de la plataforma de evaluación de habilidades del BID.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.1	Diferencia en el porcentaje de graduados de secundaria entre los jóvenes y adolescentes que participan en Sacúdete y los que no participan.	Puntos porcentuales	0	2021	2024	P	5
						A	-
Details							

**Means of Verification:** Sistema de Información Cuéntame, ICBF

**Observations:** Seguimiento por enfoque diferencial.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico 1: Fomentar el fortalecimiento y articulación institucional para la consolidación de la política pública para la juventud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	1.1 Estrategia de articulación de los territorios con la Política Nacional de Juventud diseñada e implementada.	Documento	0	2020	P	1	1	1	1	1
					A	1	-	-	-	1

Details

Means of Verification: Reporte anual de Implementación de la estrategia de articulación con Entes Territoriales

Observations: La implementación de la política se verifica mediante cambios en lineamientos adoptados en las políticas de las entidades territoriales.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Disaggregation		H1. Documento de estrategia de apoyo a entes territoriales	P	1	-	-	-	1		
			A	1	-	-	-	-		
		H2. Sesiones de socialización del Documento CONPES “Estrategia para promover el Desarrollo Integral de la Juventud” dirigido a los 32 departamentos y el Distrito Capital	P	2	-	-	-	2		
			A	2	-	-	-	-		
		H3. Documento de contenidos para apoyo técnico en el proceso de elaboración de políticas territoriales de juventud.	P	-	1	-	-	1		
			A	-	-	-	-	-		
		H4. Número de entes territoriales que expiden su política de juventud	P	-	-	-	5	5		
			A	-	-	-	-	-		
		H5. Número de entes territoriales que actualizan su política de juventud	P	-	-	-	5	5		
			A	-	-	-	-	-		
		H6. Número de entes territoriales que reciben acompañamiento para el diseño de su política de juventud	P	5	5	5	5	20		
			A	4	-	-	-	-		

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo específico 2: Implementar la estrategia “Sacúdete” como programa nacional por medio del cual los adolescentes y jóvenes desarrollan las habilidades para formular e impulsar con éxito sus proyectos de vida.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	2.1 Jóvenes beneficiados con el programa Sacúdete.	# of students	60000	2020	P	50,000	50,000	34,000	34,000	168,000
					A	28,854	32,860	-	-	61,714

Details

Means of Verification: Sistema de Información Cuéntame, ICBF

Observations: Seguimiento por enfoque diferencial. Los beneficios se asocian con los aprendizajes de los jóvenes.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.1 Students benefited by education projects (#) (C)					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.1	2.2 Emprendimientos individuales y sociales formulados.	# of MSMEs	1000	2020	P	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
					A	1,012	651	-	-	1,663

Details

Means of Verification: Sistema de Información Cuéntame, ICBF

Observations: Seguimiento por enfoque diferencial. En este indicador, la formulación implica haber tomado acciones concretas (haber definido un proyecto, haber aplicado a becas de estudio o a créditos empresariales).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.9 Micro, small, medium enterprises financed (#) (C)					
------------	----	---------------	----	---------------	---	--	--	--	--	--

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.2	2.3 Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para el apoyo a oportunidades de empleabilidad y emprendimiento de jóvenes suscritas	Alianzas	0	2020	P	10	10	10	10	40
					A	10	9	-	-	19
Details										

**Means of Verification:** Contratos, convenios, acuerdos de entendimiento y declaraciones de intención suscritas

**Observations:** Contratos, convenios, acuerdos de entendimiento y declaraciones de intención suscritas con el ICBF.

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Articulación de la política de juventud nacional y territorial.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	P. 1.1. Documento de Política Nacional de Juventud publicado.	Documento	P	-	1	257,643.65	870,000
			P (a)	-	1	190,550.27	870,000
			A	-	1	37,565.15	262,667.15

Component Nbr. 2 Componente 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	P. 2.1 Documento de Fases metodológicas del Modelo Sacúdete publicado.	Documento	P	-	1	414,328	713,248
			P (a)	-	1	362,751.6	713,248
			A	-	-	81,922.57	288,955.57
2.02	P. 2.2 Cursos virtuales activados en la plataforma.	Cursos Virtuales	P	15	60	4,927,137.65	20,222,747
			P (a)	15	60	4,060,616.58	20,222,747
			A	15	30	709,180.91	1,035,697.91
2.03	P. 2.3 Centros Sacúdete operando.	Centros	P	20	20	2,580,362	2,580,362
			P (a)	20	20	2,580,362	2,580,362
			A	-	-	-	-
2.04	P. 2.4 Nodos Sacúdete operando.	Nodos	P	36	126	5,196,721	21,774,906
			P (a)	36	126	4,763,001	21,774,906
			A	31	86	2,728,014.26	8,829,167.26

Component Nbr. 3 Componente 3: Adecuación de infraestructura y dotación de centros sacúdete.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	P. 3.1 Centros Sacúdete adecuados.	Centros	P	7	7	588,446.38	2,025,292
			P (a)	7	7	1,988,373.37	2,194,292
			A	-	-	13,199.1	32,853.81
3.02	P. 3.2 Centros Sacúdete dotados de mobiliario y equipos y servicios tecnológicos.	Centros	P	7	7	152,886.5	305,773
			P (a)	7	7	136,773	136,773
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración-Auditoría-Evaluación y Monitoreo	P	429,361	1,507,672
		P (a)	375,921.98	1,507,672
		A	90,650.2	313,176.76

Total Cost				
	Total Cost	P	14,546,886.18	50,000,000
		P (a)	14,458,349.8	50,000,000
		A	3,660,532.19	10,762,518.46

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Sustainability
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Sustainability
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Sustainability
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Sustainability
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	30.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
33	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	33.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE



Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
36	Active		Sustainability
	Response Actions		
	36.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
39	Active		Sustainability
	Response Actions		
	39.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
42	Materialized		Sustainability
	Response Actions		
	42.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
45	Active		Sustainability
	Response Actions		
	45.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Project Management Capacity
Intra/Inter Coordination
Project Design
Environmental and Social Factors
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Legal aspects and public processes
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Project Monitoring & Evaluation
