

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1187	Chief of Operations Validation Date	10/25/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/25/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Civic Coexistence and Neighborhood Improvement Program	Loan Number	4518/BL-HO, 4518/BL-HO-1, 4518/BL-HO-2, 4518/BL-HO-3
Executing Agency	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT
Team Leader	VILLA MAR, KARELIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	06/29/20
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las Agencias Ejecutoras (AEs) continúan con el cumplimiento de los requerimientos de salvaguardias de los componentes del Programa. Se han elaborado las evaluaciones socioambientales junto con sus planes de gestión y realizada las consultas significativas. Las AEs muestran su disposición y flexibilidad para el cumplimiento de las Políticas del Banco y están implementando adecuadamente los planes.		

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HO-L1187	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	47,685,000	79.48%	12,315,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	47,685,000	79.48%	12,315,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

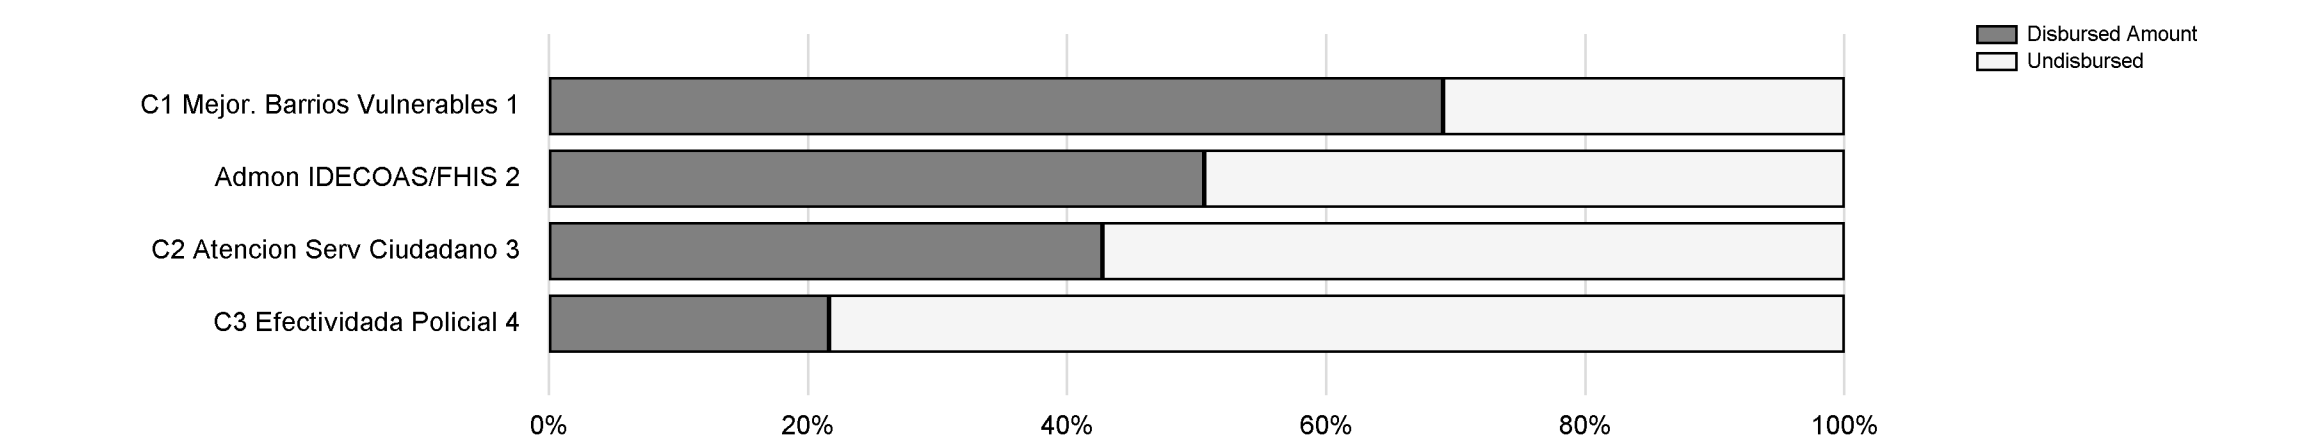

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: IMPACTO ESPERADO: la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Indicador 1. Viviendas con 3 Necesidades Básicas Insatisfechas por clasificación de pobreza (NBI) en áreas urbanas de Honduras	Porcentaje	3.08	2018	2022	P	2.63
						A	-

Details

Means of Verification: Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observations: Total de hogares urbanos en Honduras en 2016: 666.627, total de hogares con 3 o más NBI 20.525

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.1	Homicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras			Tasa	59.05	2016	2022	P	45
								A	-
Details									

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.2	Femicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras			Tasa	7.11	2015	2022	P	6
								A	-
Details									

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.3	Victimización personal reportada en Honduras			Porcentaje	16	2017	2022	P	15
								A	-
Details									

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.4	Confianza de la ciudadanía hondureña en la Policía (mucha o algo)			Porcentaje	36.8	2015	2022	P	45
								A	-
Details									

Means of Verification: Encuesta Latinobarómetro

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.5	Número de muertes provocada por COVID-19			# of beneficiaries	8370	2020	2022	P	10,500
								A	-
Details									

Means of Verification: Subsistema de Vigilancia de la mortalidad de Covid-19 de la SESAL

Observations: Este dato es oficializado por SINAGER

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)				
		Male				P	6,615		
						A	-		
		Female				P	3,885		
						A	-		
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023		
0.6	Casos de COVI-19 confirmados			# of beneficiaries	9300	2020	2022	P	390,000
								A	-
Details									

Means of Verification: Subsistema de Vigilancia de la mortalidad de Covid-19 de la SESAL

Observations: Este dato es oficializado por SINAGER

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)			
		Male				P	191,100	
						A	-	
		Female				P	198,900	
						A	-	

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 0: RESULTADO #1: Mejorar el acceso a los servicios básicos en barrios vulnerables intervenidos y disminuir delitos violentos como robos y delitos sexuales.												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Viviendas con conexión de agua potable en los barrios intervenidos	Porcentaje	35	2017	P	-	-	-	-	54	92	92
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe de supervisión de obras												
Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Viviendas con conexión de alcantarillado en los barrios intervenidos	Porcentaje	2	2017	P	-	-	-	-	54	92	92
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe de supervisión de obras												
Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Viviendas cubiertas con alumbrado público en los barrios intervenidos	Porcentaje	63	2017	P	-	-	-	-	-	92	92
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe de supervisión de obras												
Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Vías pavimentadas en los barrios intervenidos.	Porcentaje	0	2017	P	-	-	-	-	50	100	100
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe de supervisión de obras												
Observations: En MDC existen 2.000 kilómetros de vías. El programa planea pavimentar 24 kilómetros incluyendo, gradas, rampas y calles vehiculares												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								

0.4	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
		Cobertura de viviendas que cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos (basura), en los barrios intervenidos.	Porcentaje	75	2017	P	-	-	-	-	85	95	95	
						A	-	-	-	-	-	-	-	
Details														
Means of Verification: Informe de cierre de PCR.														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.5	Población que ha cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de violencia, que afectan la calidad de vida negativamente, en los barrios intervenidos, en los últimos 12 meses		Porcentaje	56	2017	P	-	-	-	-	50	45	45	
A						-	-	-	-	-	-	-		
Details														
Means of Verification: EMUV														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.6	Prevalencia de Robos en los barrios intervenidos para personas de 18 años y mayores		Porcentaje	28	2017	P	-	-	-	-	25	20	20	
A						-	-	-	-	-	-	-		
Details														
Means of Verification: EMUV														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.7	Prevalencia de delitos sexuales por cada 1,000 mujeres en los barrios intervenidos		Tasa	3.8	2016	P	-	-	-	3.4	3	3	3	
A						-	-	-	-	-	-	-		
Details														
Means of Verification: SEPOL y Observatorios														
Observations: 14 delitos sexuales y 3.600 mujeres y niñas residentes														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Specific Development Objectives Nbr. 1: RESULTADO ESPERADO 2: Reducción de homicidios y VIF en los municipios beneficiados														
Observation:														
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
1.0	Prevalencia de VIF en las áreas intervenidas		Porcentaje	5.43	2017	P	-	-	-	-	-	5	5	
A						-	-	-	-	-	-	-		
Details														

Means of Verification: Encuesta de Marginación urbana y Violencia

Observations: Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Proporción de víctimas que denuncia un delito de VIF en las áreas intervenidas	Porcentaje	21.7	2017	P	-	-	-	-	25	25
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de Marginación urbana y Violencia

Observations: Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Número de víctimas de VIF que utilizan los servicios de atención con profesionales multidisciplinarios de VIF en las áreas intervenidas de forma anual	Número	700	2017	P	-	-	-	-	-	850	850
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros de atención en DPI bajo la estrategia MAIE

Observations: Distrito Central y SPS que realizan denuncias en instalaciones DPI MAIE

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en zonas intervenidas	Tasa	94	2016	P	-	-	-	-	-	85	85
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) y UTECI

Observations: Distrito Central y SPS

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: RESULTADO ESPERADO 3: Mejora de los niveles de efectividad policial a través del incremento de casos de homicidio con autor identificado e informe criminalístico aceptado por el Ministerio Público

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Número de graduados de la ANAPO formados en la nueva currícula por competencias	Número	0	2017	P	-	-	-	-	-	80	80
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe Academia Nacional de Policía (ANAPO)

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
-------------------	----	----------------------	----	---------------	--

4.3	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023											
	Porcentaje de boletines epidemiologicos con datos COVID-19 publicados durante el total de las semanas epidemiologicas			Porcentaje	100	2020	P	-	-	-	100	-	-	100										
A															-	-	-	100	-	-	100			
Details																								
Means of Verification: Informe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la SESAL																								
Observations:																								
Evaluation Methodology: -																								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																				
Indicator															Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.4	Porcentaje de establecimientos de primer nivel de atencion de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmados que cuentan con capacidad de triage			Porcentaje	0	2020	P	-	-	-	100	100	-	100										
							A	-	-	-	100	-	-	100										
Details																								
Means of Verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)																								
Observations:																								
Evaluation Methodology: -																								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																				
Indicator															Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.5	Porcentaje de establecimiento de atencion de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmado que cuenten con capacidad de aislamiento			Porcentaje	0	2020	P	-	-	-	100	100	-	100										
							A	-	-	-	100	-	-	100										
Details																								
Means of Verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)																								
Observations:																								
Evaluation Methodology: -																								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																				
Indicator															Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.6	Porcentaje de casos confirmados de pacientes hospitalizados que reciben tratamiento de conformidad con el protocolo del país.			Porcentaje	0	2020	P	-	-	-	60	-	-	60										
							A	-	-	-	100	-	-	100										
Details																								
Means of Verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)																								
Observations:																								
Evaluation Methodology: -																								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente #1: Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y pavimentación), completados y siendo utilizados	Proyectos	P	4	9	2,049,003	9,471,257
			P (a)	-	9	2,049,003	10,474,000
			A	-	4	772,899	8,910,038
1.02	Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados	Número de asistencias	P	2,000	9,600	427,625	2,745,366
			P (a)	1,940	9,600	427,625	2,604,919
			A	204	4,856	204,239	2,011,464
1.03	Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo	# of women	P	250	700	-	68,000
			P (a)	51	350	-	140,081
			A	66	365	-	140,081

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Servicios de atención integral para VIF en las DPI intervenidas, en funcionamiento de acuerdo con el protocolo de servicios	Número de servicios	P	2	2	-	20,000
			P (a)	2	2	-	3,530
			A	-	-	-	3,530
2.02	Estaciones policiales construidas con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones	P	6	6	3,234,197.93	21,879,377.86
			P (a)	3	4	9,535,949.23	20,988,621.23
			A	-	-	2,869,530.75	10,622,222.75
2.03	Estaciones policiales existentes con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones policiales	P	16	16	-	103,850
			P (a)	16	16	10,000	10,000
			A	-	-	-	-
2.04	Protocolo de actuación de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	protocolos	P	-	1	-	20,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-
2.05	Curso de capacitación para la implementación del protocolo de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	cursos	P	-	1	-	10,000
			P (a)	-	2	-	3,529.71
			A	-	2	-	3,529.71
2.06	Documento de cartera de servicios policiales elaborado	Documento	P	-	1	-	60,000
			P (a)	-	1	74,900	149,000
			A	-	1	74,900	149,000
2.07	Unidades Móviles de servicios policiales, operando	Número de unidades	P	1	1	-	165,980
			P (a)	-	5	-	165,980
			A	-	5	-	165,980
2.08	Cursos impartidos por la policía a jóvenes y familias en temas de violencias, denuncias y derechos humanos	Personas	P	-	450	29,056	766,189.64
			P (a)	-	450	29,056	719,979
			A	-	450	60,123.15	751,046.15
2.09	Equipo multidisciplinario contratado para la mejora del análisis de datos en la subsecretaría de asuntos interinstitucional	Equipo	P	1	1	-	145,375
			P (a)	1	1	-	132,551
			A	-	-	-	132,551
2.10	Gobiernos municipales capacitados para análisis de datos y elaboración de planes locales	Subnational governments (#)	P	20	30	-	280,325.65
			P (a)	20	35	-	174,288
			A	-	15	-	174,288
2.11	Estrategia de comunicación fortalecida.	Consultoria	P	1	1	25,366	104,366
			P (a)	1	2	25,366	54,366
			A	-	1	18,520.4	47,520.4
2.12	Estaciones policiales remodeladas con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	numero de estaciones policiales	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	93,867
			A	-	1	-	93,867

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Sistema de Formación y Profesionalización Policial articulado y funcionado	Documento	P	1	1	545,280	2,505,013.08
			P (a)	1	1	545,280	2,495,885.08
			A	-	-	134,177.06	2,084,782.14
3.02	Academia Nacional de Policía diseñada.	Government agencies (#)	P	-	1	-	881,190
			P (a)	-	1	-	881,190
			A	-	1	-	881,190
3.03	Programa de capacitación y especialización continua en IC, diseñado y efectuado	Programa	P	1	1	-	1,187,178
			P (a)	1	1	-	1,121,030
			A	-	-	-	1,121,030

Component Nbr. 4 Componente # 4 Mejoramiento a la capacidad de provision de servicios de salud

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
4.01	Plan para la contención y respuesta del COVID-19 en Honduras fortalecido	Plan	P	-	1	-	95,542.01
			P (a)	-	1	-	75,313.33
			A	-	1	-	75,313.33
4.02	Estrategia para el uso de soluciones digitales en el marco del Plan Nacional de Respuesta al COVID-19 implementado	Estrategia	P	-	1	33,093.96	87,093.96
			P (a)	1	1	33,093.96	54,000
			A	1	1	13,508.18	34,414.22
4.03	Sala situacional para la coordinación y conducción del Plan de Contención y Respuesta del COVID-19	Sala	P	-	1	-	30,000
			P (a)	-	1	-	30,000
			A	-	1	-	30,000
4.04	Sistema de Información Integrado de Salud (SIIS) Fortalecido	Sistema	P	-	4	41,386.17	131,386.17
			P (a)	4	6	41,386.17	90,000
			A	4	6	43,635.07	92,248.9
4.05	Número de equipos de respuesta rápida para la búsqueda activa y detección de casos que operan en el terreno	Equipos	P	-	20	-	2,071,000
			P (a)	-	20	-	2,071,000
			A	-	20	-	2,071,000
4.06	Número de laboratorios que recibieron equipo e insumos para la realización de diagnósticos	Laboratorios	P	-	3	2,274.3	1,434,474.3
			P (a)	-	3	2,274.3	1,432,200
			A	-	3	-	1,429,925.7
4.07	Aplicativos informáticos para fortalecer el Sistema de Información Integral de Salud (SIIS)	aplicativo	P	-	1	18,000	36,000
			P (a)	-	1	18,000	18,000
			A	-	1	18,000	18,000
4.08	Plan de comunicación para el cambio de comportamiento social y de comunicación de riesgos ejecutado	Plan	P	-	1	3,091.4	246,891.4
			P (a)	-	1	3,091.4	254,169.48
			A	-	1	-	251,078.08
4.09	Plan de capacitación para la aplicación de protocolos y atención de victimas de violencia contra la mujer en el contexto de la emergencia incluyendo violencia doméstica y sexual elaborado	Plan	P	-	1	8,400	28,400
			P (a)	1	1	8,400	8,400
			A	-	-	-	-
4.10	Número de establecimientos disponibles para brindar cuidados a los pacientes con COVI-19 financiados a través de los convenios de gestión de primer nivel de atención	Establecimientos	P	-	15	-	7,039,999.99
			P (a)	-	15	-	8,395,949.94
			A	-	15	-	8,395,949.94
4.11	Número de unidades de salud equipados para la atención de pacientes COVID-19	Unidades de Salud	P	-	2	-	503,000
			P (a)	-	2	-	503,000
			A	-	2	-	503,000
4.12	Numero de regiones de salud que usan telemedicina para el seguimiento y cuidado de pacientes	regiones de salud	P	-	3	108,285.28	311,285.28
			P (a)	3	5	108,285.28	203,000
			A	-	2	-	94,714.72
4.13	Unidades de salud habilitados con insumos y equipos para el manejo de desechos asociados que estan tratando el COVID-19	Unidades de Salud	P	-	4	604,049.42	2,564,049.42
			P (a)	4	4	604,049.42	604,049.42
			A	3	3	48,325.37	48,325.37

Other Cost				
	Administracion IDECOAS/FHIS	P	312,894	1,581,303.47
		P (a)	375,500	1,781,000

	Administracion IDECOAS/FHIS	A	139,336	1,157,615
	Administracion SEDS	P	574,333	2,186,647.77
		P (a)	750,198	3,006,182.98
		A	171,446.29	1,393,951.27
	Gastos Unidad Ejecutora GESALUD	P	0	354,902.08
		P (a)	72,575.94	380,673.67
		A	38,447.83	346,545.56
	Evaluacion Operativa RISP-HO	P	0	40,000
		P (a)	40,000	40,000
		A		0
	Contratacion Agencia Compras PNUD	P	0	759,275.92
		P (a)	0	759,275.92
		A		759,275.92
	Auditoria Aseguramiento Razonable a los fondos entregados a gestores descentralizados para la atencion de la Pandemia del COVID-19	P	0	40,280
		P (a)	20,000	50,131.73
		A		30,131.73
	Auditoria del Programa RISP-HO	P	0	45,000
		P (a)	15,429.52	30,836.51
		A		15,406.99
Total Cost				
	Total Cost	P	8,016,335.46	60,000,000
		P (a)	14,789,463.22	60,000,000
		A	4,607,088.1	44,039,016.88

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Inactive		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	3.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Human Resources
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Legal Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Sustainability
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Natural Environment
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Active		Sustainability
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	30.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
33	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	33.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
36	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	36.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
39	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	39.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
42	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	42.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
45	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	45.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
47	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	47.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Stakeholder Priorities
