


PMR Public Report

Operation Number	PE-L1231	Chief of Operations Validation Date	10/17/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Project to Boost Efficiency in Public Investment Management and Public Procurement	Loan Number	4428/OC-PE, 4428/OC-PE-1, 4428/OC-PE-2
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  , ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	RADICS, GUSTAVO AXEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PE-L1231	65,000,000	65,000,000	8,750,000	0	73,750,000	65,000,000	15,928,217.13	24.50%	49,071,782.87
Aggregated	65,000,000	65,000,000	8,750,000	0	73,750,000	65,000,000	15,928,217.13	24.50%	49,071,782.87

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)
---

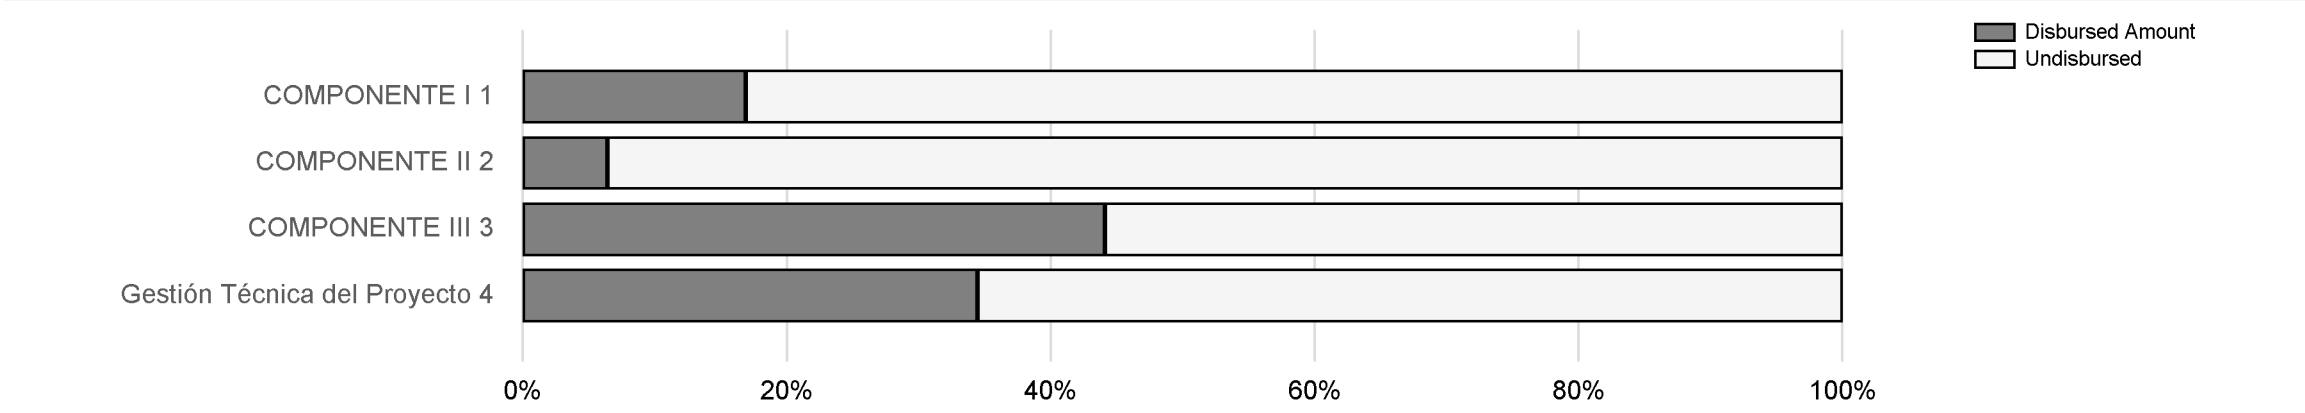

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX								
General Development Objectives								
General Development Objectives Nbr. 0: Disminuir las brechas de inversión (cobertura de servicios e infraestructura) en los sectores salud, educación, agua y saneamiento y transporte								
Observation: Las brechas de mediano plazo de estos sectores alcanzan 20% del PIB (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, 2015)								
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.0	Población con acceso a seguro de salud.		%	73	2015	2024	P	93
							A	-
Details								
Means of Verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)								
Observations:								
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.1	Tasa neta de matrícula escolar de la población de 3-5 años de edad a educación inicial.		%	80.1	2015	2024	P	96
							A	-
Details								
Means of Verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)								
Observations:								
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.2	Tasa de acceso a agua potable.		%	83.8	2015	2024	P	98
							A	-
Details								
Means of Verification: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)								
Observations:								
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.3	Red Vial Nacional (RVN) pavimentada.		%	87.7	2014	2024	P	95
							A	-
Details								
Means of Verification: Ministerio de Transportes y Comunicaciones								

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Incremento del porcentaje de proyectos formulados alineados con la reducción de brechas.

Observation: Línea Base: Monto de proyectos ejecutados (devengados) alineados con cadenas priorizadas de la inversión pública = S/. 19.645 millones. Monto total de proyectos ejecutados (devengados) = S/. 27.816 millones. Se tomó como proxy de alineamiento a brechas, a los proyectos de inversión pública que están alineados a las cadenas de gasto presupuestal (función-programa-subprograma) priorizadas por brechas, según lo definido por cada sector. Fuente: DGIP.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Monto de proyectos ejecutados alineados con brechas / Monto total de proyectos ejecutados.	%	70.6	2016	P	-	85
					A	-	-
Details							

**Means of Verification:** Nota de verificación de la DGIP

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Aumento del porcentaje de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública.

**Observation:** Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa integral de capacitación = 2.720 funcionarios. La capacitación del programa estará dirigida a funcionarios de la DGIP, y OPMI, UF y UE de 4 sectores prioritarios (educación, salud, transporte, y agua y saneamiento) de ministerios de línea y los 26 GR. Se espera capacitar a un total de 2.720 funcionarios al final del programa, y certificar al 65% del total de inscritos capacitados. Fuente: DGIP.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Número de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral del sistema de inversión pública	%	0	2016	P	-	65
					A	-	-
Details							

**Means of Verification:** Nota de verificación de la DGIP

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Aumento del porcentaje de funcionarios mujeres con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública.

**Observation:** Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de contrataciones públicas = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa de capacitación = 600 funcionarios. Fuente: OSCE.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Número de funcionarias mujeres con conocimientos certificados en el sistema de inversión pública / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral del sistema de inversión pública	%	0	2016	P	-	35
					A	-	-

Details

Means of Verification: Nota de verificación de la DGIP

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Aumento del porcentaje de funcionarios con conocimientos certificados en contrataciones públicas.

Observation: Línea Base: # de funcionarios con conocimientos certificados en el sistema de contrataciones públicas = 0 funcionarios. Total de funcionarios a ser inscritos en el programa de capacitación = 600 funcionarios. Fuente: OSCE.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.0	Número de funcionarios con conocimientos certificados en contrataciones públicas / Total de funcionarios inscritos en el programa de capacitación en contrataciones públicas	%	0	2016	P	-	65
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe OSCE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Incremento de la tasa de ejecución de la inversión pública.

Observation: Línea Base: Gasto devengado = S/ 27,2 mil millones. Gasto presupuestado (PIM) = S/ 39,8 mil millones. Fuente: Portal de Consulta amigable.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.0	Gasto devengado / Presupuesto institucional modificado de inversión pública.	%	68	2016	P	-	80
					A	-	-

Details

Means of Verification: Portal de Consulta Amigable

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

**Specific Development Objectives Nbr. 5:** Reducción de la incidencia de retrasos en la ejecución de proyectos de inversión pública.

**Observation:** Línea Base: Toma en consideración el universo de proyectos finalizados entre 2014 y 2016. Fuente: DGIP.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
5.0	# de proyectos finalizados con retraso / # de proyectos finalizados.	%	72	2016	P	-	59
					A	-	-
Details							

**Means of Verification:** Nota de verificación de la DGIP

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

**Specific Development Objectives Nbr. 6:** Reducción de la incidencia de sobrecostos en la ejecución de proyectos de inversión pública.

**Observation:** Línea Base: Toma en consideración proyectos finalizados entre 2014 y 2016. Fuente: DGIP.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
6.0	# de proyectos finalizados con sobrecostos / Número de proyectos finalizados.	%	45	2016	P	-	37
					A	-	-
Details							

**Means of Verification:** Nota de verificación de la DGIP

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora de la capacidad del marco institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Documento con el marco institucional de Invierte.pe implementado	Documento	P	1	5	203,257.33	1,091,170.33
			P (a)	3	11	258,862	1,139,602
			A	1	7	99,761	370,730
1.02	Documento con el modelo de levantamiento de información, que incluye el Plan Nacional de Infraestructura, para la identificación, valorización y proyección de las brechas de inversión, implementado.	Documento	P	2	10	785,581.68	4,527,432.11
			P (a)	7	14	315,999	4,527,433
			A	7	10	170,751	627,607
1.03	Documento con la metodología de formulación, monitoreo y evaluación ex post de proyectos implementado	Documento	P	2	11	101,715.45	962,159.38
			P (a)	1	11	40,482	862,212
			A	1	7	18,855	473,339
1.04	Norma publicada que aprueba la metodología de programación multianual	Documento	P	-	2	-	12,320
			P (a)	1	1	63,832	63,832
			A	-	-	-	-
1.05	Documento con el modelo para la actualización y mejora de los parámetros de evaluación social	Documento	P	7	35	454,831.21	2,909,086.36
			P (a)	1	18	384,730	2,909,086
			A	-	3	31,199	250,810
1.06	Documento con el modelo de gestión de activos públicos no financieros para los sectores prioritarios implementado.	Documento	P	2	10	570,064.98	2,928,328.17
			P (a)	-	4	-	2,928,328
			A	-	-	-	-
1.07	Documento con mecanismos para promover una mayor participación de proveedores en los procesos de contratación pública implementado.	Documento	P	0.4	1	336,443	849,187
			P (a)	0.22	1	165,323	728,622.24
			A	0.02	0.44	110,963	411,762.24
1.08	Servicio de actualización del portal de OSCE	Servicio de actualización	P	-	2	48,850	326,400
			P (a)	0.23	2	9,890	129,712.22
			A	0.23	0.55	10,620	67,942.22
1.09	Documento con el modelo de planificación de requerimientos en compras y contrataciones públicas considerando los enfoques de eficiencia, eficacia y transparencia, incluyendo productos innovadores, implementado	Documento	P	0.4	1	255,728	780,054
			P (a)	0.26	1	293,270	1,474,985.99
			A	0.36	0.76	129,856	923,946.99
1.10	Software del sistema de documentos estándar y de consulta de precios de referencia para contrataciones y adquisiciones para la formulación y ejecución de proyectos implementado	Software	P	-	1	-	183,190
			P (a)	-	1	-	12,000
			A	-	0.07	-	12,000

Component Nbr. 2 Desarrollo e implementación de un sistema informático de gestión de la inversión pública interoperable con otros sistemas de gestión de las finanzas públicas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	Base de datos del Banco de Inversiones implementada	Documento	P	1	10	36,637.88	665,094.25
			P (a)	5	18	196,874	665,094
			A	3	14	83,111	458,393
2.02	Sistema informático para la gestión del ciclo de inversión pública implementado	Documento	P	5	23	2,111,276.33	10,900,094.54
			P (a)	1	11	12,183	10,900,095
			A	1	1	12,539	12,539
2.03	Servicio de actualización del portal Invierte.pe	Documento	P	-	4	-	86,240
			P (a)	-	3	-	143,423
			A	-	3	-	143,423
2.04	Sistema informático off-the-shelf para la gestión transaccional de todo el ciclo de contrataciones públicas, interoperable con otros sistemas de gestión gubernamental, implementado	Software	P	0.4	1	3,811,579.79	9,696,753.2
			P (a)	0.16	1	2,039,069	9,677,765.88
			A	0.09	0.44	357,031	1,038,371.88
2.05	Módulo de Inteligencia de Negocios integrado al sistema informático de contrataciones públicas implementado	Software	P	0.4	1	97,620	301,212
			P (a)	0.31	1	47,200	218,440.82
			A	-	0.51	11,969	155,709.82
2.06	Mesa de ayuda inteligente para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema de contrataciones públicas implementado	Software	P	0.25	1	79,870	324,740
			P (a)	0.34	1	125,000	382,166.94
			A	0.09	0.33	-	102,166.94
2.07	Equipamiento de soporte del sistema informático de contratación pública implementado	Equipamiento	P	0.3	1	720,000	2,160,828.72
			P (a)	0.08	1	258,046	2,579,751.62
			A	0.55	0.75	52,042	150,497.62
2.08	Aplicación informática con instrumentos de apoyo a la gestión de las inversiones públicas implementada	Documento	P	-	8	-	893,586.97
			P (a)	-	8	49,492	893,587
			A	-	-	-	-
2.09	Sistema informático off-the-shelf para la gestión del inventario de activos públicos implementado	Documento	P	4	17	841,296	4,243,440
			P (a)	-	8	15,228	4,243,440
			A	-	-	-	-
2.10	Laboratorio de innovación en gestión de la inversión pública integrado con plataforma tecnológica de sistema Invierte.pe implementado	Documento	P	5	22	78,655.16	723,339.08
			P (a)	-	10	55,330	723,339
			A	-	-	-	-
2.11	Plataforma tecnológica para el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicativos de apoyo a Invierte.pe implementada	Documento	P	8	32	506,072.06	2,804,732.73
			P (a)	-	14	-	2,747,550
			A	-	2	-	56,676
2.12	Mesa de ayuda inteligente y multicanal para el apoyo y soporte a los usuarios del sistema implementada	Documento	P	1	7	60,000	433,920
			P (a)	1	3	16,751	433,920
			A	-	-	-	-



Component Nbr. 3 Mejora de la capacidad del capital humano

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	Documento de la estrategia global de la gestión del capital humano (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y perfiles, la estrategia de reclutamiento de operadores mujeres, y el modelo de certificación de especialistas externos) implementado	Documento	P	7	25	133,629.47	615,454.24
			P (a)	-	15	11,675	615,684
			A	-	1	-	45,808
3.02	Funcionarios inscritos en el programa de capacitación integral y sostenible para la inversión en capital humano	Documento	P	8	34	1,367,509.22	6,985,419.06
			P (a)	2	19	337,522	5,245,450
			A	-	1	120,013	201,964
3.03	Documento del programa de gestión del cambio para todo el ciclo del proyecto implementado	Documento	P	5	22	189,234.46	1,194,518.48
			P (a)	1	12	3,807	1,194,903
			A	-	1	-	69,998
3.04	Documento con la estrategia de fortalecimiento y certificación de capacidades profesionales en contrataciones públicas (incluye el diagnóstico de las brechas de conocimiento y desarrollo de perfiles) implementada	Documento	P	0.2	1	300,520	1,502,590
			P (a)	0.43	1	392,357	1,211,537.73
			A	0.59	0.75	122,255	567,935.73
3.05	Documento para la estrategia de acompañamiento in situ de las actividades de asistencia técnica para los tres niveles de gobierno implementado	Documento	P	3	15	226,611.74	5,020,062.38
			P (a)	-	14	1,431,116	6,759,417
			A	-	8	588,715	5,917,016

Component Nbr. 4 Gestión técnica y administrativa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
4.01	Administración del proyecto	Informe	P	1	5	2,211,920.6	10,628,647
			P (a)	1	5	1,797,878	10,773,610.79
			A	-	3	876,872	4,554,757.79

Total Cost				
	Total Cost	P	15,528,904.36	73,750,000
		P (a)	8,321,916	74,184,989.23
		A	2,796,552	16,613,394.23

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Legal Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Technical Design
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	21.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
