


PMR Public Report

Operation Number	PN-L1160	Chief of Operations Validation Date	11/15/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/05/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Social Inclusion Program for Persons with Disabilities in Panama	Loan Number	5127/OC-PN
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	FREIRE SAMUDIO, CAROLINA ANGELICA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PANAMA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación no ha desembolsado aún. En octubre del 2021 el gobierno de Panamá otorgó presupuesto correspondiente para la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2021. No se muestran avances en la ejecución financiera dado que el Programa aún no ha recibido el primer desembolso de recursos económicos, Se espera que el Banco hará efectivo el primer desembolso a inicios del 2022.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PN-L1160	40,000,000	40,000,000	1,300,000	0	41,300,000	40,000,000	1,177,706.95	2.94%	38,822,293.05
Aggregated	40,000,000	40,000,000	1,300,000	0	41,300,000	40,000,000	1,177,706.95	2.94%	38,822,293.05
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

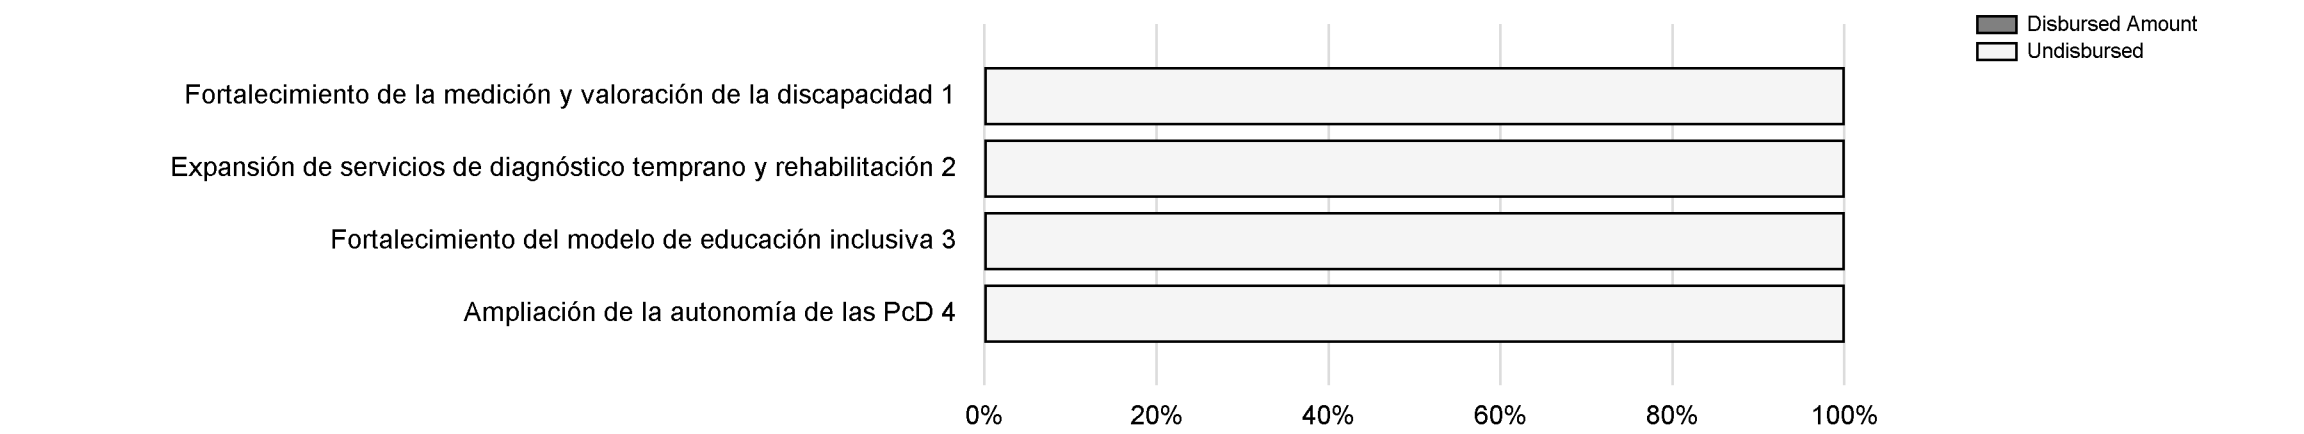

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** El objetivo general del Programa es apoyar la inclusión social de las personas con discapacidad (PcD) a través del aumento en la capacidad del Estado para identificarlos y ponderar sus necesidades, así como promover mejoras en la cobertura y calidad de los servicios de salud, educación y de soporte a la autonomía personal que reciben.

**Observation:** El indicador de Impacto 1.4 depende de un diagnóstico de educación inclusiva que se financiará con el componente 3 (producto 3.1.1.)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Proporción de PcD certificadas a nivel nacional	%	2.1	2019	2025	P	6.9
						A	-

Details

**Means of Verification:** Registro Nacional de Certificacion

**Observations:**

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.1	Proporción de PcD que reciben rehabilitación efectiva en MINSA			%	38.1	2017	2025	P	42.4
								A	-
Details									

**Means of Verification:** SEIS

**Observations:**

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.2	Porcentaje de niños con diagnóstico de discapacidad auditiva en MINSA			%	3.8	2018	2025	P	4.8
								A	-
Details									

**Means of Verification:** SEIS

**Observations:**

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.3	Ratio de asistencia niños con discapacidad/asistencia niños sin discapacidad			ratio	100	2019	2025	P	110
								A	-
Details									

**Means of Verification:** Encuesta aplicada a escuelas tratamiento

**Observations:** El nivel inicial sera establecido a partir de la encuesta de educacion inclusiva

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la eficiencia y eficacia de los sistemas de identificación y certificación de las PcD

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Proporción de PcD evaluadas bajo parámetro CIF	%	2.5	2019	P	3.4	4.4	5.5	6.8	8.3	8.3
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registro Nacional de Certificaciones

Observations: Numerador: Número de PcD evaluadas por SENADIS (acumulado) Denominador: Número de PcD (Censo) Línea de base: Numerador: 8,152 (2015-2019) Denominador: 329,067 (CENSO para % de discapacidad, estimaciones poblacionales 2019)4 Meta: 27,222/ 329,067

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Tiempo promedio de certificación efectiva	Meses	5	2020	P	4.5	4	3.5	3	3	3
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registro Nacional de Certificaciones

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Ampliar la capacidad de diagnóstico y la cobertura de los servicios de rehabilitación a la discapacidad con énfasis en la infancia temprana

Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Proporción de niños que cuenta con tamizaje auditivo	%	24.3	2018	P	25	25	50	70	90	90
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: SIES											
Observations: Numerador: Número de niños con tamizaje auditivo (MINSA) Denominador: Total nacidos vivos por año en MINSA											

Evaluation Methodology: -					
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.3	Proporción de niños que cuenta con tamizaje visual	%	25	2019	P	25	25	50	70	90	90
					A	-	-	-	-	-	-

Details											
Means of Verification: SIES											
Observations: Numerador: Número de niños con tamizaje visual (MINSA) Denominador: Total nacidos vivos por año en MINSA Línea de base: Tomado del Plan Maestro de Salud 2018-2015- MINSA *Seguimiento de género											

Evaluation Methodology: -					
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2021		2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
2.4	Proporción de niños que cuenta con tamizaje metabólico		%	89.3	2018	P	95	95	95	95	95	95	
						A	-	-	-	-	-	-	
Details													
Means of Verification: SIES													
Observations: Numerador: Número de niños con tamizaje metabólico (MINSA, H. del Niño y H. José D.de Obadía) Denominador: Número de niños nacidas vivos por año en MINSA Línea de base: 37,690/ 42,203 (2018). *Seguimiento de género													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2021		2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
2.5	Proporción de PcD atendidos en Centros Reintegra		%	28	2017	P	28	28	31.4	35.1	36.5	36.5	
						A	-	-	-	-	-	-	
Details													
Means of Verification: SIES													
Observations: Numerador: Número de PcD atendidas en Reintegra por año (SENADIS) Denominador: Número de PcD total país sin provincia de Panamá (CENSO para determinar incidencia de la discapacidad, población de EMP 2017) Línea de base: 44,468 / 158,737													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2021		2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
2.6	Porcentaje de Centros Reintegra que aplica (al menos el 80%) de los estándares de calidad aprobados		%	0	2020	P	-	-	30	50	80	80	
						A	-	-	-	-	-	-	
Details													
Means of Verification: Informe Semestral													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2021		2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
2.7	Porcentaje de PcD atendidas con calidad por el modelo comunitario de rehabilitación y salud		%	0	2020	P	-	-	2.5	5	7.5	7.5	
						A	-	-	-	-	-	-	
Details													
Means of Verification: Informe Semestral													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2021		2022	2023	2024	2025	EOP 2025	
2.8	Porcentaje de instituciones públicas que adoptan el Plan Nacional de Situaciones de Riesgos y Emergencias Humanitarias de aquellas que tienen oficina de equiparación		%	0	2020	P	-	-	15	15	20	50	
						A	-	-	-	-	-	-	
Details													

Means of Verification: Informe Semestral

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la calidad de los servicios educativos disponibles para los estudiantes con discapacidad

Observation: El indicador 3.1 tendrá como fuente una evaluación experimental sobre educación inclusiva, y el indicador 3.2 tendrá como fuente para su línea de base un diagnóstico de educación inclusiva

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.3	Porcentaje de estudiantes con discapacidad que cuentan con PEI (Plan Educativo Individual) en el sistema educativo público	%	100	2019	P	-	100	100	100	110	110
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Diagnostico de la educacion inclusiva

Observations: El indicador 3.1 tendrá como fuente para su línea de base un diagnóstico de educación inclusiva.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Aumentar la autonomía de las personas con discapacidad de altas necesidades de asistencia

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.0	Índice de capacidad de toma de decisiones para PcD con altas necesidades de atención del programa Angel Guardián	DE de la línea de base	0	2022	P	-	-	-	-	.1	.1
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluacion de impacto

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.3	Escala breve de Cargo de Cuidadores Familiares de PcD con altas necesidades de atención del programa Angel Guardián	DE de la línea de base	0	2022	P	-	-	-	-	.1	.1
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluacion de impacto

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la medición y valoración de la discapacidad

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	Encuesta Nacional de Discapacidad realizada	Encuesta	P	-	1	-	3,323,000
			P (a)	-	1	500,000	3,323,000
			A	-	-	-	-
1.02	Número de direcciones regionales de SENADIS equipadas e interconectadas con la sede central	# de direcciones regionales	P	2	11	348,397	4,054,140
			P (a)	2	11	735,799.99	4,054,140
			A	-	-	116,697.46	116,697.46
1.03	Campaña de comunicación diseñada	campaña	P	1	1	-	665,000
			P (a)	-	1	-	665,000
			A	-	-	-	-
1.04	Número de personas capacitadas y certificadas para conformar Juntas Evaluadoras	# de personas capacitadas y certificadas	P	15	78	10,000	60,000
			P (a)	-	78	-	60,000
			A	-	-	-	-
1.05	Número de funcionarios capacitados en Renacer Fase 2	# de funcionarios capacitados	P	-	210	-	650,000
			P (a)	-	210	-	650,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Expansión de servicios de diagnóstico temprano y rehabilitación

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
2.01	Número de establecimientos de MINSA equipados con tamizaje auditivo-visual	# de establecimientos de salud	P	25	25	2,120,000	2,120,000
			P (a)	-	25	-	2,120,000
			A	-	-	-	-
2.02	Número de pruebas de tamizaje metabólico dotadas al Hospital del Niño	# de pruebas de tamizaje metabolico	P	45,000	112,500	592,500	1,575,000
			P (a)	23,418	112,500	620,507	1,575,000
			A	11,000	43,832	93,390	616,610
2.03	Número de funcionarios de salud capacitados en proceso de tamizaje neonatal	# de funcionarios capacitados	P	300	300	300,000	300,000
			P (a)	-	300	-	300,000
			A	-	-	-	-
2.04	Número de Centros Reintegra construidos	# de Centros Reintegra	P	-	1	-	2,507,860
			P (a)	-	1	-	2,507,860
			A	-	-	-	-
2.05	Número de Centros Reintegra rehabilitadaos y equipados	# de Centros Reintegra	P	-	7	-	3,250,000
			P (a)	-	7	-	3,250,000
			A	-	-	-	-
2.06	Número de PcD atendidas por el modelo comunitario de rehabilitación y salud	# of beneficiaries	P	-	6,000	239,773	3,285,000
			P (a)	-	6,000	-	3,285,000
			A	-	-	-	-
2.07	Número de ayudas técnicas (silla de ruedas, lentes, bastones) adquiridas	# of beneficiaries	P	500	2,393	122,727	5,000,000
			P (a)	893	2,393	234,800	5,000,000
			A	75	75	158,531.74	158,531.74
2.08	Plan Nacional de Situaciones de Riesgo y Emergencias Humanitarias diseñado	Plan	P	1	1	-	450,000
			P (a)	-	1	200,000	450,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Fortalecimiento del modelo de educación inclusiva

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
3.01	Diagnóstico del marco normativo nacional y estado del arte realizado	Documento de diagnostico	P	1	2	-	40,000
			P (a)	2	2	40,000	40,000
			A	-	-	-	-
3.02	Propuesta de marco normativo elaborada	Documento	P	-	1	-	5,000
			P (a)	1	1	5,000	5,000
			A	-	-	-	-
3.03	Campaña de sensibilización diseñada	campaña	P	1	1	80,000	580,000
			P (a)	-	1	-	580,000
			A	-	-	-	-
3.04	Número de docentes capacitados	Numero de docentes capacitados	P	-	840	309,750	1,146,500
			P (a)	-	840	-	1,146,500
			A	-	-	-	-
3.05	Número de estudiantes con discapacidad con diagnóstico de necesidad de ajustes razonables y ayudas técnicas	# de estudiantes con discapacidad	P	2,000	6,911	87,500	350,000
			P (a)	-	6,911	-	350,000
			A	-	-	-	-
3.06	Número de bibliotecas de recursos instaladas	# de bibliotecas de recursos	P	-	30	241,364	900,000
			P (a)	-	30	-	900,000
			A	-	-	-	-
3.07	Evaluación de mpacto de educación inclusiva	Documento de evaluacion	P	-	1	36,422	100,000
			P (a)	-	1	-	100,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Ampliación de la autonomía de las PcD

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
4.01	Modelo de asistencia personal para PcD con altas necesidades de apoyo diseñado	Modelo	P	1	1	80,000	80,000
			P (a)	-	1	50,000	80,000
			A	-	-	-	-
4.02	Número de asistentes personales capacitados y aprobados	# de asistentes personales	P	650	650	37,295	273,500
			P (a)	-	650	-	273,500
			A	-	-	-	-
4.03	Número de PcD con altas necesidades de apoyo que reciben orientación sobre autonomía	# de PcD	P	-	1,750	-	250,000
			P (a)	-	1,750	-	250,000
			A	-	-	-	-
4.04	Número de PcD que cuentan con apoyo de asistentes personales	# of beneficiaries	P	-	1,050	-	6,300,000
			P (a)	-	1,050	-	6,300,000
			A	-	-	-	-
4.05	Evaluación de impacto en autonomía personal	Documento de evaluacion	P	-	1	129,545	800,000
			P (a)	-	1	-	800,000
			A	-	-	-	-
4.06	Propuesta de marco normativo para promover el ejercicio de capacidad jurídica de las PcD diseñada	Documento de propuesta	P	1	1	38,920	40,000
			P (a)	-	1	-	40,000
			A	-	-	-	-
4.07	Diseño de sistema de apoyos realizado	Documneto de sistema de apoyos	P	-	1	-	10,000
			P (a)	-	1	-	10,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administracion de Componente 3 y Subcomponente 4.1	P	92,969	385,000
		P (a)	0	385,000
		A	0	0
	Unidad Coordinadora de Proyecto	P	100,000	500,000
		P (a)	0	500,000
		A	0	0
	Apoyo técnico y operativo al Programa	P	100,909	160,000
		P (a)	100,909	160,000
		A	0	0
	Gastos operativos	P	30,000	145,000
		P (a)	34,500	145,000
		A	34,500	34,500
	Auditoria	P	24,000	1,105,000
		P (a)	24,000	1,105,000
		A	0	0
	Evaluaciones del Programa	P	0	90,000
		P (a)	0	90,000
		A	0	0
	Contingencia	P	0	800,000
		P (a)	102,612.81	800,000

	Contingencia	A	17,175.18	17,175.18
Total Cost				
	Total Cost	P	5,122,071	41,300,000
		P (a)	2,648,128.8	41,300,000
		A	420,294.38	943,514.38

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Active		Organizational Structure		
	Response Actions				
	6.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	24.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Active		Systems
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
