


PMR Public Report

Operation Number	HO-L1188	Chief of Operations Validation Date	10/10/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Improvement of school quality to develop capacities for the Employment: Youth Program	Loan Number	4449/BL-HO, 4449/BL-HO-1, 4449/BL-HO-2
Executing Agency	SECRETARIA DE EDUCACION	Sector/Subsector	EDUCATION-SECONDARY EDUCATION
Team Leader	FERNANDEZ COTO, RAQUEL AUXILIADORA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	06/29/20
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HO-L1188	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	42,200,000	70.33%	17,800,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	42,200,000	70.33%	17,800,000

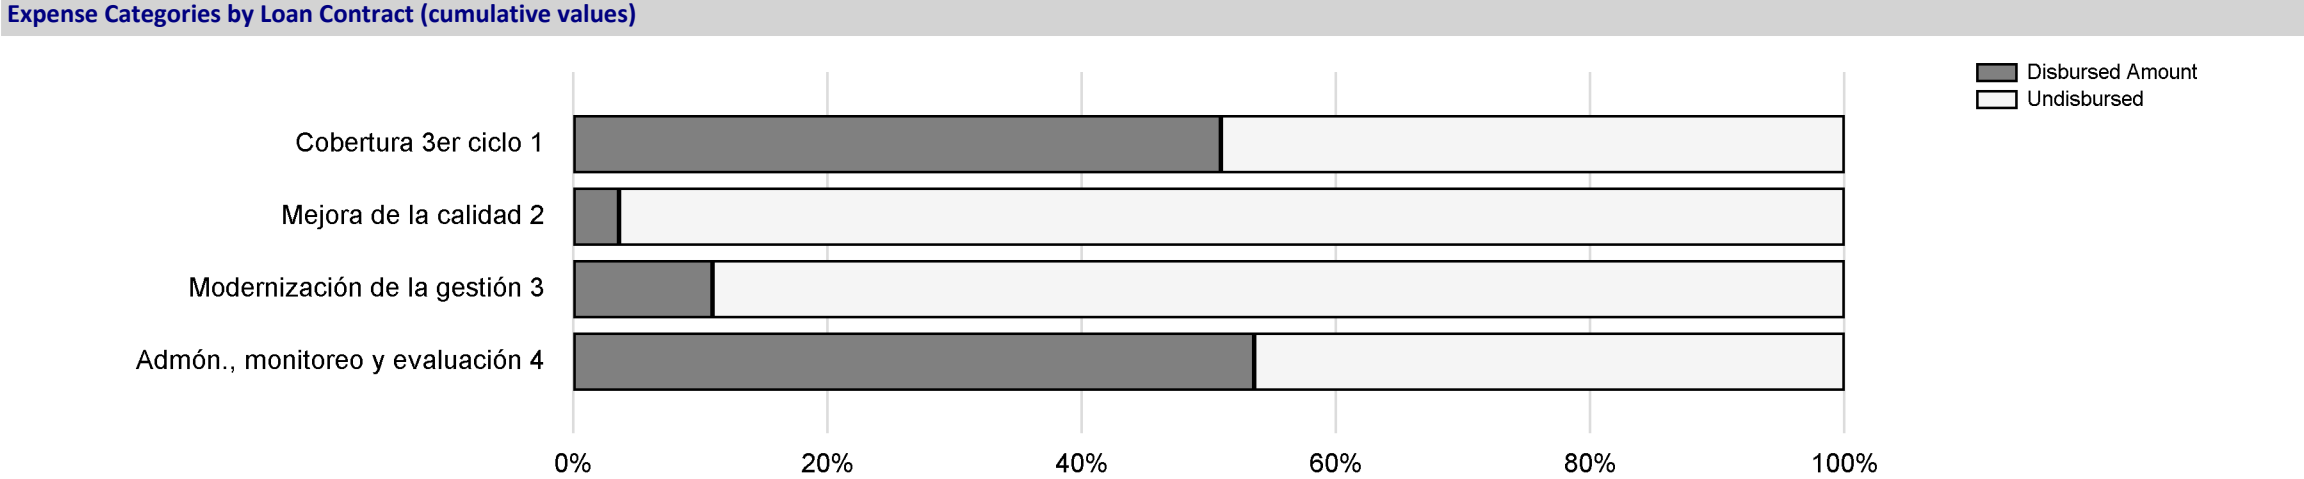

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de educación básica en los municipios priorizados por el programa y mitigar los efectos indirectos de la epidemia.

Observation: La matriz de resultados se encuentra en el EZSHARE No. 79499831-40 (Documento de Reformulación). Los indicadores 1.1, 1.2, 1.3 incluyen municipios beneficiados en el Componente 2 del Proyecto. El indicador 1.4 incluye municipios beneficiados en el Componente 1 del Proyecto.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Matemática	Promedio	228	2015	2023	P	250
						A	-

Details

Means of Verification: Prueba Nacional de Rendimiento Académico 2022. responsable SEDUC

Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.1	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Lengua			Promedio	277	2015	2023	P	304
								A	-
Details									

Means of Verification: Informe de línea base e informe final de consultoría

Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.2	Abandono escolar promedio de estudiantes del tercer ciclo en las áreas intervenidas			Porcentaje	9	2014	2023	P	7
								A	-
Details									

Means of Verification: Reporte del SACE (SEDUC/ Instituto Nacional de Estadística)

Observations: Incluye munucipios beneficiados en el Componente 2

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.3	Matrícula bruta promedio del tercer ciclo en las áreas intervenidas			Porcentaje	45	2014	2023	P	50
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.4	Número de muertes provocadas por COVID-19			# muertes	15000	2020	2021	P	5,952
								A	10,424
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.5	Casos de COVID-19 confirmados			# casos	450000	2020	2021	P	74,400
								A	378,725
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX											
Specific Development Objectives											
Specific Development Objectives Nbr. 0: Mayor acceso a servicios del tercer ciclo de la educación básica a través de Modalidades Alternativas (MA)											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Estudiantes matriculados en el tercer ciclo de EB a través de MA financiados con recursos del proyecto	# of students	0	2014	P	11,200	11,500	11,500	11,500	300	12,400
					A	11,250	11,772	11,608	11,031	-	-
Details											
Means of Verification: Informes oficiales de matrícula anual (SEDC) desagregado por modalidades educativas											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.1 Students benefited by education projects (#) (C)						
Disaggregation		Female			P	5,600	5,750	5,750	5,750	150	6,200
					A	5,718	5,940	5,900	5,757	-	-
		Male			P	5,600	5,750	5,750	5,750	150	6,200
					A	5,532	5,832	5,741	5,274	-	-
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Porcentaje de matrícula en el tercer ciclo de EB en las escuelas con nuevas aulas	Porcentaje	0	2014	P	-	-	-	-	80	80
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes oficiales de matrícula anual (SEDUC)											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Specific Development Objectives Nbr. 1: Mayor número de docentes aplican pedagogías activas de aprendizaje											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Docentes que aplican pedagogías activas de aprendizaje en el tercer ciclo de EB en las áreas intervenidas	Porcentaje	0	2018	P	-	-	-	-	80	80
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Aprobación del organismo ejecutor del informe de consultoría con resultados de la aplicación de CLASS											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Estudiantes matriculados en centros con docentes capacitados en pedagogías activas de aprendizaje (CRF)	# of students	0	2017	P	-	-	-	-	41,000	41,000
					A	-	-	-	-	-	-
Details											

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.1 Students benefited by education projects (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mayor progresión escolar

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Aprobación promedio en tercer ciclo de EB en áreas intervenidas	Porcentaje	80	2017	P	-	-	-	-	85	85
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reporte del SACE (SEDUC/INE)

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Información oportuna e integrada usada en decisiones de política

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Documentos de programación regional de formación docente incluye indicadores producidos por el SACE, SIPLen y Sistema Informático de Recursos Humanos (SIAREH).	# documentos de programación con indicadores	0	2017	P	-	-	-	-	3	3
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SEDUC. Documentos de progración aprobados para San Pedro Sula, Occidente y Distrito Central

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 5: Mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios de salud

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.0	Porcentaje de establecimientos de primer nivel de atención de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmados que cuentan con capacidad de triage	Porcentaje	0	2020	P	-	-	100	-	-	100
					A	-	-	100	-	-	-

Details

Means of Verification: Dirección General de Redes de Servicios

Observations: Numerador: Número de establecimientos de primer nivel de atención de las áreas de intervención para casos COVID-19 sospechosos y/o leves confirmados, con capacidad de Triage Denominador: Total de establecimientos de salud con capacidad de atención de casos COVID-19 sospechosos y/o leves confirmados

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.2	Porcentaje de establecimientos de atención de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmado que cuentan con capacidad de aislamiento	Porcentaje	0	2020	P	-	-	100	-	-	100
					A	-	-	100	-	-	-

Details

Means of Verification: Dirección General de Redes de Servicios

Observations: Numerador: Número de establecimientos de salud con capacidad de aislamiento Denominador: Número total de establecimientos de atención de salud

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.3	Porcentaje de casos confirmados de pacientes hospitalizados que reciben tratamiento de conformidad con el protocolo del país			Porcentaje	0	2020	P	-	-	60	-	-	60
							A	-	-	100	-	-	-
Details													

Means of Verification: Expedientes Clínicos

Observations: Numerador: Número de pacientes hospitalizados que reciben tratamiento de conformidad con el protocolo Denominador: total de pacientes hospitalizados con COVID-19.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en MA para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC.	# convenios /contratos	P	2	2	1,923,311	13,931,034
			P (a)	2	2	4,150,385.15	15,928,429.01
			A	1	-	1,120,854.06	11,752,097.92
1.02	Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados	# módulos	P	20	50	1,592,000	6,202,873
			P (a)	15	50	2,952,109.73	7,831,341.54
			A	-	-	22,017.28	328,582.54

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revision de módulos de pedagogía	Currículo	P	-	1	-	550,260
			P (a)	-	1	-	495,640.91
			A	1	-	-	495,640.91
2.02	Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje active (CRF).	# docentes	P	1,054	2,708	1,364,827	6,249,795
			P (a)	2,708	2,708	2,132,596.65	4,944,336.59
			A	625	-	-	760,338.62
2.03	Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento.	Plataforma	P	-	1	-	800,000
			P (a)	1	1	220,000	800,000
			A	-	-	-	-
2.04	Escuelas beneficiadas, con materiales pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.	# escuelas	P	300	547	2,039,510	3,315,021
			P (a)	500	547	1,004,954.9	2,231,510.9
			A	-	-	-	63,587
2.05	Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo, apoyo a jovenes emigrantes retornados y prevención de violencia.	# escuelas	P	40	60	271,427	1,033,000
			P (a)	60	60	21,650	531,324.88
			A	-	-	5,998.21	44,094.09
2.06	Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computadora implementado.	Programa	P	1	1	1,023,012	1,765,000
			P (a)	1	1	128,250	1,692,945
			A	-	-	-	-
2.07	Evaluación de competencias finalizadas.	evaluación	P	-	8	132,992	1,997,280
			P (a)	4	8	728,446.6	1,552,732.15
			A	-	-	23,300.61	181,219.56
2.08	Estrategia de comunicación para gestionar la transformación pedagógica en el tercer ciclo implementada.	Estrategia	P	-	1	1,110,686	1,448,000
			P (a)	1	1	146,900	1,448,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3: Modernización de la capacidad de gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Nuevo SIAREH en funcionamiento.	Sistema	P	-	1	972,871	2,547,527
			P (a)	1	1	313,000	2,005,880
			A	-	-	-	5,880
3.02	Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada.	Plataforma	P	-	1	-	400,000
			P (a)	1	1	-	100,000
			A	-	-	-	-
3.03	Areas de la SEDUC con equipamiento informático de conectividad instalado.	Equipamiento	P	4	4	24,000	602,400
			P (a)	4	4	1,616,887	1,776,037
			A	-	-	-	-
3.04	Equipos técnicos de la SEDUC conformados.	# equipos	P	4	4	641,239	1,847,940
			P (a)	4	4	544,815	1,351,952.39
			A	3	-	199,752.7	935,490.09

Component Nbr. 4 Componente 4: Mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
4.01	Número de unidades de salud de primer y segundo nivel equipados para la atención de pacientes con COVID-19.	# unidades	P	-	21	-	15,000,000
			P (a)	-	21	-	15,000,000
			A	-	21	-	15,000,000

Other Cost				
	Gestión del Programa	P	435,976	2,046,826
		P (a)	423,584	2,046,617.07
		A	1,005,354.96	2,454,192.03
	Monitoreo y evaluación	P	0	15,000
		P (a)	7,500	15,000
		A	0	0
	Auditoría	P	39,686	248,044
		P (a)	39,686	248,252.56
		A	39,701	168,895.56
Total Cost				
	Total Cost	P	11,571,537	60,000,000
		P (a)	14,430,765.03	60,000,000
		A	2,416,978.82	32,190,018.32

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Materialized		Governance Framework		
	Response Actions				
	3.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	
	3.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	3.3	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Active		Social Environment		
	Response Actions				
	6.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	
	6.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Human Resources
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	12.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	12.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	12.4	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Planning
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
27	Materialized		Natural Environment		
	Response Actions				
	27.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	27.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
30	Materialized		Political Environment		
	Response Actions				
	30.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
33	Materialized		Natural Environment		
	Response Actions				
	33.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
36	Materialized		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	36.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
39	Active		Political Environment
	Response Actions		
	39.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
