


# PMR Public Report

Operation Number	PE-L1228	Chief of Operations Validation Date	10/17/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/12/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Create Integrated Health Networks	Loan Number	4726/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	SORIO, RITA ELIZABETH	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las obras del programa aún no han comenzado y se encuentran detenidas en relación a la definición del alcance del Programa en el componente 2 y debido a cambios institucionales. Posteriormente a la misión (en abril 2022) se confirmó que se mantendría el alcance del componente 2 como estuvo planificado desde preparación. A la fecha de la misión no existían instrumentos pendientes de finalización y se viene planificando los TdR del Componente 4 que incluye el desarrollo de Estudio de Impacto Ambiental semi detallado por requerimiento de la autoridad, así como la actualización de los estudios socio ambientales de los PIPs del componente 2.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PE-L1228	125,000,000	125,000,000	32,825,000	0	157,825,000	125,000,000	7,305,171	5.84%	117,694,829
Aggregated	125,000,000	125,000,000	32,825,000	0	157,825,000	125,000,000	7,305,171	5.84%	117,694,829

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

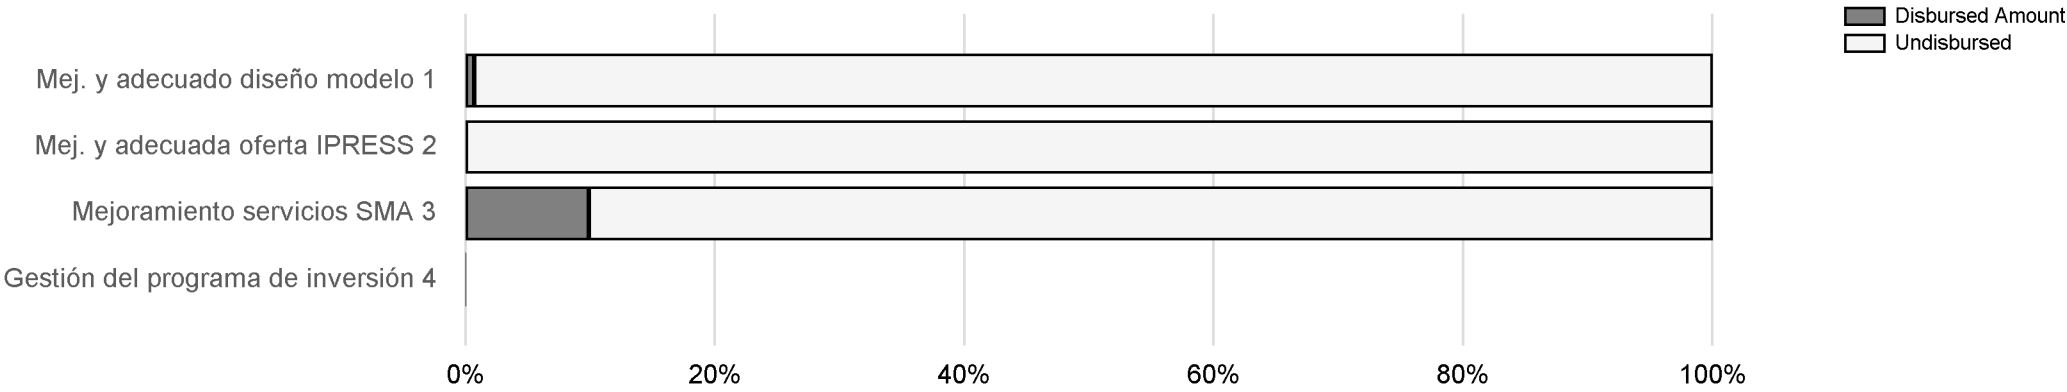

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Calidad de los servicios en el primer nivel de atención mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.3	Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria–total	Porcentaje	29	2017	2024	P	24.6
						A	-

Details

Means of Verification: Registros Administrativos SIS - MINSA

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
		Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– mujeres (Seguimiento de género)				P	23.6
						A	-
		Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles a la atención primaria– hombres (Seguimiento de género)				P	36.5
						A	-

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.4	Tasa de mortalidad por servicios de salud de baja calidad	Porcentaje	20.8	2017	2024	P	17.5
						A	-

Details

Means of Verification: Centro Nacional de Epidemiología,Prevención y Control de las Enfermedades (MINSA)

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX										
Specific Development Objectives										
Specific Development Objectives Nbr. 1: Capacidades de oferta de servicios de salud mejoradas										
Observation:										
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	EOP 2024	
1.1		Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años que se han realizado la prueba de Papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado		%	88.1	2017	P	-	-	92
							A	-	-	-
Details										
Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES										
Observations:										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	EOP 2024	
1.2		Porcentaje de personas de 40 a 59 años que se han realizado un chequeo para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses		%	34.6	2017	P	-	-	38
							A	-	-	-
Details										
Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES										
Observations:										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	EOP 2024	
1.3		Porcentaje de personas que han donado sangre de manera voluntaria		%	5.36	2017	P	-	-	8
							A	-	-	-
Details										
Means of Verification: PRONAHEBAS (MINSA)										
Observations:										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	EOP 2024	
1.4		Porcentaje de despachos de ambulancia requeridos y no atendidos		%	46	2017	P	-	-	41
							A	-	-	-
Details										
Means of Verification: Resgistros Administrativos - SAMU (MINSA)										
Observations:										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.5	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	71.54	2017	P	-	-	74.5
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.6	Porcentaje de personas de 15 años o más con diagnóstico de hipertensión que recibieron tratamiento en los últimos 12 meses	%	62.3	2017	P	-	-	70
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.6	Beneficiarios que reciben servicios de salud	# of beneficiaries	2850000	2017	P	-	-	3,049,000
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: RESULTA (MEF) - ENDES E INEI								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.7	Porcentaje de usuarios de consulta externa que se sintieron “satisfechos” o “muy satisfechos” con la atención recibida	%	78.8	2016	P	-	-	84
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD								
Observations:								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	EOP 2024
1.8	Porcentaje de usuarios de consulta externa que calificaron el tiempo de espera para la atención en el establecimiento de salud con una evaluación de 6 o más (en escala de 1 a 10)	%	77.2	2016	P	-	-	83.5
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Encuesta Nacional de Satisfaccion de usuarios de salud - SUSALUD								
Observations:								

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en las Redes Integradas de Salud (RIS)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Modelo de atención con énfasis en el nuevo patrón de carga de enfermedad rediseñado	Modelo	P	1	1	313,493	339,595
			P (a)	-	1	-	339,595
			A	-	-	-	-
1.02	Guías clínicas y protocolos de atención a enfermedades crónicas no transmisibles diseñados: diabetes, cáncer de mama, enfermedades mentales, hipertensión	protocolos	P	-	17	-	545,013
			P (a)	2	17	66,345.18	545,013
			A	-	3	-	80,596.76
1.03	Profesionales de salud (médicos, enfermeros) capacitados en la aplicación de guías clínicas y protocolos	Profesionales	P	800	1,600	220,449	461,045
			P (a)	300	1,600	86,445.94	461,045
			A	-	-	-	-
1.04	Modelos de organización, gestión y financiamiento de las redes integradas de salud elaborados	Modelo	P	-	1	2,644,160	7,033,701
			P (a)	-	1	581,947.2	7,033,701
			A	-	-	-	-
1.05	Plan de desarrollo de competencias de recursos humanos para actuación en red, elaborado y validado por el MINSA	Plan	P	1	1	501,420	834,692
			P (a)	-	1	317,898.6	834,692
			A	-	-	-	-
1.06	Guía de atención y manejo de casos de violencia en mujeres con enfoque de género revisado y fortalecido	Guía	P	-	1	-	50,598
			P (a)	-	1	-	50,598
			A	-	-	-	-
1.07	Estrategia de sensibilización sobre el nuevo modelo de atención para los actores del sistema, aprobada	Estrategia	P	1	1	103,431	624,934
			P (a)	-	1	-	624,934
			A	-	-	-	-
1.08	Talleres para sensibilización sobre atención y los Servicios Médicos de Apoyo (SMA) centralizados	Taller	P	25	25	440,264	453,937
			P (a)	4	25	72,629.92	453,937
			A	-	-	-	-
1.09	Estudios técnicos de redes elaborados	Informe	P	2	7	373,730	1,308,055
			P (a)	1	7	747,460	1,308,055
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Mejoramiento y adecuada oferta en las IPRESS en el Primero Nivel de Atención de Lima Metropolitana

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	Establecimientos de salud 24 horas diseñados	Establecimiento de salud	P	-	5	-	4,689,612
			P (a)	-	5	548,425.08	4,689,612
			A	-	-	-	14,328.36
2.02	Establecimientos de salud 24 horas remodelados	Establecimiento de salud	P	-	5	30,812,370	39,494,271
			P (a)	-	5	2,898,854.2	39,494,271
			A	-	-	-	-
2.03	Establecimientos de salud 24 horas equipados	Establecimiento de salud	P	-	5	7,710,143	17,167,019
			P (a)	1	5	3,433,403.8	17,167,019
			A	-	-	-	-
2.04	Establecimientos de salud 24 horas operando	Establecimiento de salud	P	-	5	-	150,000
			P (a)	-	5	-	150,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Mejoramiento de los servicios médicos de apoyo en Lima Metropolitana

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	Central de SMA, diseñada	Central	P	-	1	-	1,287,981
			P (a)	-	1	200,000	1,287,981
			A	-	-	-	-
3.02	Central de SMA, construida	Central	P	-	1	13,745,451	23,040,751
			P (a)	-	1	-	23,040,751
			A	-	-	-	-
3.03	Manual operativo con reglas de funcionamiento de la central de SMA elaborado	Manual operativo	P	1	2	320,002	420,002
			P (a)	-	2	100,000	420,002
			A	-	-	-	-
3.04	Central de SMA, equipamiento de laboratorio instalado	Equipamiento	P	-	1	-	9,098,132
			P (a)	-	1	-	9,098,132
			A	-	-	-	-
3.05	Central de SMA, equipamiento de lectura de imágenes instalado	Equipamiento	P	-	1	-	2,274,533
			P (a)	-	1	-	2,274,533
			A	-	-	-	-
3.06	Central de SMA, equipamiento de banco de sangre instalado	Equipamiento	P	-	1	-	6,823,599
			P (a)	-	1	-	6,823,599
			A	-	-	-	-
3.07	Central de SMA, equipamiento de atención prehospitalaria instalado	Equipamiento	P	-	1	-	1,137,267
			P (a)	-	1	-	1,137,267
			A	-	-	-	-
3.08	Central de SMA, equipamiento complementario instalado (cadena de frío, gases, etc.)	Equipamiento	P	-	1	-	3,411,800
			P (a)	-	1	-	3,411,800
			A	-	-	-	-
3.09	Diseño de los servicios de la central con sus protocolos funcionales de coordinación con la red completados	Protocolo	P	1	1	394,998	394,998
			P (a)	-	1	-	394,998
			A	-	-	-	-
3.10	Profesionales de SMA capacitados	Profesionales	P	-	65	-	913,001
			P (a)	-	65	-	913,001
			A	-	-	-	-
3.11	Puesta en marcha de la central de SMA	Central	P	-	1	-	200,000
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	-	-	-
3.12	Campañas de sensibilización de la población sobre los SMA	Campañas de sensibilización	P	3	6	1,583,333	3,450,000
			P (a)	-	6	516,667	3,450,000
			A	-	-	-	-
3.13	Equipos médicos hospitalarios remplazados (7 tomógrafos, 1 resonador, 3 mamógrafos, 65 rayos x)	Equipos médicos	P	-	65	-	21,895,464
			P (a)	7	48	3,978,966.25	21,895,464
			A	-	41	-	8,253,294

Other Cost				
	Gestión	P	2,078,777	8,575,000
		P (a)	3,302,825	8,575,000
		A	630,434	2,408,076
	Monitoreo y evaluación	P	375,000	1,500,000
		P (a)	675,000	1,500,000
		A	0	0
	Auditorias	P	62,500	250,000
		P (a)	92,000	250,000
		A	0	0

Total Cost				
	Total Cost	P	61,679,521	157,825,000
		P (a)	17,618,868.17	157,825,000
		A	630,434	10,756,295.12



No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	9.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
20	Active		Natural Environment
	Response Actions		
	20.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE
	20.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
22	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	22.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	22.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE
	24.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
26	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	26.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	26.2	Management Strategy	Status
		ENHANCE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Active		Planning
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Intra/Inter Coordination
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Project Monitoring & Evaluation
