


PMR Public Report

Operation Number	PE-L1227	Chief of Operations Validation Date	10/17/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program for the Improvement of the Quality and Relevance of University and Technical Higher Education Services at the National Level	Loan Number	4555/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION	Sector/Subsector	EDUCATION-HIGHER EDUCATION
Team Leader	MENDEZ VARGAS, CAROLINA PATRICIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El desempeño de la supervisión se ha focalizado en el análisis de la componente de mejora de la infraestructura y equipamiento de las instituciones de educación superior públicas. Se ha revisado el cumplimiento socioambiental de los 10 proyectos de infraestructura educativa. Del resultado de la misión se han propuesto una serie de medidas para la finalización de expedientes técnicos y la siguiente etapa de construcción de las nuevas infraestructuras, a fin de que se ejecuten de manera que se minimicen los impactos ambientales y sociales de las intervenciones, considerando que se trata de impactos moderados. Dichas medidas deberán ser incluidas en los pliegos de obras y ser objeto de la supervisión. Respecto a este último punto, no se cuenta con un especialista contratado o asignado para que cumpla esta función en la UE durante la construcción. Asimismo, se inició una de las obras (San Martín) sin la realización de la consulta correspondiente.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PE-L1227	75,000,000	75,000,000	125,000,000	0	200,000,000	75,000,000	34,116,521	45.49%	40,883,479
Aggregated	75,000,000	75,000,000	125,000,000	0	200,000,000	75,000,000	34,116,521	45.49%	40,883,479

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

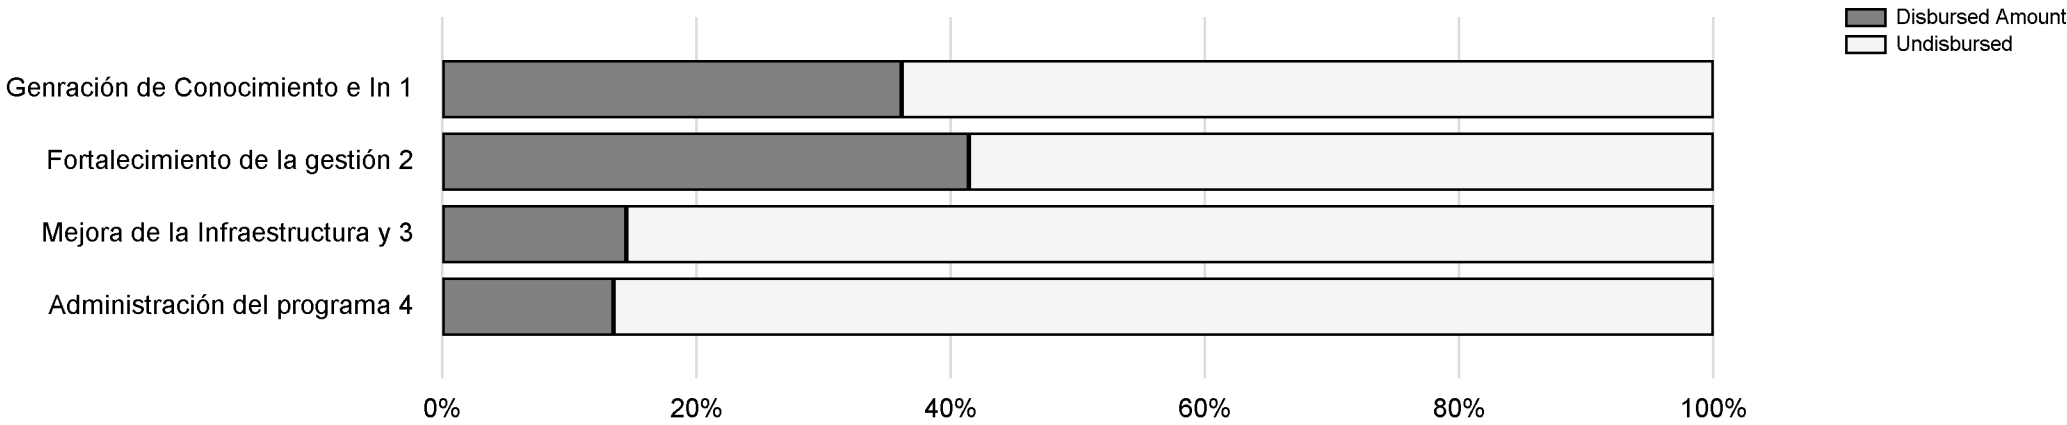

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Estudiantes de la Educación Superior (ES), universitaria y tecnológica, del Perú con acceso a instituciones que brinden adecuados servicios educativos, pertinentes y de calidad a nivel nacional

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Diferencia en el cambio de los ingresos de los egresados de las universidades públicas beneficiarias del programa con respecto al grupo de control	Porcentaje	0	2017	2024	P	.14
						A	-
Details							

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.2	Diferencia en el cambio de los ingresos de los egresados de los institutos técnicos públicos beneficiados por el programa con respecto al grupo de control.			Porcentaje	0	2017	2024	P	.14
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX											
Specific Development Objectives											
Specific Development Objectives Nbr. 1: Fortalecimiento de la gestión institucional de las IES públicas											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Diferencia en el porcentaje de personal administrativo (funcionarios encargados de los sistemas administrativos y/o gestores en administración pública) que han (i) completado la capacitación para la aplicación de los sistemas administrativos del Estado, sistemas de registro de información académica o sistemas de seguimiento al egresado; o (ii) han sido contratados mediante un proceso competitivo.	Puntos porcentuales	0	2016	P	-	-	-	-	-	9.26
					A	-	-	-	-	-	-
Details											

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Diferencia en el porcentaje de personal con cargo de gestión académica (encargados del manejo del personal y de su constante capacitación) contratados, y de docentes capacitados en gestión pedagógica (en nuevas tecnologías demandadas por el mercado laboral y diseño de modelos educativos y mallas curriculares).	Puntos porcentuales	0	2010	P	-	-	-	-	-	20
					A	-	-	-	-	-	-
Details											

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Diferencia en el porcentaje de personal con cargo de gestión académica (encargados del manejo del personal y de su constante capacitación) contratados, y de docentes capacitados en gestión pedagógica (en nuevas tecnologías demandadas por el mercado laboral y diseño de modelos educativos y mallas curriculares). La diferencia se calcularía entre las áreas académicas de los IEST beneficiados y un grupo de comparación.	Puntos porcentuales	0	2010	P	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.4	Diferencia en el porcentaje de programas curriculares de los IEST beneficiados que estén vinculados con las cinco principales actividades económicas de la región, con respecto al grupo de control. La diferencia se calcularía entre el porcentaje de IEST beneficiarios que estén utilizando la Guía metodológica desarrollada para este fin en el Componente 1 y un grupo de comparación.	Puntos porcentuales	0	2017	P	-	-	-	-	-	12
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.5	Diferencia en el porcentaje de personal con cargo de gestión en investigación e innovación que: (i) ha sido capacitado para el ejercicio de su función en los dos años (se incluyen como capacitados, (ii) ha sido contratado (no nombrado) y seleccionado en un proceso competitivo con competencias para el cargo). La diferencia se calcularía entre los departamentos de investigación de las universidades beneficiarias y un grupo de comparación	Puntos porcentuales		2018	P	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejora de la infraestructura y equipamiento de las IES públicas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Número de universidades beneficiadas que reciben licenciamiento de la SUNEDU	Porcentaje	1	2017	P	-	-	-	-	-	16
					A	-	-	52	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.2	Número de estudiantes beneficiarios del programa en las universidades públicas	# of students	0	2017	P	-	50,903	50,903	50,903	50,904	203,613
					A	-	-	298,292	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.1 Students benefited by education projects (#) (C)

Disaggregation		Female	P	-	25,451	25,452	25,452	25,452	101,807
			A	-	-	160,242	-	-	-
		Male	P	-	25,452	25,451	25,451	25,452	101,806
			A	-	-	138,050	-	-	-

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.3	Número de estudiantes beneficiarios del programa en los IEST públicos	# of students	0	2017	P	-	2,186	2,188	2,188	2,188	8,750
					A	-	-	129,429	-	-	-

Details												
Means of Verification:												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.1 Students benefited by education projects (#) (C)							
Disaggregation		Female				P	-	1,093	1,094	1,094	1,094	4,375
						A	-	-	65,086	-	-	-
		Male				P	-	1,093	1,094	1,094	1,094	4,375
						A	-	-	64,373	-	-	-
Indicator			Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.4	Número de IEST beneficiados que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad relacionadas a infraestructura (no hay grupo de control)			Número	0	2017	P	-	-	-	-	2
							A	-	-	1	-	-

Details											
Means of Verification:											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Generación de conocimiento e información para un mejor diseño de las políticas de fomento de la calidad y pertinencia

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Censo de infraestructura y equipamiento de las IES públicas	Herramienta	P	-	1	-	4,971,234
			P (a)	-	2	225,042	4,873,320.01
			A	-	2	-	2,656,243
1.02	Estudio para el diseño de la aplicación de una herramienta estandarizada para la evaluación de los estudiantes que acceden a la ESU	Documento	P	-	1	-	794,409
			P (a)	1	1	170,051	903,545.92
			A	-	-	-	128,915
1.03	Marco Nacional de Cualificaciones aprobado	Documento	P	-	1	-	231,509
			P (a)	-	1	19,262	402,138
			A	-	1	9,097	391,973
1.04	Sectores Productivos con programas formativos basados en el Marco Nacional de Cualificaciones	Sectores Productivos	P	-	3	434,068	2,996,676
			P (a)	-	3	556,731	2,697,171.14
			A	-	-	37,147	428,277
1.05	Estrategia para identificar las potencialidades económicas y las necesidades de competencias profesionales a nivel regional	Documento	P	-	1	-	766,508
			P (a)	1	1	76,142	842,649.98
			A	-	-	-	221,052
1.06	Metodología para facilitar la pertinencia de los programas curriculares de las IES	Documento	P	-	1	-	816,461
			P (a)	1	1	109,137	821,593.29
			A	-	-	-	84,847
1.07	Metodología para la implementación del proceso de ordenamiento de la oferta de Educación Superior	Documento	P	1	1	231,884	1,038,664
			P (a)	1	1	166,319	1,000,124.36
			A	-	-	65,396	653,400
1.08	Sectores que cuentan con estándares de competencias desarrollados por los CSC	Sectores Productivos	P	3	3	771,400	3,384,539
			P (a)	-	3	641,585	3,457,325.01
			A	-	-	-	294,812

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la gestión institucional de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión administrativa de las universidades públicas	Programas Ejecutados	P	9	27	3,110,923	8,292,000
			P (a)	-	42	1,931,421	8,502,169.35
			A	-	15	100,604	647,588
2.02	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión administrativa de las IEST públicas.	Programas Ejecutados	P	50	120	478,423	1,233,474
			P (a)	78	220	492,290	1,148,364.89
			A	-	100	275,084	741,993
2.03	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión académica de las universidades públicas	Programas Ejecutados	P	10	28	3,719,134	19,412,494
			P (a)	-	99	2,257,919	10,786,179.31
			A	-	-	-	-
2.04	Número de programas de capacitación virtual ejecutados de mejora de la gestión académica de las universidades públicas	Programas Ejecutados	P	-	-	-	-
			P (a)	43	135	569,042	6,659,267
			A	43	95	1,022,738	7,112,963
2.05	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión académica de las IEST públicas	Programas Ejecutados	P	49	120	12,443,126	34,471,224
			P (a)	45	220	9,661,129	28,711,976.22
			A	-	26	3,117,401.93	9,328,888.93
2.06	Número de programas de capacitación virtual ejecutados para la mejora de gestión académica de las IEST públicas	Programas Ejecutados	P	-	-	-	-
			P (a)	120	694	164,458	11,256,951.53
			A	187	761	164,458	2,854,355
2.07	Número de programas ejecutados de mejora de gestión de la I+D+i de las universidades públicas	Programas Ejecutados	P	-	16	1,637,732	6,590,808
			P (a)	11	25	2,617,860	5,251,889.47
			A	-	-	393,996	1,862,813

Component Nbr. 3 Mejora de la infraestructura y equipamiento de las IES públicas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Proyectos de Inversión Pública para las universidades beneficiarias completados	Proyectos	P	4	8	30,367,791	69,374,010
			P (a)	1	8	16,201,275	82,006,814.59
			A	-	-	6,924,826	15,237,309
3.02	Proyectos de Inversión Pública para las IEST beneficiarias completados	Proyectos	P	2	2	18,378,096	30,625,990
			P (a)	-	2	5,564,689	64,976,244.17
			A	-	-	-	1,218,408

Other Cost				
	Gestión del Programa	P	2,839,403	12,233,451
		P (a)	3,017,965	13,282,751.06
		A	1,464,562	9,678,826
	Evaluaciones	P	656,716	2,295,512
		P (a)	201,573	1,986,725.79
		A	86,389	384,328
	Auditorias	P	74,627	471,037
		P (a)	35,757	408,628.68
		A	16,413	87,693
Total Cost				
	Total Cost	P	75,143,323	200,000,000

	Total Cost	P (a)	44,679,647	249,975,829.77
		A	13,678,111.93	54,014,683.93

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Censo de infraestructura y equipamiento de las IES públicas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
	Estrategia para identificar las potencialidades económicas y las necesidades de competencias profesionales a nivel regional	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
	Estudio para el diseño de la aplicación de una herramienta estandarizada para la evaluación de los estudiantes que acceden a la ESU	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
	Metodología para facilitar la pertinencia de los programas curriculares de las IES	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
	Metodología para la implementación del proceso de ordenamiento de la oferta de Educación Superior	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
	Número de programas de capacitación virtual ejecutados para la mejora de gestión académica de las IEST públicas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
			Modify Physical Historical Actual	SONIAS	9/28/2022
	Número de programas ejecutados de mejora de gestión de la I+D+i de las universidades públicas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión académica de las IEST públicas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión académica de las universidades públicas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión administrativa de las IEST públicas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
	Número de programas ejecutados de mejora de la gestión administrativa de las universidades públicas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
	Proyectos de Inversión Pública para las IEST beneficiarias completados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
	Proyectos de Inversión Pública para las universidades beneficiarias completados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022

Sectores Productivos con programas formativos basados en el Marco Nacional de Cualificaciones	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022
Sectores que cuentan con estándares de competencias desarrollados por los CSC	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SONIAS	9/30/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
9	Inactive		Natural Environment		
	Response Actions				
	9.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
12	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	12.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Technical Design
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Natural Environment
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
20	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	20.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
22	Active		Goods, and Services		
	Response Actions				
	22.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	22.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
23	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	23.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Intra/Inter Coordination
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Project Monitoring & Evaluation
