


PMR Public Report

Operation Number	UR-L1112	Chief of Operations Validation Date	10/07/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Comprehensive Citizen Security Program	Loan Number	3785/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DEL INTERIOR	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	ABIZANDA MIRO, BEATRIZ	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-L1112	6,000,000	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	6,000,000	5,100,000	85.00%	900,000
Aggregated	6,000,000	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	6,000,000	5,100,000	85.00%	900,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

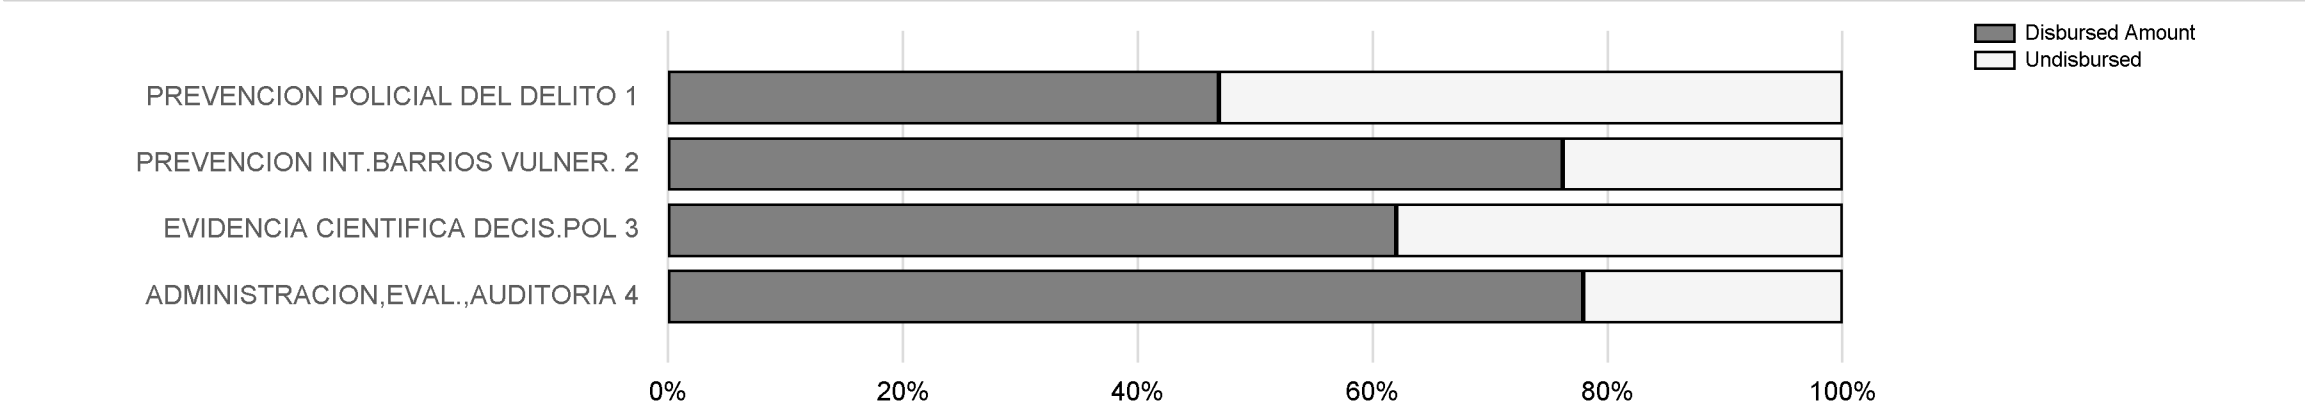

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 0: Reducir los delitos violentos contra la propiedad (rapiña) y contra las personas (violencia intrafamiliar y juvenil)							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	I.1 Población de 18 años o más que manifiesta haber sido víctima de un robo violento (rapiña) en los últimos 12 meses en Uruguay.	%	4.4	2016	2022	P	3.7
						A	-
Details							
Means of Verification: Encuesta de Victimización (EdV) (INE, MI)							
Observations: En base a Braga (2005), que encuentra un efecto promedio de Hot Spots Policing en los delitos violentos de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. Teniendo en cuenta que el 81% de las rapiñas son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.							
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.1	I.2 Mujeres de 15 años o más que tienen o han tenido pareja que vivieron situaciones de violencia de género por parte de sus parejas y ex parejas en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	26.4	2016	2022	P	25.9
						A	-
Details							
Means of Verification: Encuesta de Género (EdG) (INE, MI)							
Observations: Abramsky et al. (2016) estiman que el programa reduce 50% la tasa de violencia de género intrafamiliar se aplicará en los barrios Marconi/Casavalle, y se opta por un criterio conservador estimando un impacto de 20%. Dado que el 9,8% de la violencia intrafamiliar de Montevideo se da en Marconi/Casavalle, entonces el impacto en Montevideo se estima que será del orden 2%.							
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.2	I.3 Jóvenes de 18 a 29 años que fueron atacados o amenazados personalmente de modo de sentirse realmente asustado/a en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	7.58	2016	2022	P	6
						A	-
Details							
Means of Verification: EdV (INE, MI)							
Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.							
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.3	I.4 Rapiñas reportadas a la Policía en los últimos 12 meses en Uruguay.	# de rapiñas reportadas	21.13	2016	2022	P	17.75
						A	-
Details							
Means of Verification: Registros Administrativos (MI), Evaluación de impacto							

Observations: Corresponde a Indicador de Estrategia País. Braga (2005) estima un efecto promedio de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. Teniendo en cuenta que el 81% de las rapiñas son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX								
Specific Development Objectives								
Specific Development Objectives Nbr. 0: 1. Reducir la tasa de rapiñas en Montevideo								
Observation:								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2023
0.0	R1.1 Población de 18 años o más que sufrió un robo personal con violencia (rapiña) en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	7.1	2016	P	5.6	-	5.6
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: EdV (INE, MI)								
Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%. R.1.1 y I1.1 están relacionados. R1.1 capta el efecto de la intervención, que es sólo en Montevideo; I1.1 lo que se espera que suceda más allá de la misma, a nivel país.								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2023
0.1	R1.2 Programas para combatir las rapiñas que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0	2016	P	2	-	2
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Informe del CCAU (MI)								
Observations: Se estima que 2 programas (PADO y POP) cumplirán esa característica.								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Specific Development Objectives Nbr. 1: 2. Reducir la tasa de violencia intrafamiliar (de pareja) y juvenil (por y contra jóvenes) en dos barrios piloto de alta vulnerabilidad delictiva en Montevideo (Marconi y Casavalle)								
Observation:								
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2023
1.0	R2.1 Estudiantes de 12 años o más en Marconi y Casavalle que creen que bajo ciertas circunstancias las mujeres deben tolerar la violencia.	%	23	2016	P	18	-	18
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: Encuesta de participantes del Programa en Marconi y Casavalle (INE, MI)								
Observations: En la línea de Abramsky et al. (2016) y tomando un criterio conservador, la matriz refleja un impacto esperado de 20%.								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2023
1.1	R2.2 Residentes de Marconi y Casavalle que fueron atacado/as o amenazado/as personalmente de modo de sentirse realmente asustado/as en los últimos 12 meses.	%	10.92	2016	P	8.75	-	8.75
					A	-	-	-
Details								
Means of Verification: EdV - Seccional 17 (INE, MI)								
Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1: Estrategias focalizadas de prevención policial del delito

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	P1.1 Estrategia de patrullamiento de PADO actualizada, implementada.	Documento	P	-	3	-	90,000
			P (a)	-	5	-	30,492
			A	-	5	-	30,492
1.02	P1.2 Policías patrullando en zonas PADO de Montevideo, entrenados en relacionamiento comunitario y solución de problemas.	# of public officials	P	-	1,100	-	110,000
			P (a)	85	1,101	47,000	112,000
			A	-	1,016	-	65,000
1.03	P1.3 Policías trabajando en jefaturas de zonas operativas de Montevideo entrenados en POP.	# of public officials	P	-	650	-	240,000
			P (a)	51	650	59,000	142,000
			A	29	628	-	83,000
1.04	P.1.4 Jefaturas de zonas operativas que cuentan con el equipamiento para POP .	# seccionales	P	-	25	-	502,732
			P (a)	-	5	39,000	174,000
			A	-	5	-	135,000
1.05	P1.5 Proyectos POP a nivel de jefaturas de zonas operativas de Montevideo, implementados.	# of public officials	P	-	255	-	710,000
			P (a)	10	240	768,000	1,316,000
			A	17	247	-	548,000
1.06	P1.6 Analistas del delito trabajando en la Unidad de Análisis Criminal (UAC), entrenados en POP.	# of public officials	P	-	40	-	125,000
			P (a)	1	40	53,000	125,500
			A	3	42	-	72,500
1.07	P1.7 Informes de Análisis PADO y POP usando software y técnicas de análisis espacial y Tablero de Control, enviados.	# informes	P	-	24	-	345,000
			P (a)	-	24	-	160,000
			A	-	24	-	160,000
1.08	P1.8 Policías y fiscales que hayan cursado un posgrado en investigación criminal, entrenados en nuevas formas de relacionamiento.	# of public officials	P	-	150	-	100,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.09	P1.9 Diseño curricular de curso de investigación criminal para policias y fiscales	# documentos	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	41,000	47,000
			A	1	1	25,000	31,000
1.10	P1.10 Policias que utilizan nuevas camaras corporales en tareas de Prevención del delito	# camaras	P	-	-	-	-
			P (a)	300	300	169,000	243,000
			A	300	300	-	74,000

Component Nbr. 2 2: Prevención integral en barrios de alta vulnerabilidad delictiva

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	P2.1 Jóvenes participantes del Programa “Pelota al Medio a la Esperanza” en Marconi-Casavalle entrenados en habilidades cognitivas de autorregulación.	# jóvenes	P	-	600	-	400,312
			P (a)	300	464	73,000	369,540
			A	82	246	52,000	348,540
2.02	P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.	# participantes	P	-	1,600	-	75,500
			P (a)	150	150	71,000	73,000
			A	64	64	13,000	15,000
2.03	P2.2b Actores estatales y de la sociedad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG	# funcionarios o técnicos OSC	P	-	5,000	-	304,999
			P (a)	250	2,645	26,000	137,000
			A	-	2,395	-	111,000
2.04	P2.3a Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial, capacitados para el trabajo.	# adultos liberados	P	-	160	-	160,000
			P (a)	50	177	92,000	92,000
			A	32	159	-	-
2.05	P2.3b Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial	# adultos liberados	P	-	360	-	423,789
			P (a)	50	727	118,000	581,833
			A	102	779	64,000	527,833
2.06	P2.4 Intervenciones de prevención urbana situacional en Marconi-Casavalle, identificadas como potencialmente positivas y relevantes que se ejecutan efectivamente en orden a la mejora sustancial del espacio físico.	# intervenciones	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	380,920
			A	-	1	-	380,920
2.07	P2.5 Iniciativas para prevención de delitos financiadas en Marconi-Casavalle.	# proyectos	P	-	12	-	200,000
			P (a)	-	4	-	51,116
			A	-	4	-	51,116
2.08	P2.6 Dispositivos electrónicos para monitoreo de medidas de contención de violencia de género	# dispositivos instalados anualmente	P	-	-	-	-
			P (a)	140	800	673,000	2,158,000
			A	-	660	-	1,485,000

Component Nbr. 3 3: Promoción de uso de evidencia científica en la toma de decisiones de política

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	P3.1 Centro de Criminología Aplicada del Uruguay (CCAU) conformado, equipado y produciendo reportes.	Crime information systems (#)	P	-	4	-	1,170,834
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.02	P3.2 Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados.	# estudios	P	-	22	-	158,600
			P (a)	4	10	-	-
			A	3	9	-	-
3.03	P3.3 Banco de datos sobre intervenciones con evidencia de impacto en prevención de violencia en funcionamiento en internet.	# banco de datos	P	-	1	-	48,800
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-
3.04	P3.4 Funcionarios de entidades relacionadas con prevención capacitados por CCAU en enfoques basados en evidencia.	# funcionarios	P	-	300	-	73,650
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
3.05	P3.5 EdV de barrios tratados realizada.	# encuestas	P	-	1	-	40,000
			P (a)	-	1	18,000	18,000
			A	-	1	3,000	3,000
3.06	P3.6 Informe intermedio y final del programa realizados.	# informes	P	-	2	-	156,710
			P (a)	2	2	36,000	55,000
			A	1	1	14,000	33,000
3.07	P3.7 Evaluación de impacto del programa realizada, con informe final escrito y aprobado, revisado por pares.	# evaluaciones	P	-	1	-	40,000
			P (a)	1	1	49,000	49,000
			A	-	-	-	-
3.08	P3.8 Proyectos de investigación aplicada del Fondo Sectorial realizados, en forma de documento de trabajo o tesis de maestría (con informe de avance o final aprobado), revisados por pares.	# proyectos	P	-	40	-	1,082,228
			P (a)	9	16	41,000	373,000
			A	2	9	-	332,000
3.09	P3.9 Funcionarios e investigadores capacitados en cursos de universidades extranjeras sobre seguridad ciudadana, certificados.	# of public officials	P	-	75	-	329,400
			P (a)	145	177	238,000	241,000
			A	-	32	44,000	47,000

Other Cost				
	Administración y Monitoreo del Programa	P		627,045
		P (a)	316,000	1,024,506
		A	151,000	859,506
	Auditoría	P		50,000
		P (a)	18,000	46,000
		A	10,000	38,000
Total Cost				
	Total Cost	P	0	8,000,000
		P (a)	2,945,000	7,999,907
		A	376,000	5,430,907

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	P1.2 Policías patrullando en zonas PADO de Montevideo, entrenados en relacionamiento comunitario y solución de problemas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIADUT	9/29/2022
			Modify Financial Historical Actual	MARIADUT	9/29/2022
	P1.7 Informes de Análisis PADO y POP usando software y técnicas de análisis espacial y Tablero de Control, enviados.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIADUT	9/29/2022
			Modify Physical Historical Actual	MARIADUT	9/29/2022
	P1.9 Diseño curricular de curso de investigación criminal para policías y fiscales	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIADUT	9/29/2022
			Modify Physical Historical Actual	MARIADUT	9/29/2022
	P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIADUT	9/29/2022
			Modify Financial Historical Actual	MARIADUT	9/29/2022
	P2.2b Actores estatales y de la sociedad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIADUT	9/29/2022
			Modify Financial Historical Actual	MARIADUT	9/29/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	9.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Human Resources
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	30.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
32	Active		Planning
	Response Actions		
	32.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
34	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	34.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
36	Active		Planning
	Response Actions		
	36.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
