


PMR Public Report

Operation Number	PN-L1105	Chief of Operations Validation Date	11/11/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	11/11/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Social Inclusion and Development Program	Loan Number	3512/OC-PN, 3512/OC-PN-1, 3512/OC-PN-2
Executing Agency	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	FREIRE SAMUDIO, CAROLINA ANGELICA	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Panama
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	COMISIÓN E-PANAMÁ		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	12/12/21
Safeguard Performance Rating - Rationale	El programa está en proceso de cumplir con las salvaguardas ambientales y sociales, no hay pasivos ambientales y sociales en las intervenciones que el Banco ha financiado. Ha habido un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) que ha ido a licitación sin el compromiso de implementación del PGAS. Se está dando seguimiento para que no vuelva a pasar con futuros CAIPIs.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PN-L1105	50,000,000	50,000,000		0	0	50,000,000	35,301,254.3	70.60%	14,698,745.7
Aggregated	50,000,000	50,000,000		0	0	50,000,000	35,301,254.3	70.60%	14,698,745.7

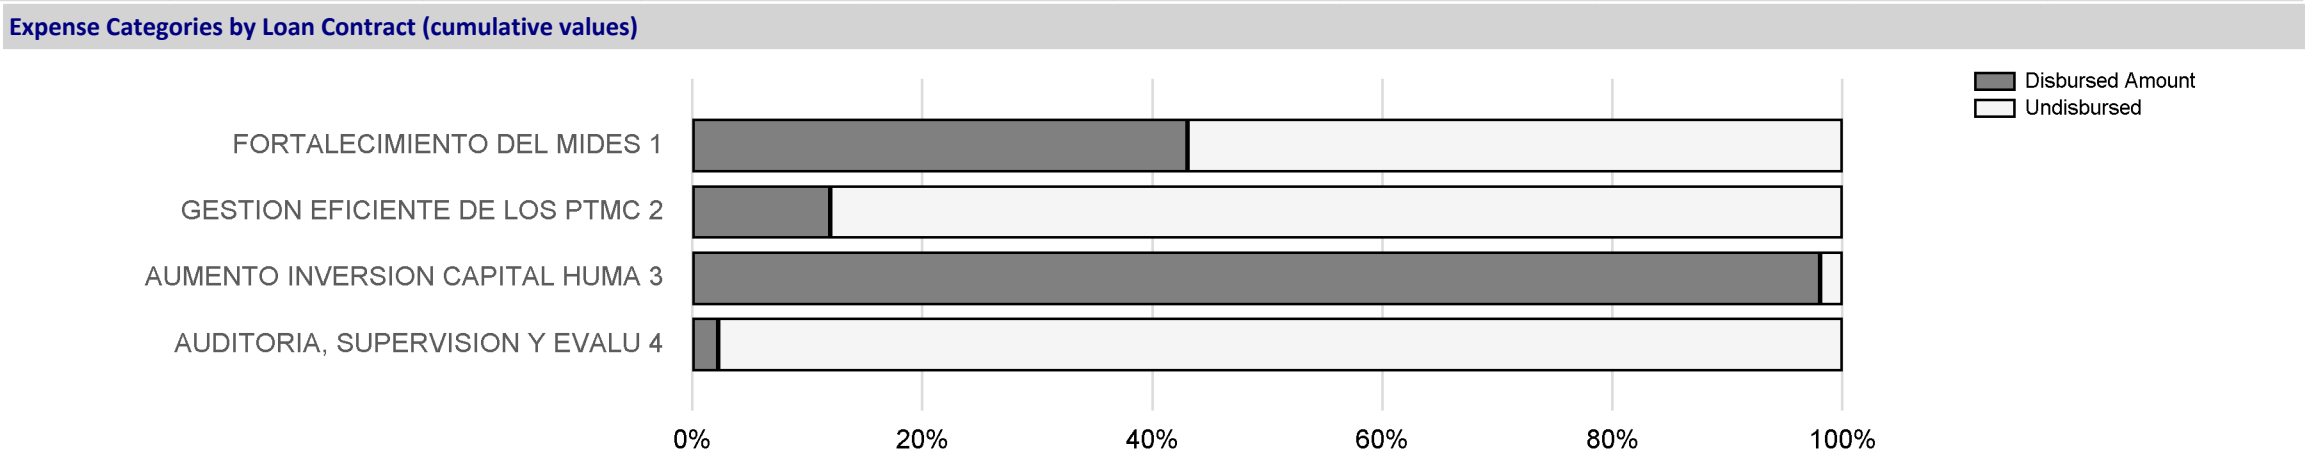

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el país y aumentar la capacidad del sistema de protección social para promover la acumulación de capital humano

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Incidencia de pobreza extrema	%	15	2020	2023	P	15
						A	15
Details							

Means of Verification: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC): Encuesta de propósitos múltiples (marzo); Encuesta de mercados laborales (agosto). Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general)

Observations: Se ha estimado que los efectoseconómicos de la pandemia provocarán un aumento en la pobreza. Las metas han sido ajustadas para reflejar el impacto del programa ante la crisis, evitando que la pobreza aumente. A calcular con base en datos de la encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC1. Líneas de pobreza (extrema y general) obtenidas del MEF(2) (2) Las líneas de pobreza se calculan a partir del valor de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y la Canasta Básica no alimentaria, El valor de la CBA determina el ingreso per cápita necesario para que un hogar no se encuentre en situación de pobreza extrema (línea de pobreza extrema). La suma de la CBA y la CBNA determina el umbral de ingreso per cápita imprescindible para no encontrarse en situación de pobreza no extrema (línea de pobreza general).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.3	Incidencia de pobreza			%	35	2020	2023	P	35
								A	35
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.4	Niños en los CAIPI que tienen un desarrollo en resolución de problemas (cognición) no adecuado para su edad, lo que equivale a un puntaje del ASQ-3 por debajo del umbral crítico para la población de referencia (US)	%	14.2	2019	2023	P	12
						A	12
Details							

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Fortalecer al MIDES en su rol rector y ejecutor de las políticas y programas sociales

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
1.0	Direcciones de Inclusión y Desarrollo Social (DIDS) que implementan los ciclos operativos de los PTMC de forma consolidada	%	2015	2022	P	80
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
1.3	Direcciones regionales del MIDES fortalecidas	%	2015	2022	P	42
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejorar la focalización y eficiencia distributiva del gasto social en los PTMC

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
2.0	Beneficiarios de la RdO que no son pobres extremos (filtración)	%	49.5	2020	P	49.5
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
2.3	Beneficiarios del Programa 120 a los 65 que no son pobres (filtración)	%	48.3	2020	P	48.3
					A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
2.4	Beneficiarios de Ángel Guardián (AG) que no son pobres extremos (filtración)	%	83.4	2020	P	83.4
					A	-
Details						
Means of Verification:						
Observations:						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
2.5	Beneficiarios de 120 a los 65 recertificados	%	0	2015	P	100,000
					A	-
Details						
Means of Verification:						
Observations:						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
2.6	Beneficiarios de ÁG recertificados	%	0	2015	P	8,000
					A	-
Details						
Means of Verification:						
Observations:						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
Specific Development Objectives Nbr. 3: Disminuir las brechas de cobertura y calidad de servicios integrales dirigidos a la primera infancia						
Observation:						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2023	
3.0	CAIPI que aplica los estándares de calidad aprobados por el MIDES	%	0	2015	P	50
					A	-
Details						
Means of Verification:						
Observations:						
Evaluation Methodology: -						
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del MIDES a nivel central y territorial

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Personal de la Secretaría Técnica de Gabinete Social (STGS) contratado	# funcionarios	P	-	6	-	908,320.74
			P (a)	-	6	-	908,320.74
			A	-	6	-	908,320.74
1.02	Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete Social (STGS) y enlaces gubernamentales capacitados	# funcionarios	P	-	78	-	6,675
			P (a)	-	78	-	6,675
			A	-	78	-	6,675
1.03	Dirección de programas para la administración, supervisión y monitoreo de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) conformada	# direcciones	P	-	1	-	586,695.83
			P (a)	-	1	-	586,695.83
			A	-	1	-	586,695.83
1.04	Funcionarios de las Direcciones de Programas capacitados en gestión de los Programas de Transferencia Monentaria Condicionada (PTMC)	# funcionarios	P	-	121	-	47,480
			P (a)	-	121	-	47,480
			A	-	121	-	47,480
1.05	Funcionarios de las Direcciones Técnicas del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) formados	# funcionarios	P	-	135	-	40,286
			P (a)	-	135	-	40,286
			A	-	135	-	40,286
1.06	Unidad Coordinadora de Primera Infancia en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) institucionalizada	# funcionarios	P	-	7	-	971,589.79
			P (a)	-	7	-	971,589.79
			A	-	7	-	971,589.79
1.07	Esquema de promotor único del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) diseñado	# manual	P	-	1	-	88,710
			P (a)	-	1	-	88,710
			A	-	1	-	88,710
1.08	Promotores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) capacitados en protocolo de servicios	# de promotores	P	-	672	-	105,831.18
			P (a)	-	672	-	105,831.18
			A	-	672	-	105,831.18
1.09	Promotores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) pagados	# de promotores	P	140	490	147,154	1,864,752.98
			P (a)	140	490	147,154	1,864,752.98
			A	140	490	147,154	1,864,752.98
1.10	Direcciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Central equipadas con mobiliario y equipo tecnológico	# oficinas	P	1	4	62,243	1,639,908.23
			P (a)	1	4	62,243	1,639,908.23
			A	1	4	62,243	1,639,908.23
1.11	Direcciones Regionales acondicionadas	# direcciones regionales	P	1	7	102,879	2,751,458.74
			P (a)	1	7	102,879	2,751,458.74
			A	1	5	102,879	2,665,234.39
1.12	Sistema de interconexión de las Direcciones Regionales con la sede central en funcionamiento	# Sistema	P	-	1	-	199,127.83
			P (a)	-	1	-	199,127.83
			A	-	1	-	199,127.83

Component Nbr. 2 Gestión Eficiente de los PTMC

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Criterios e instrumentos por cada PTMC aprobados	Reglamento Operativo	P	-	3	-	10,700
			P (a)	-	3	-	10,700
			A	-	3	-	10,700
2.02	Formulario Único de Protección Social adoptado por los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada	# programas	P	-	4	-	129,020.25
			P (a)	-	4	-	129,020.25
			A	-	4	-	129,020.25
2.03	Funcionarios capacitados en el manejo de la Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB)	# funcionarios	P	30	30	744	744
			P (a)	30	30	744	744
			A	-	-	744	744
2.04	Plataforma Integrada de Información de Beneficiarios (PIIB) diseñada, equipada y con servicio de alojamiento	# sistemas	P	-	1	398,842	2,854,853.98
			P (a)	-	1	398,842	2,854,853.98
			A	-	1	398,842	2,190,116.48

Component Nbr. 3 Aumento de la Inversión en Capital Humano

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Instrumentos de recopilación de información para verificación de corresponsabilidades creados	# Instrumentos	P	-	2	-	31,137.12
			P (a)	-	2	-	31,137.12
			A	-	2	-	31,137.12
3.02	Número de beneficiarios de la Red de Oportunidades (RdO) que reciben transferencias monetarias en base a la verificación de corresponsabilidades a través del SIG	# of beneficiaries	P	-	39,586	-	22,443,047.05
			P (a)	-	39,586	-	22,443,047.05
			A	-	39,586	-	22,443,047.05
3.03	Estándares de calidad para aplicación de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años desarrollados	# estándares y guías	P	-	10	45,300	554,452.62
			P (a)	-	10	45,300	554,452.62
			A	-	10	45,300	554,452.62
3.04	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) construidos	# Centros	P	-	3	-	1,525,564.4
			P (a)	-	3	-	1,525,564.4
			A	-	2	-	1,525,564.4
3.05	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) rehabilitados	# Centros	P	1	17	213,000	9,398,002
			P (a)	1	17	213,000	9,398,002
			A	1	13	213,000	6,123,898.58
3.06	Modelo comunitario de atención integral a la primera infancia para comarcas indígenas y áreas rurales dispersas diseñada	# esquema	P	-	1	-	36,141
			P (a)	-	1	-	36,141
			A	-	1	-	36,141
3.07	Menores de cinco años que cuentan con la Libreta del niño	# niños	P	-	18,000	1,855	39,901.84
			P (a)	-	18,000	1,855	39,901.84
			A	-	18,000	1,855	39,901.84
3.08	Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) con modelo de pago de cápita implementado	# Centros	P	-	49	-	333,561.44
			P (a)	-	49	-	333,561.44
			A	-	49	-	333,561.44
3.09	Niños menores de cinco años atendidos modalidad comunitaria	# of beneficiaries	P	1,200	1,200	526,359	2,224,095.3
			P (a)	1,200	1,200	526,359	2,224,095.3
			A	1,200	1,200	526,359	647,571.7
3.10	CAIPI mejorados	# Centros	P	-	38	1,585,247	3,227,342.12
			P (a)	-	38	1,585,247	3,227,342.12
			A	-	-	793,402	793,402

Other Cost				
	Auditoria Operativa y Financiera del Programa	P	17,816.75	96,997.5
		P (a)	17,816.75	96,997.5
		A	0	61,364

	Supervisión del Programa	P	11,542.51	41,537.36
		P (a)	11,542.51	41,537.36
		A	3,240	27,234.85
	Monitoreo y Evaluación del Programa	P	2,161	2,161
		P (a)	2,161	2,161
		A	2,161	2,161
Total Cost				
	Total Cost	P	3,115,143.26	55,450,795.3
		P (a)	3,115,143.26	52,160,095.3
		A	2,297,179	44,074,630.3

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	9.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Planning
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Stakeholder Priorities
