


PMR Public Report

Operation Number	UR-L1110	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/14/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Support the National Integrated Care System	Loan Number	3706/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	BAGOLLE, ALEXANDRE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Por el momento no hay obras en ejecución y se están focalizando en definir los acuerdos interinstitucionales para ejecutar las obras. El ejecutor no cuenta con un especialista socioambiental ni una unidad o departamento para gestionar estos aspectos. Tanto el MGAS como el PGAS de la operación no contemplan la nueva tipología de obras que quiere incluir el ejecutor en el Programa, que consisten en remodelaciones o ampliaciones en centros existentes que atienden a infancia y adolescencia en situación de riesgo psicosocial Las obras suelen ser realizadas por terceros sobre los cuales el ejecutor no realiza seguimiento de los aspectos ambientales, sociales ni de salud y seguridad laboral y comunitaria ni se reportan estos aspectos al Banco.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-L1110	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	32,969,753.85	65.94%	17,030,246.15
Aggregated	50,000,000	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000	50,000,000	32,969,753.85	65.94%	17,030,246.15

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

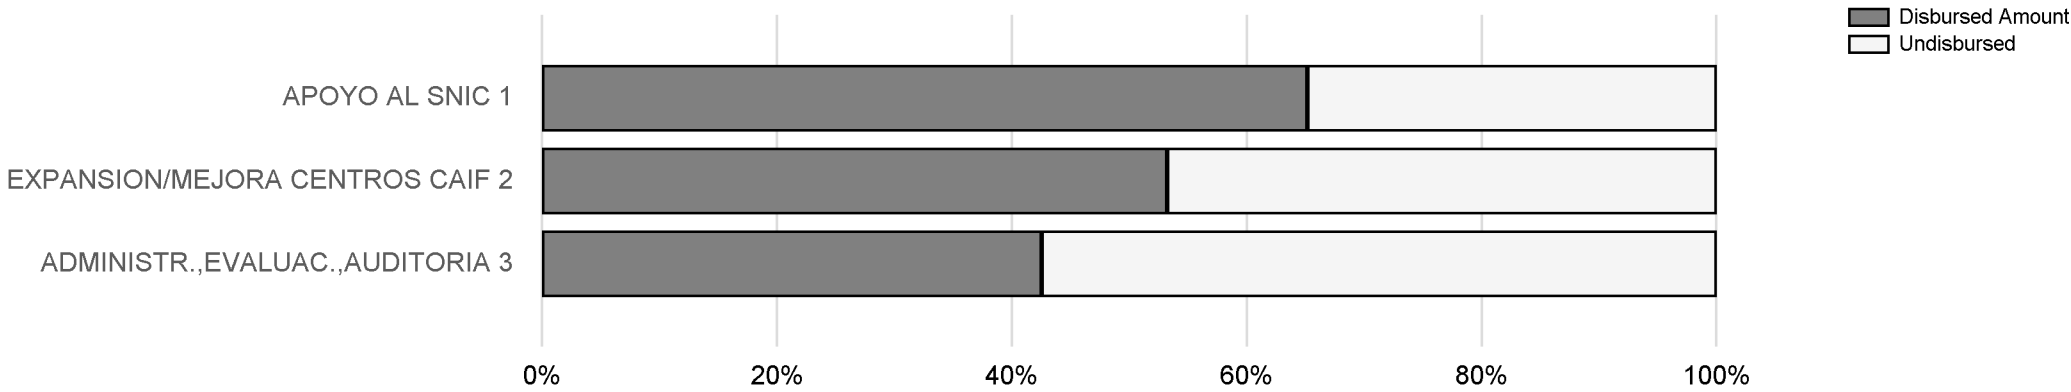

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Niños en nuevos centros CAIF con puntaje ASQ-3 por debajo de un umbral crítico.	% niños en nuevos centros CAIF	14	2016	2022	P	10
						A	-

Details

Means of Verification: Informes SNIC/DINEM-INAU

Observations: ASQ-3 es una herramienta de detección precoz de rezagos en el desarrollo infantil.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.1	Centros CAIF nuevos con puntaje ITERS-R entre 5 y 7.			% centros CAIF	0	2016	2022	P	80
								A	-
Details									

Means of Verification: Informes SNIC/DINEM-INAU

Observations: ITERS-R es un instrumento de medición de calidad en centros para niños.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.2	Brecha en la carga global de trabajo entre mujeres y hombres de Q1.			hs semanales de trabajo	9	2016	2022	P	7
								A	-
Details									

Means of Verification: EUT 2013 y 2019

Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.3	Carga de trabajo no remunerado de cuidado infantil.			hs semanales de cuidado infantil	21.2	2016	2021	P	20
								A	-
Details									

Means of Verification: EUT 2013 y 2019

Observations: Línea de base a partir de EUT 2013 y seguimiento EUT 2019. En el caso de este indicador, hay una línea de base y una meta para mujeres (21.2) y otra para varones (14.8)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		
		Mujeres			P	20
					A	-
		Varones			P	16
					A	-

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de las personas en situación de dependencia en el marco del SNIC.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
0.0	Porcentaje de cuidadores registrados en el RNC.	%	0	2016	P	25	50	-	50
					A	25	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
0.1	Porcentaje de instituciones prestadoras de servicios registradas en el RNC.	%	0	2016	P	75	100	-	100
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
0.2	Porcentaje de usuarios registrados en el RNC.	%	0	2016	P	50	100	-	100
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
0.3	Porcentaje de instituciones formadoras de RRHH registradas en el RNC.	%	0	2016	P	50	100	-	100
					A	100	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de información del SNC

Observations: En comparación con estimación de universo de la SNC

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2021	2023	EOP 2023
0.4	Número de postulaciones para prestaciones.	#	0	2016	P	3,500	5,000	-	5,000
					A	10,000	-	-	-
Details									
Means of Verification: Sistemas de información del SNC									
Observations: Las prestaciones a considerar son: Asistente Personal, Tele asistencia, Centro de día, y Casa comunitaria Definir postulación como: beneficiario elegible (cumple requisitos) y está ingresado en el RNC.									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2021	2023	EOP 2023
0.5	Porcentaje de personas con conocimiento de derechos y prestaciones en el marco del SNIC.	%	0	2016	P	25	50	-	50
					A	46	-	-	-
Details									
Means of Verification: Informes SNIC									
Observations: Informe producido a partir de encuesta a ser realizada por la SNC									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2021	2023	EOP 2023
0.6	Porcentaje de trabajadores de CAIF nuevos, formados según nueva currícula.	%	0	2016	P	50	80	-	80
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Informes semestrales de avance, e informe específico sobre calidad de centros.									
Observations: Se mide sobre los centros CAIF nuevos operando en el momento de medición									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2021	2023	EOP 2023
0.7	Porcentaje de usuarios satisfechos por al pertinencia de las innovaciones del Pl.	%	60	2016	P	80	90	-	90
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Informes semestrales de avances del programa.									
Observations: Medición que forma parte de la agenda de conocimiento del SNIC									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019		2021	2023	EOP 2023
0.8	Porcentaje de niños de los CAIF pertenecientes a hogares elegibles para AFAM Plan de Equidad (condición de vulnerabilidad socioeconómica)	%	64	2016	P	68	72	-	72
					A	-	-	-	-
Details									

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2021	2023	EOP 2023
0.9	Tasa de matriculación de los nuevos centros CAIF (niños/cupos)			tasa niños/cupos	0	2016	P	85	95	-	95
							A	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Registros administrativos INAU

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Diseño del Portal de Cuidados aprobado por SNIC.	Portal	P	-	1	-	561,645
			P (a)	-	1	-	92,839.08
			A	-	1	-	92,839.08
1.02	Nuevas funcionalidades del Portal de Cuidados habilitadas con carga de datos de casos reales.	# nuevas funcionalidades	P	-	5	-	4,036,083
			P (a)	4	5	1,949,431	9,454,512.23
			A	-	4	1,054,419	7,178,653.23
1.03	Diseño de Registro Nacional de Cuidados aprobado por SNIC.	Documento - disño RNC	P	-	1	-	150,898
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-
1.04	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	# módulos RNC	P	-	5	-	878,722
			P (a)	3	5	430,764	4,603,656.13
			A	-	3	173,242	4,006,082.13
1.05	Personas valoradas en relación a su situación de dependencia.	# personas valoradas	P	-	10,500	-	1,544,144
			P (a)	2,000	20,127	166,895	936,853.19
			A	-	16,127	87,648	745,679.19
1.06	Campañas de comunicación implementadas.	# campañas de comunicación	P	-	4	-	3,318,400
			P (a)	-	5	-	703,915.47
			A	-	5	-	718,051.47
1.07	Encuestas de opinión realizadas.	# encuestas de opinión	P	-	5	-	85,400
			P (a)	-	3	-	78,023.1
			A	-	3	-	78,023.1
1.08	Iniciativas territoriales de comunicación financiadas e implementadas.	# iniciativas territoriales de comunicación	P	-	120	-	1,046,875
			P (a)	-	74	3,050	831,378.78
			A	-	74	3,050	831,378.78
1.09	Líneas de trabajo que cuentan con productos comunicacionales.	# líneas de trabajo	P	-	15	-	1,007,573
			P (a)	1	13	-	1,090,466.72
			A	1	13	-	1,077,697.72
1.10	Estudios de la agenda de conocimiento publicados en el sitio web.	# estudios	P	-	12	-	1,197,186
			P (a)	1	10	50,000	279,791.58
			A	-	9	-	179,791.58

1.11	Informes de avances y resultados de la agenda de conocimiento del SNIC elaborados y aprobados por SNIC y DINEM/MIDES.	# informes de avance y resultados	P	-	3	-	339,484
			P (a)	-	4	-	300,632.98
			A	-	4	-	300,632.98
1.12	Prestaciones reguladas.	# prestaciones reguladas	P	-	28	-	880,418
			P (a)	-	23	186,780	735,364.87
			A	-	23	94,138	604,042.87
1.13	Centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisados por MEC o ANEP) censados	Documento - diseño de instrumento	P	-	1	-	133,379
			P (a)	-	-	-	70,627
			A	-	-	-	70,627
1.14	Currícula de los cursos de formación de RRHH en PI aprobados por la Comisión de formación del SNIC.	currícula de cursos	P	-	1	-	608,653
			P (a)	-	1	8,825	315,806.32
			A	-	1	-	265,725.32
1.15	Modelo de supervisión de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por MEC.	Documento - modelo de supervisión	P	-	1	-	442,491
			P (a)	-	1	27,582	272,762.11
			A	-	1	13,895	237,965.11
1.16	Centros de educación y cuidado infantil supervisados por MEC con el nuevo modelo.	# de centros de educación y cuidado infantil	P	-	980	-	851,717
			P (a)	-	1,203	-	523,514.27
			A	-	1,203	19,622	543,137.27
1.17	Diseño de instrumento de medición de la calidad de los centros de educación y cuidado infantil aprobado por INAU y MEC.	Documento - diseño instrumento de medición de calidad	P	-	1	-	61,000
			P (a)	-	2	-	51,350.76
			A	-	1	-	41,590.76
1.18	Centros de educación y cuidado infantil evaluados con el instrumento de medición de calidad.	# centros de educación y cuidado infantil	P	-	980	-	91,500
			P (a)	230	980	122,000	183,000
			A	-	130	-	-
1.19	Pilotos de innovaciones en primera infancia implementados.	# pilotos de innovaciones	P	-	5	-	1,039,311
			P (a)	-	5	33,690	806,681.95
			A	-	5	13,577	745,312.95
1.20	Pilotos de innovaciones para Personas Mayores implementados	# pilotos de innovaciones	P	-	-	-	-
			P (a)	2	4	930,233	1,860,466
			A	1	1	116,662	116,662

Component Nbr. 2 Expansión y mejora de la calidad de Centros de Atención a la Infancia y Familia (CAIF)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Centros CAIF nuevos que cuentan con dotación de personal (técnico y de gestión) adecuado.	# centros CAIF	P	-	142	-	122,001
			P (a)	-	119	-	-
			A	-	77	-	-
2.02	Centros CAIF construidos.	# centros CAIF	P	-	50	-	37,939,310
			P (a)	-	25	-	19,107,097.43
			A	-	24	-	19,354,912.43
2.03	Centros CAIF que implementan el Programa de Parentalidades Comprometidas	# centros CAIF	P	-	70	-	592,787
			P (a)	140	83	189,788	1,011,036.77
			A	-	124	50,124	746,714.77
2.04	Centros de educación y cuidado infantil de INAU (CAIF, Nuestros Niños y CAPI) evaluados con el instrumento de medición de calidad de los centros validado.	# centros de educación y cuidado infantil	P	-	600	-	666,270
			P (a)	-	10	53,324	436,444.53
			A	-	10	26,862	369,170.53
2.05	Centros de protección y atención a niños, niñas y adolescentes de INAU con infraestructura mejorada.	# Centros de protección y atención	P	-	-	-	-
			P (a)	-	13	1,630,982	1,630,982
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Ejecución, evaluación y monitoreo

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Mediciones para la evaluación de impacto de CAIF realizadas.	# mediciones	P	-	3	-	915,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-

Other Cost				
	Administración y ejecución del proyecto	P		6,393,153
		P (a)	159,713	2,637,769.76
		A	77,977	2,442,902.76
	Evaluación y auditoría	P		60,000
		P (a)	9,000	62,330.7
		A	10,894	55,224.7
	Fondos sin asignar	P		0
		P (a)		26,258,905.27
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P	0	65,000,000
		P (a)	5,952,057	74,336,209
		A	1,742,110	40,802,817.73

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Diseño de un censo de centros de educación y cuidados de gestión privada (supervisado por MEC o ANEP)	Modify Output	Inactivate Output	CARLOSFAC	10/12/2022
	Módulos del Registro Nacional de Cuidados en funcionamiento.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a)	CARLOSFAC	10/13/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Social Environment
	Response Actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Inactive		Social Environment
	Response Actions		
	21.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Materialized		Institutional Environment
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	27.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
29	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	29.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	30.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Project Management Capacity
Intra/Inter Coordination
Stakeholder Priorities
