


# PMR Public Report

Operation Number	AR-L1309	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Support the Equity and Effectiveness of the Social Safety Net in Argentina -Phase II	Loan Number	4806/OC-AR, 4806/OC-AR-1, 4806/OC-AR-2, 4806/OC-AR-3, 4806/OC-AR-4
Executing Agency	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CON ENFOQUE SECTORIAL AMPLIO , MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	SANCHEZ, MARIO ALBERTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1309	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	597,281,380	99.55%	2,718,620
Aggregated	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	597,281,380	99.55%	2,718,620

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)
---

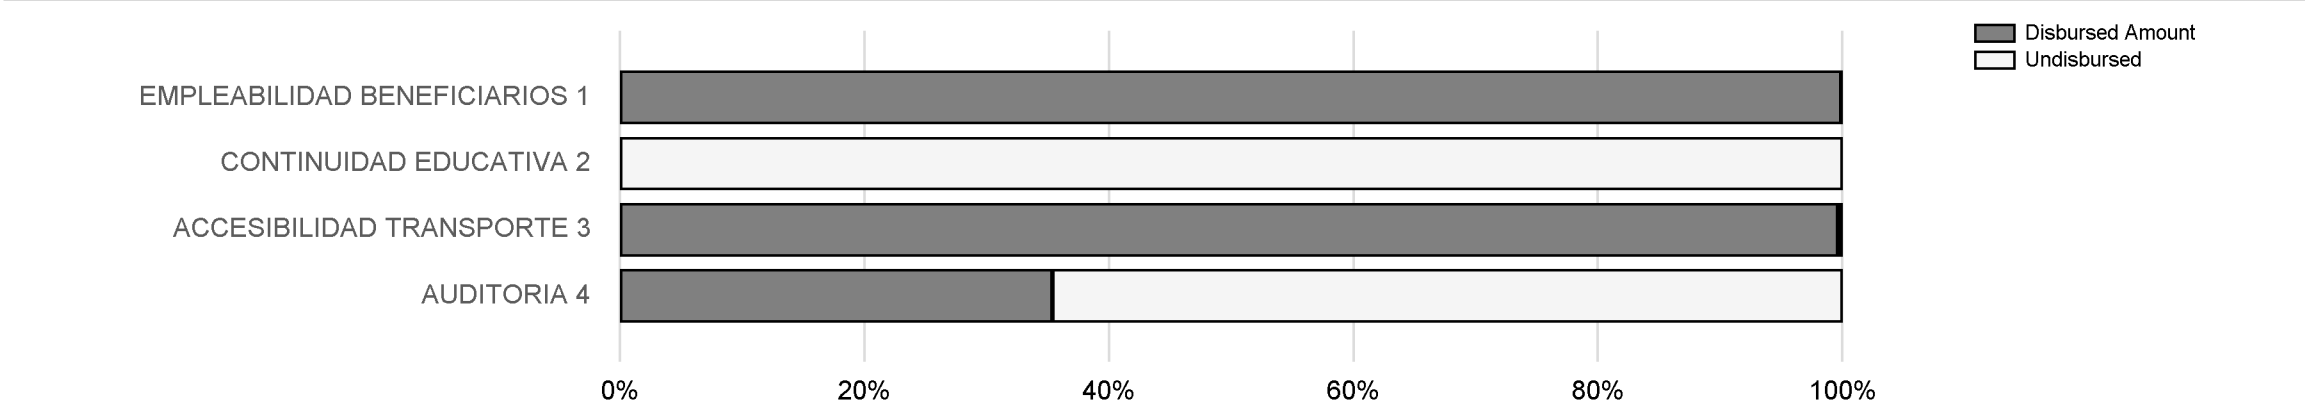

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Aumento del empleo registrado en el sector formal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acceden a un empleo registrado en el sector formal	%	3	2017	2021	P	5
						A	-

Details

Means of Verification: Reporte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en base a datos administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Observations: Se mantiene la meta prevista para la Fase I, debido al deterioro de las condiciones del mercado laboral.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 2: Aumento del porcentaje de jóvenes que aprueban las materias según el plan de estudios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
2.0	Beneficiarios de Becas Progresar en el nivel superior que aprueban al menos 50% de las materias requeridas según su plan de estudios	%	20	2017	2020	P	35
						A	-

Details

Means of Verification: Reporte del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en base a datos administrativos de las universidades y las instituciones de educación terciaria

Observations: Se prevé que a partir de julio de 2019 el Banco Mundial financie las Becas Progresar.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 3: Mayor ahorro en transporte como porcentaje del gasto no alimentario

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
3.0	Ahorro promedio en gastos de transporte debido a la Tarifa Social como porcentaje del gasto no alimentario de los hogares de menores ingresos	%	4	2017	2021	P	5
						A	-

Details

Means of Verification: Cálculo en base a la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2012-2013 y datos del Ministerio de Transporte

Observations: Primeros tres deciles de la distribución del ingreso per cápita del hogar.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Empleabilidad de población vulnerable mejorada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acreditaron la finalización de cursos de formación laboral integral en los últimos 12 meses	%	3	2017	P	-	60	-	60
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reporte del MSDS con base en datos administrativos de las instituciones homologadas y/o los certificados presentados por los titulares en ANSES

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
0.2	Titulares de Hacemos Futuro con secundario incompleto que asistieron a un establecimiento educativo en los últimos 12 meses	%	31	2017	P	-	45	-	45
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reporte del MSDS en base a los certificados presentados por los titulares en ANSES.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Regularidad educativa entre jóvenes de 18 a 24 años mantenida

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
1.0	Beneficiarios de las Becas Progresar en el nivel superior que mantienen la regularidad al finalizar el ciclo lectivo	%	49	2017	P	50	-	-	50
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reporte del MECCT en base a información administrativa de las universidades e instituciones de educación terciaria a nivel nacional

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Acceso al servicio de transporte público por parte de la población vulnerable aumentado

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
2.0	Cobertura a nivel nacional del subsidio social a la tarifa de transporte a través del SUBE	%	27.3	2017	P	-	29.3	-	29.3
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reporte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) en base a datos administrativos del universo de beneficiarios potenciales.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 4: Sostenibilidad de programas de transferencias a población vulnerable

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
4.0	Hogares cuyos ingresos caen por debajo de la línea de pobreza que reciben transferencias de la Tarjeta Alimentar, en el marco del proyecto	%	0	2021	P	-	90.9	-	90.9
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1.1 Apoyo al ingreso con contraprestación en formación de capital humano

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Personas por año que recibieron transferencia con contraprestación de formación	# of beneficiaries	P	-	236,000	-	394,000,000
			P (a)	-	118,000	-	270,859,052.97
			A	-	118,000	-	270,859,052.97

Component Nbr. 2 1.2 Gestión de la información de programas de ingreso con contraprestación en inversión en capital humano

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Sistema Integrado Unificado (SIU) ampliado	versión del sistema	P	-	1	-	1,500,000
			P (a)	-	1	1,200,000	3,000,000
			A	-	-	1,114,510	1,114,510

Component Nbr. 3 2 Continuidad educativa de jóvenes de familias vulnerables

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Dispositivos de apoyo a PROGRESAR MÁS implementados	Piloto	P	-	1	-	475,500
			P (a)	1	3	158,500	475,500
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 3.1 Subsidio a la tarifa de transporte público focalizado en poblaciones vulnerables

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
4.01	Número de usos de la tarjeta SUBE con el subsidio de la tarifa social	millones de usos por año	P	-	1,105.87	-	203,374,500
			P (a)	-	732.1	-	123,824,228.56
			A	-	732.1	-	123,824,228.56

Component Nbr. 5 3.2 Gestión de la información del sistema de transporte público

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
5.01	Estudio de autotransporte público de pasajeros (APP) en partidos del AMBA	estudio	P	-	1	-	275,000
			P (a)	-	1	-	200,000
			A	-	-	-	-
5.02	Estudio de autotransporte público de pasajeros (APP) en ciudades del interior del país que formen parte de la red SUBE	Protocolo	P	-	1	-	225,000
			P (a)	-	1	-	300,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 6 Población vulnerable del Programa Tarjeta Alimentar

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
6.01	Personas por año que recibieron una transferencia del Programa Tarjeta Alimentar	Personas	P	-	-	-	-
			P (a)	-	207,789	-	201,191,218.47
			A	-	207,789	-	201,191,218.47

Other Cost				
	Auditoría externa	P		150,000
		P (a)	50,000	150,000
		A	42,973.7	96,056.1
Total Cost				
	Total Cost	P	0	600,000,000
		P (a)	1,408,500	600,000,000
		A	1,157,483.7	597,085,066.1

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Materialized		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Materialized		Political Environment
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
19	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	19.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
