


# PMR Public Report

Operation Number	EC-L1236	Chief of Operations Validation Date	10/11/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Support Program for the Social Inclusion of People with Disabilities in Ecuador	Loan Number	4634/OC-EC, 4634/OC-EC-1, 4634/OC-EC-2, 4634/OC-EC-3, 4634/OC-EC-4
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	PINZON ENCISO, LEONARDO ENRIQUE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
EC-L1236	40,081,242	40,081,242	0	0	40,081,242	40,081,242	417,714.76	1.04%	39,663,527.24
Aggregated	40,081,242	40,081,242	0	0	40,081,242	40,081,242	417,714.76	1.04%	39,663,527.24

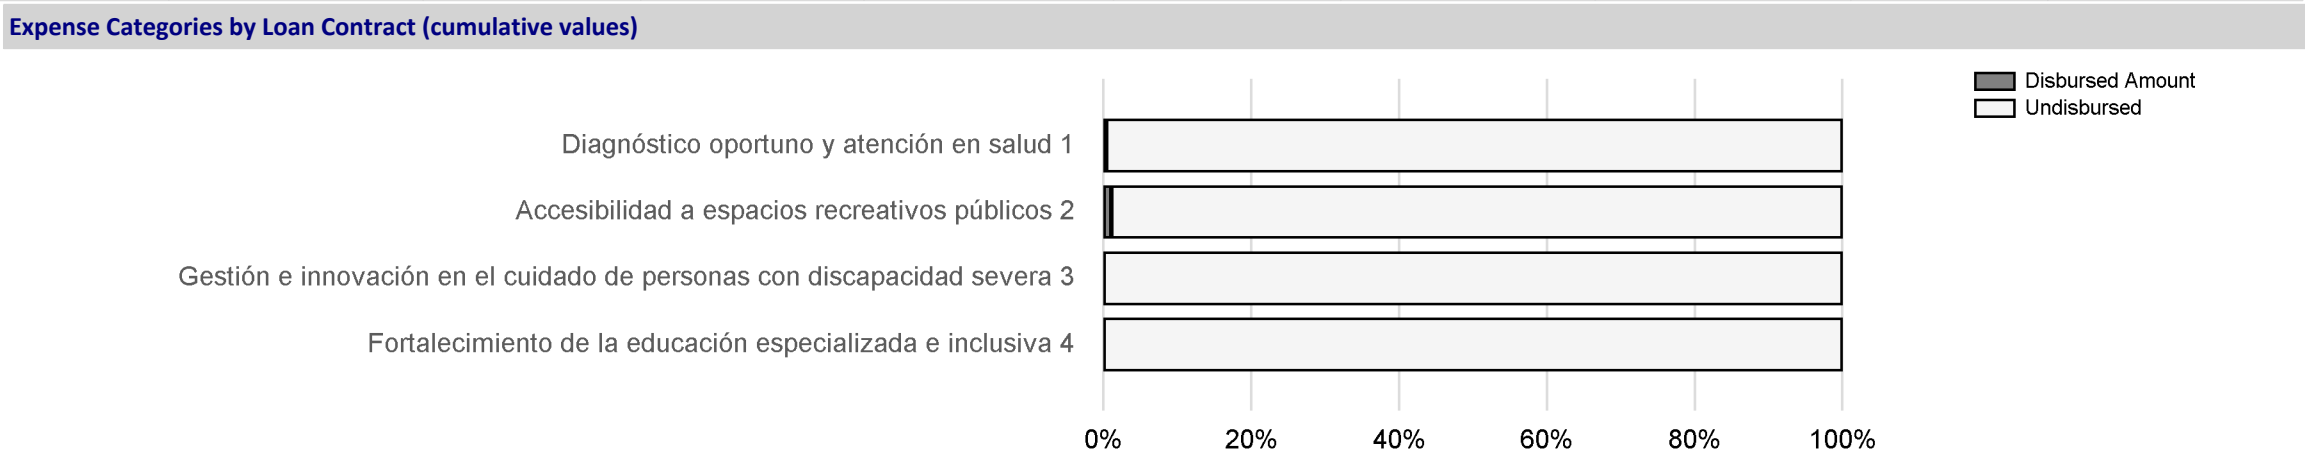

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Atención oportuna en salud, educación de calidad, cuidado diario y recreación para personas con discapacidad mejorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.0	Puntaje de síndrome de sobrecarga en cuidadores de personas con discapacidad	Puntaje	59.9	2018	2024	P	58.7
						A	-

Details

Means of Verification: Instrumento de medición de sobrecarga de cuidador Escala Zarit aplicado en la encuesta de línea de base y seguimiento de la evaluación de impacto del programa

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.1	Porcentaje de personas con discapacidad escolarizadas, con bachillerato aprobado y acceso a educación superior	%	12	2018	2024	P	15
						A	-

Details

Means of Verification: Reporte de MINEDUC (Datos consolidados de la Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva y INEVAL)

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Diagnóstico temprano y calificación de la discapacidad desde primera infancia fortalecido

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.1	Porcentaje de Nacidos vivos con tamizaje auditivo realizado antes de 1 año de edad	%	35.5	2017	P	70	70
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de la DND del MSP

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Porcentaje de Personas con discapacidad registradas, con necesidad de reemplazo de ayuda técnica, que fue atendida	%	0	2018	P	100	100
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de la DND del MSP con base en la base de datos de prescripción de ayudas técnicas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Procedimientos realizados en los servicios de apoyo terapeutico (terapias de rehabilitacion)	#	1563397	2021	P	1,876,076	1,876,076
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de la Dirección Nacional de Centros Especializados del MSP con base en la base de datos que serán reportados trimestralmente de acuerdo a la Clasificación CIF

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Inclusión de niños, niñas y adultos con y sin discapacidad en espacios públicos de recreación aumentada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Tasa de uso de parques inclusivos en las áreas de intervención	%	0	2018	P	1.38	1.38
					A	-	-

Details

Means of Verification: Estudio en colaboración con CONADIS

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

--	--	--

**Specific Development Objectives Nbr. 2:** Modelo de apoyo integral para cuidadores de Personas con Discapacidad implementado

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.1	"Tiempo de respiro" otorgado a cuidadores de personas con discapacidad severa	DE	0	2018	P	.56	.56
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** Informe de la Subsecretaría de Discapacidades con base en el sistema de registro de personas sustitutas de cuidado del MIES que contemple una aplicación de registro en tiempo real de la actividad de personas sustitutas

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

**Specific Development Objectives Nbr. 3:** Educación especializada e inclusiva fortalecida

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.0	Promedio de Grados ofrecidos por escuela especializada	Promedio	10.2	2018	P	11	11
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** AMIE

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.1	Porcentaje de escuelas ordinarias con inclusión de personas con discapacidad	%	45.6	2018	P	50	50
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** AMIE

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.2	Porcentaje de estudiantes con discapacidad con Rezago en unidades educativas especializadas	%	43	2018	P	40	40
					A	-	-

**Details**

**Means of Verification:** AMIE

**Observations:**

**Evaluation Methodology:** -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Diagnóstico oportuno y atención en salud

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Establecimientos de salud equipados para tamizaje auditivo neonatal	Establecimientos	P	110	110	1,933,936	2,300,767
			P (a)	-	110	-	2,300,767
			A	-	-	-	-
1.02	Profesionales de la salud capacitados en el lineamiento de tamizaje auditivo temprano.	Personas	P	110	110	490,436	597,053
			P (a)	-	110	-	597,053
			A	-	-	-	-
1.03	Ayudas técnicas de reemplazo entregadas	Ayudas técnicas	P	23,028	23,028	6,192,534	7,740,667
			P (a)	-	23,028	-	7,740,667
			A	-	-	-	-
1.04	Centros Especializados de Rehabilitación Integrados (CERIS) equipados	Centros	P	5	5	1,625,863	1,625,863
			P (a)	-	5	-	1,625,863
			A	-	-	-	-
1.05	Profesionales de la salud capacitados en rehabilitación	Personas	P	-	45	182,400	304,000
			P (a)	-	45	-	304,000
			A	-	-	-	-
1.06	Informes técnicos y estudios presentados	informes	P	1	4	220,417	828,890
			P (a)	1	4	28,788.72	816,890
			A	1	2	14,364.36	40,754.02

Component Nbr. 2 Accesibilidad a espacios recreativos públicos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	Parques inclusivos instalados	Parques	P	3	45	1,057,481	9,490,746
			P (a)	-	45	386,488.31	9,490,746
			A	-	-	-	-
2.02	Manual de uso, mantenimiento y prevención elaborado	Manual	P	1	1	56,000	56,000
			P (a)	1	1	56,000	56,000
			A	-	-	-	-
2.03	Informes técnicos y estudios presentados	informes	P	1	5	180,596	543,254
			P (a)	1	5	195,544	543,254
			A	1	3	37,913	123,195.37

Component Nbr. 3 Gestión e innovación en el cuidado de personas con discapacidad severa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	Modelo de redes de apoyo con base en su revisión en territorio a través de prueba piloto ajustado	Modelo	P	-	1	-	65,000
			P (a)	1	1	87,360	87,360
			A	-	-	-	-
3.02	Esquema de incentivos diseñado y aprobado	Esquema	P	-	1	-	35,000
			P (a)	1	1	47,040	47,040
			A	-	-	-	-
3.03	Asistentes Principales y Suplentes para el apoyo de personas con discapacidad registrados	Personas	P	9,300	22,500	363,020	463,563
			P (a)	9,300	22,500	379,813.42	463,563
			A	-	-	-	-
3.04	Asistentes Principales de apoyo a personas con discapacidad capacitados	Personas	P	-	11,250	2,844,164	3,991,358
			P (a)	1	11,250	79,999.7	3,991,358
			A	-	-	-	-
3.05	Asistentes Suplentes de apoyo a personas con discapacidad capacitados	Personas	P	-	11,250	-	1,110,332
			P (a)	-	11,250	-	1,110,332
			A	-	-	-	-
3.06	Programa de certificación para asistentes principales y suplentes implementado	certificación	P	-	1	-	1,500,000
			P (a)	-	1	-	1,500,000
			A	-	-	-	-
3.07	Evaluación de impacto realizada	evaluación	P	-	1	164,174	924,156
			P (a)	-	1	16,793.42	924,156
			A	-	-	-	-
3.08	Informes técnicos y estudios presentados	Informe	P	1	4	68,777	681,421
			P (a)	1	3	45,582.14	647,021
			A	1	1	17,193	17,193

Component Nbr. 4 Fortalecimiento de la Educación Especializada e Inclusiva

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
4.01	Equipos de acompañamiento territorial contratados	Personas	P	36	36	484,381	2,017,513
			P (a)	-	36	-	2,017,513
			A	-	-	-	-
4.02	Escuelas con docentes y directivos capacitados	Escuelas	P	-	107	-	871,668
			P (a)	-	107	-	871,668
			A	-	-	-	-
4.03	Escuelas con material didáctico, tecnológico y mobiliario entregados	Escuelas	P	-	107	-	4,502,791
			P (a)	-	107	-	4,502,791
			A	-	-	-	-
4.04	Campaña inclusiva implementada	campaña	P	-	1	-	112,000
			P (a)	-	1	-	112,000
			A	-	-	-	-
4.05	Diagnóstico de educación inclusivo finalizado	Diagnóstico	P	-	1	-	112,000
			P (a)	-	1	-	112,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Evaluación Intermedia	P	28,560	67,200
		P (a)	0	67,200
		A	0	0
	Auditoria	P	28,000	140,000
		P (a)	15,200	152,000

	Auditoria	A	13,571.42	28,771.42
Total Cost				
	Total Cost	P	15,920,739	40,081,242
		P (a)	1,338,609.71	40,081,242
		A	83,041.78	209,913.81

No information available for this section



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Materialized		Internal Processes
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Political Environment
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
20	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	20.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions
