


PMR Public Report

Operation Number	GU-L1163	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Strengthen the Institutional Healthcare Service Network (PRORISS)	Loan Number	4791/OC-GU
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Sector/Subsector	HEALTH-PRIMARY HEALTH CARE
Team Leader	ASTORGA, IGNACIO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Guatemala
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La ejecución de esta operación está en una etapa incipiente donde aún se está conformando la AE con el personal técnico que se requiere para ejecutar el préstamo. Durante el proceso de supervisión no se encontró incumplimientos de las políticas y salvaguardas ambientales y sociales del Banco.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
GU-L1163	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	1,926,041	1.93%	98,073,959
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	1,926,041	1.93%	98,073,959

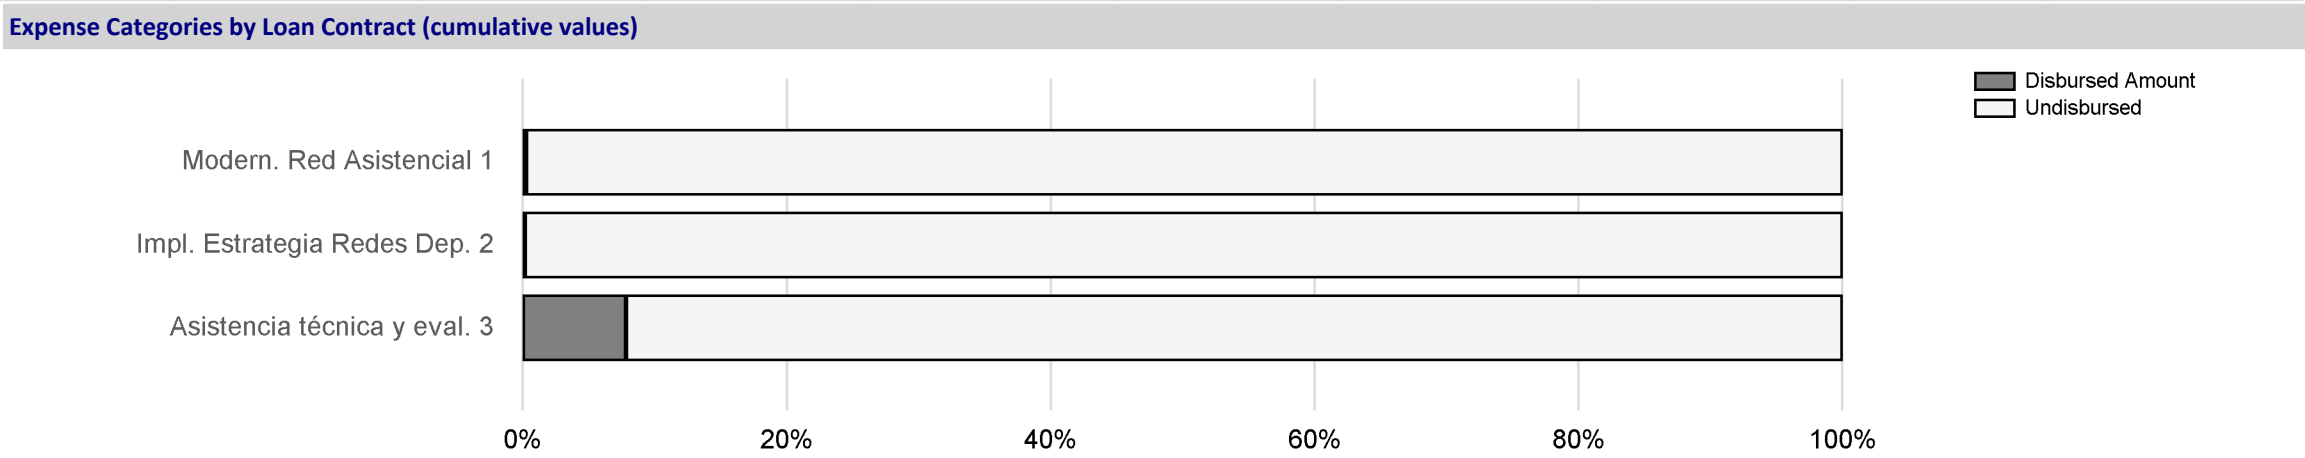

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Razón de Mortalidad Materna Huehuetenango y San Marcos

Observation: Pro-gender

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.1	Razón de Mortalidad Materna Huehuetenango y San Marcos	Razón	137.2	2016	2026	P	110
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de Vigilancia de Moralidad Materna MSPAS

Observations: Valor ponderado de Mujeres fallecidas cada 100.000 nacidos vivos

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 2: Tasa de Mortalidad Infantil Huehuetenango y San Marcos

Observation: Se estima que en Huehuetenango existe sub registro de niños fallecidos por un 30% por lo que la mejora del control puede incrementar inicialmente la tasa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
2.0	Tasa de Mortalidad Infantil Huehuetenango y San Marcos	Tasa	14.8	2016	2026	P	13
						A	-

Details

Means of Verification: INE

Observations: Se estima que en Huehuetenango existe subregistro de niños fallecidos en un 30%, por lo que la mejora del control puede incrementar inicialmente la tasa

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX									
Specific Development Objectives									
Specific Development Objectives Nbr. 1: Resultado 1: Cobertura de servicios materno infantil mejorada en Huehuetenango y San Marcos									
Observation: Los denominadores con base poblacional pueden variar al contar con datos oficiales del Censo Nacional 2018									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
1.0	Cobertura de atención prenatal oportuna	%	34.72	2017	P	34.72	42	-	50
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: SIGSA (MSPAS e INE)									
Observations: No. embarazadas con control prenatal antes de las 12 semanas/ No. embarazos esperados									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
1.2	Cobertura parto institucional	%	46.66	2016	P	46.66	58	-	104.66
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: INE									
Observations: No. de parto en servicio de salud /No. total de partos									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
1.3	Cobertura de monitoreo de crecimiento en niños/niñas menores de 24 meses	%	29	2017	P	35	43	-	50
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: SIGSA (MSPAS)									
Observations: No. niños/as menores 24 meses en control de monitoreo de crecimiento según norma/ No. niños/as menores de 24 meses									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Specific Development Objectives Nbr. 2: Resultado 2: Calidad de servicio mejorada en Huehuetenango y San Marcos									
Observation: Los denominadores con base poblacional pueden variar al contar con datos oficiales del Censo Nacional 2018. El indicador 2.4 corresponde a un valor agregado									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	EOP 2026
2.0	Partos atendidos según norma	%	36.1	2015	P	40	50	-	60
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Auditoria Expedientes Sistema de Información MSPAS desde año tres en adelante									
Observations: No. Partos atendidos según norma /Total partos institucionales									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		2025	2026	EOP 2026
2.2	Recién nacidos atendidos según norma	%	18.6	2017	P	24	33	-	53
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Auditoria Expedientes Sistema de Información MSPAS desde año tres en adelante									
Observations: No. Recién Nacidos atendidos según norma /Total partos institucionales									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		2025	2026	EOP 2026
2.3	Hacinamiento de hospitalización obstétrica en Hospital de Malacatán	%	111	2016	P	80	80	-	80
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: SIGSA (MSPAS)									
Observations: Dias Cama Ocupados Obstetricia/Dias Cama Disponibles Obstetricia Hospital Malacatán									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		2025	2026	EOP 2026
2.4	Hospitales que aplican protocolo de Violencia contra la Mujer (VCM)	#	0	2018	P	1	5	-	5
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Informe Unidad de Género MSPAS									
Observations:									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		2025	2026	EOP 2026
2.5	Cobertura de embarazadas con exámenes de laboratorio en control prenatal	%	53	2017	P	65	75	-	85
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Auditoria Expedientes									
Observations: No. Embarazadas en control prenatal con exámenes de laboratorio según norma/ No. Embarazadas en control prenatal									
Evaluation Methodology: -									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Specific Development Objectives Nbr. 3: Resultado 3: Eficiencia Productiva Mejorada									
Observation:									
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		2025	2026	EOP 2026
3.0	Número de Bancos de Sangre procesadores a nivel nacional MSPAS	#	27	2018	P	22	18	-	14
					A	-	-	-	-
Details									
Means of Verification: Informe MSPAS									

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator					Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024	2025	2026	EOP 2026
3.2	Número de Laboratorios de rutina en APS Huehuetenango y San Marcos operando			#	66	2018	P	30	15	-	6
							A	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Informe DAS Departamentales

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Modernización de la Red Asistencial bajo la estrategia de redes de salud a nivel nacional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
1.01	1.1.1.1. Normas materno infantil complementadas y aprobadas	Normas	P	-	4	105,000	150,000
			P (a)	-	4	86,577	150,000
			A	-	-	116,767	135,190
1.02	1.1.2. Metodología de planificación Red Asistencial Departamental publicada	Metodología	P	1	1	85,000	100,000
			P (a)	1	1	100,000	100,000
			A	-	-	-	-
1.03	1.1.3. Manual Gestión Integral de Red aprobado	Manual	P	1	1	85,000	100,000
			P (a)	1	1	100,000	100,000
			A	-	-	-	-
1.04	1.1.4. Propuesta de acción sobre interculturalidad implementado	Propuesta	P	-	1	140,000	300,000
			P (a)	-	1	145,000	300,000
			A	-	-	-	-
1.05	1.1.5. Propuesta de atención a la violencia contra la mujer implementada	Propuesta	P	-	1	75,000	150,000
			P (a)	-	1	80,000	150,000
			A	-	-	-	-
1.06	1.2.1. Metodologías de preparación de proyectos de inversión aprobadas	Metodologías	P	-	4	440,000	550,000
			P (a)	-	4	56,000	486,000
			A	-	-	-	-
1.07	1.2.2. Estudios de prefactibilidad APS aprobados	Estudios	P	-	15	-	170,000
			P (a)	-	15	-	170,000
			A	-	-	-	-
1.08	1.2.3. Estudios de prefactibilidad Hospitales aprobados	Estudios	P	-	2	-	300,000
			P (a)	-	2	-	300,000
			A	-	-	-	-
1.09	1.2.4. Estudio factibilidad Hospital aprobado	Estudios	P	-	2	19,305	595,087
			P (a)	-	2	-	497,978
			A	-	-	-	-
1.10	1.2.5. Propuesta de Organización y Gestión de Hospitales aprobado	Propuesta	P	-	1	60,000	100,000
			P (a)	-	1	15,000	100,000

1.10	1.2.5. Propuesta de Organización y Gestión de Hospitales aprobado	Propuesta	A	-	-	-	-
1.11	1.2.6. Propuesta Organización y Gestión de CS/CAP CAIMI aprobado	Propuesta	P	-	1	-	50,000
			P (a)	-	1	15,000	50,000
			A	-	-	-	-
1.12	1.3.1. Plan de Gestión de la Red de Urgencia aprobado	Plan	P	-	1	80,000	100,000
			P (a)	-	1	100,000	100,000
			A	-	-	-	-
1.13	1.3.2. Centro Regulador de la Red de Urgencia Nacional operativo	Centro	P	-	1	1,015,000	2,610,982
			P (a)	-	1	312,315	2,610,981
			A	-	-	-	-
1.14	1.3.3. Propuesta de Organización y Gestión de la Red Electiva aprobado	Propuesta	P	1	1	80,000	100,000
			P (a)	1	1	100,000	100,000
			A	-	-	-	-
1.15	1.4.1. Propuesta de regionalización de Bancos de Sangre aprobado	Propuesta	P	-	1	70,000	100,000
			P (a)	-	1	25,000	100,000
			A	-	-	-	-
1.16	1.4.2. Hemocentro operativo	Hemocentro	P	-	1	128,396	5,785,080
			P (a)	-	1	315	5,687,970
			A	-	-	-	-
1.17	1.4.3. Plan de regionalización de Laboratorios de Rutina aprobado	Plan	P	-	1	-	100,000
			P (a)	-	1	15,000	100,000
			A	-	-	-	-
1.18	1.4.4. Estrategia de Mantenimiento implementada	Estrategia	P	-	1	90,000	868,049
			P (a)	-	1	30,000	868,049
			A	-	-	-	-
1.19	1.4.5. Plan de Gestión Logística de Medicamentos e Insumos implementado	Plan	P	-	1	90,000	220,000
			P (a)	-	1	72,137	220,000
			A	-	-	-	-
1.20	1.4.6. Propuesta Sistema TIC de Salud implementada	Propuesta	P	-	1	4,037,593	6,391,803
			P (a)	-	1	36,228	6,300,803
			A	-	-	-	-
1.21	1.5.1.Comisiones técnicas finalizadas	Comisiones	P	-	-	-	-
			P (a)	2	20	114,499	349,220
			A	-	-	5,572	29,616

Component Nbr. 2 Componente 2: Implementación de la Estrategia Redes de Salud departamental

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
2.01	2.1.1. Unidades administrativas de la Red Departamental implementadas	unidades	P	-	2	91,667	100,347
			P (a)	-	2	347	100,347
			A	-	-	-	-
2.02	2.1.2. Estudio de Red Departamental aprobado	estudio	P	-	2	170,000	200,000
			P (a)	-	2	-	200,000
			A	-	-	-	-
2.03	2.2.1. Puestos de Salud construidos operativos	puestos de salud	P	-	75	2,214,079	11,947,082
			P (a)	-	75	1,756,140	12,222,115
			A	-	-	8,029	26,024
2.04	2.2.2. Puestos de Salud mejorados / remozados operativos	puestos de salud	P	17	63	1,549,000	3,937,845
			P (a)	17	63	584,731	4,174,932
			A	-	-	-	-
2.05	2.2.3. CAP construidos operativos	CAP	P	-	1	16,818	1,231,154
			P (a)	-	1	1,034	1,511,874
			A	-	-	-	-
2.06	2.2.4. CS / CAP / CAIMI mejorados / remozados operativos	CS/CAP/CAIMI	P	-	12	46,654	4,906,645
			P (a)	-	12	3,780	4,693,827

2.06	2.2.4. CS / CAP / CAIMI mejorados / remozados operativos	CS/CAP/CAIMI	A	-	-	-	-
2.07	2.2.5. Hospitales Huehuetenango, Malacatán y San Marcos normalizados operativos	Hospitales	P	-	3	350,000	26,053,658
			P (a)	-	3	-	26,052,713
			A	-	-	-	-
2.08	2.2.6. Hospital Barillas mejorado operativo	Hospital	P	-	1	146,654	2,539,378
			P (a)	-	1	-	2,326,245
			A	-	-	-	-
2.09	2.2.7. PS / CS / CAP / CAIMI equipados	PS/CS/CAP/CAIMI	P	-	127	60,000	3,584,034
			P (a)	-	127	3,082,947	3,584,034
			A	-	-	14,158	14,158
2.10	2.2.8. Hospitales distritales construidos operativos	Hospitales	P	-	2	786,748	16,380,184
			P (a)	-	2	-	16,154,386
			A	-	-	-	-
2.11	2.2.9. Auxiliares Enfermería formadas	Auxiliares	P	-	600	-	600,000
			P (a)	-	600	-	600,000
			A	-	-	-	-
2.12	2.2.10. Equipos capacitados en Planificación y Gestión de la Red	Equipos	P	-	71	-	100,000
			P (a)	-	71	-	100,000
			A	-	-	-	-
2.13	2.2.11. Funcionarios capacitados en Gestión Hospitalaria	Funcionarios	P	-	60	-	100,000
			P (a)	-	60	-	100,000
			A	-	-	-	-
2.14	2.2.12. Equipos de APS capacitados	Equipos	P	-	64	-	100,000
			P (a)	-	64	-	100,000
			A	-	-	-	-
2.15	2.3.1. Departamentos con Sistema de Coordinación de Urgencia operando	Departamentos	P	-	2	-	357,143
			P (a)	-	2	-	357,143
			A	-	-	-	-
2.16	2.3.2. Departamentos con Sistema de Referencia / Contrarreferencia funcionando	Departamentos	P	-	2	-	132,623
			P (a)	-	2	-	132,623
			A	-	-	-	-
2.17	2.4.1. Departamentos con Red de Laboratorios de rutina funcionando	Departamentos	P	-	2	-	395,613
			P (a)	-	2	-	395,613
			A	-	-	-	-
2.18	2.4.2. Departamentos con Red de Sangre funcionando	Departamentos	P	-	2	-	357,494
			P (a)	-	2	-	357,494
			A	-	-	-	-
2.19	2.4.3. Departamentos con Sistema Logístico funcionando	Departamentos	P	-	2	-	239,802
			P (a)	-	2	-	239,802
			A	-	-	-	-
2.20	2.4.4. Departamentos con Sistema de Mantenimiento funcionando	Departamentos	P	-	2	-	220,741
			P (a)	-	2	-	220,741
			A	-	-	-	-
2.21	2.4.5. Municipios de Huehuetenango y San Marcos con Tecnologías de la Información funcionando	Municipios	P	-	64	-	1,938,614
			P (a)	-	64	-	1,938,614
			A	-	-	-	-
2.22	2.5.1. Proyecto diseñado y supervisado	Proyectos	P	-	-	-	-
			P (a)	9	172	242,084	1,096,495
			A	-	-	45,289	125,179

Other Cost					
	Evaluación y Administración	P	1,667,817	5,736,642	
		P (a)	1,389,144	4,500,001	
		A	360,975	626,880	

Total Cost				
	Total Cost	P	13,699,731	100,000,000
		P (a)	8,463,278	100,000,000
		A	550,790	957,047

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Legal Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	9.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	12.2	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Legal Environment
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Intra/Inter Coordination
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
