

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1194	Chief of Operations Validation Date	10/13/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/13/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for the Comprehensive Social Protection System	Loan Number	5008/BL-HO, 5008/BL-HO-1, 5008/BL-HO-2
Executing Agency	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL), SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HO-L1194	59,200,000	59,200,000	0	0	59,200,000	59,200,000	38,655,000	65.30%	20,545,000
Aggregated	59,200,000	59,200,000	0	0	59,200,000	59,200,000	38,655,000	65.30%	20,545,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

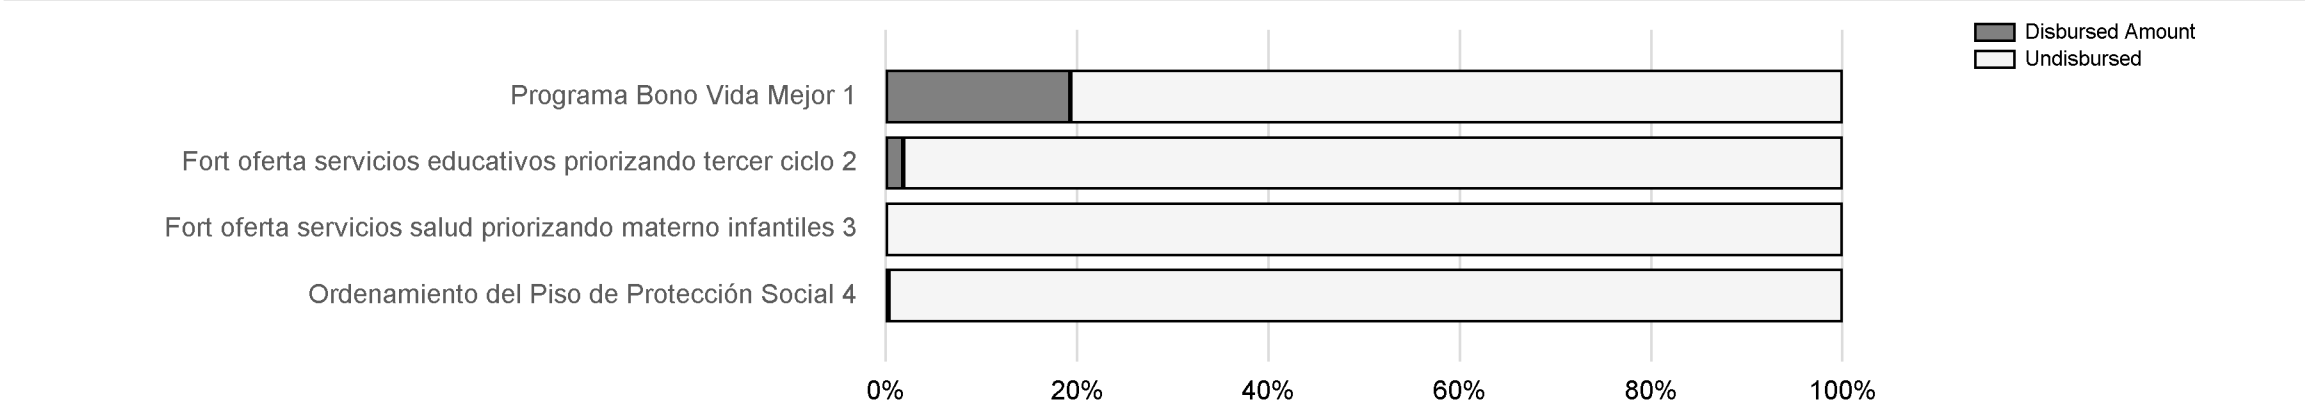

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Brecha de la pobreza extrema monetaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.0	Brecha de la pobreza extrema monetaria	Porcentaje	42.5	2021	2024	P	40.5
						A	-

Details

Means of Verification: Secretaría de Coordinación General de Gobierno - Gabinete Social/Centro Nacional de Información el Sector Social (SCGG-GS/CNISS) (Encuesta de Hogares vigente al momento de la medición, aplicando las nuevas líneas de pobreza)

Observations: Se refiere al poverty gap. Calculado con base en la Encuesta de Hogares 2019 a junio con proyecciones al 2020 para el dominio rural, para estimar los efectos de la pandemia/ETA/IOTA. Se calculó con el corte de julio del 2019 la línea de base debido a que por efectos de la pandemia y los huracanes ETA/IOTA solo se levantaron una encuesta en noviembre - diciembre vía telefónica de tres módulos, que eran empleo, pobreza e inseguridad alimentaria, la cual está sujeta a revisión de sus ponderadores y por tal razón el módulo de pobreza 2020 no ha sido publicado. Tampoco se ha levantado una encuesta de hogares en 2021. Se recalculará este indicador con la encuesta de hogares más reciente que esté de manera oficial, se espera que sea en el 2022, con el fin de obtener una línea base y metas con mejor precisión.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.2	Matrícula bruta promedio del tercer ciclo de educación básica (TCEB) en las áreas intervenidas			Porcentaje	41.31	2021	2024	P	44.5
								A	-
Details									

Means of Verification: Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) SE

Observations: Aún no se hace el cierre de la matrícula de 2021. Es probable que este indicador esté sobre estimado dado que no captura los impactos de la pandemia. Se recomienda recalcular este indicador una vez que la matrícula 2021 esté oficializada. Nota de cálculo: Número total de educandos matriculados inicialmente en el 7to 8to y 9no grado en todos los centros escolares de los 52 municipios en el año 2021 dividido entre la proyección de población del SACE para las edades de 12 a 14 años en el mismo año.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
			Niños		P		43.5	
					A		-	
			Niñas		P		44.5	
					A		-	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Programa Bono Vida Mejor (PBVM) con cobertura y atención mejorada en los municipios priorizados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
1.0	Porcentaje del incremento del ingreso per cápita por recibir el BVM	Porcentaje	34	2021	P	30	30
					A	-	-

Details

Means of Verification: SCGG-GS/CENISS

Observations: Calculado con base en la Encuesta de Hogares 2019 a junio con proyecciones al 2020 para el dominio rural, para estimar los efectos de la pandemia/ETA/IOTA. Se calculó con el corte de julio del 2019 la línea de base debido a que por efectos de la pandemia y los huracanes ETA/IOTA solo se levantaron una encuesta en noviembre - diciembre vía telefónica de tres módulos, que eran empleo, pobreza e inseguridad alimentaria, la cual está sujeta a revisión de sus ponderadores y por tal razón el módulo de pobreza 2020 no ha sido publicado. Tampoco se ha levantado una encuesta de hogares en 2021. Se recalculará este indicador con la encuesta de hogares más reciente que esté de manera oficial, se espera que sea en el 2022, con el fin de obtener una línea base y metas con mejor precisión.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
1.2	Porcentaje de hogares elegibles que reciben el BVM	Porcentaje	56	2021	P	65	65
					A	-	-

Details

Means of Verification: Registro Único de Participantes (RUP) y Sistema de Información Gerencial (SIG)

Observations: Se calculó con base en las FSU del RUP levantadas en 2019, con el cruce de CENISS del 2020. Promedio simple de los municipios intervenidos.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
1.5	Porcentaje de solicitudes presentadas por hogares del PBVM atendidas y resueltas en los plazos establecidos en el MOP	Porcentaje	60	2021	P	70	70
					A	-	-

Details

Means of Verification: Dirección de Promoción y Desarrollo Humano (DPDH, SIG)

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Specific Development Objectives Nbr. 2: El progreso educativo fortalecido en los municipios priorizados, reduciendo brechas de género.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2024		EOP 2024
2.0	Tasa de transición bruta de 6to a 7mo	Porcentaje	55.44	2021	P	59	59
					A	-	-

Details

Means of Verification: Datos del SACE

Observations: Aún no se hace el cierre de la matrícula de 2021 por ende se utiliza como referencia 2020. Es probable que este indicador esté sobre estimado dado que no captura los impactos de la pandemia. Se recomienda recalcular este indicador una vez que la matrícula 2021 esté oficializada. Nota del cálculo: Número total de educandos matriculados en el 7mo grado en 2020 menos el total de repitentes del 7mo grado en el mismo año, el resultado de esta sustracción se divide entre el total de matriculados en el 6to grado en el año 2019.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
------------	-----	---------------	----	---------------	--	--	--

Disaggregation		niños				P	59	59
						A	-	-
		niñas				P	59	59
						A	-	-
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.3	Tasa de graduación del TCEB		Porcentaje	38.24	2021	P	40	40
						A	-	-
Details								

Means of Verification: Datos del SACE

Observations: Aún no se hace el cierre de la matrícula de 2021 por ende se utiliza como referencia 2020. Es probable que este indicador esté sobre estimado dado que no captura los impactos de la pandemia. Se recomienda recalcular este indicador una vez que la matrícula 2021 esté oficializada. Nota del cálculo: Número total de educandos graduados del 9no grado en 2020 en todos los centros escolares de los 52 municipios dividido entre la proyección de población del SACE para la edad de 14 años en el mismo año.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Disaggregation		niños			P	39	39
					A	-	-
		niñas			P	41	41
					A	-	-

Specific Development Objectives Nbr. 3: Servicios de salud del primer nivel de atención fortalecidos en los municipios priorizados.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 semanas de gestión en los últimos 12 meses	Porcentaje	51	2021	P	57	57
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Evaluación final (EF)

Observations: La Secretaría de Salud no reporta este indicador; tampoco se ha publicado la última ENDESA 2020 por efectos de la pandemia. Por ende, se tomaron los valores de línea base levantada por la Iniciativa de Salud Mesoamérica (ISM) en 2015 (antes de la intervención). Se recomienda actualizar este valor de acuerdo con los datos del levantamiento de la línea de base del Programa de Salud HO-L1195, programado para finales de 2021; se acordó incluir los 5 municipios beneficiados de este componente en dicho levantamiento. Además, se realizará un monitoreo continuo de este indicador a través de los informes de producción enviados por los gestores descentralizados de salud y comparación de la ficha de ATA2.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2024	EOP 2024		
3.3	Niños 12-23 meses beneficiados con vacunación completa para su edad			Porcentaje	37	2021	P	47	47
							A	-	-
Details									

Means of Verification: Evaluación final

Observations: Aún no se ha normalizado el registro de vacunas por parte de SINOVA por efectos de la pandemia, por ende, se utiliza como referencia 2019. Es probable que este indicador esté sobre estimado dado que no captura los impactos de la pandemia (que ha desfasado el proceso de registro de la vacuna por la reprogramación de actividades relacionadas con el COVID-19).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.4	Cobertura de atención prenatal con calidad, en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas	Porcentaje	23.7	2021	P	33.7	33.7
					A	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación final

Observations: La Secretaría de Salud no reporta este indicador. Tampoco, se ha publicado la última ENDESA 2020 por efectos de la pandemia. Por ende, se tomaron los valores de línea base levantada por la Iniciativa de Salud Mesoamérica (ISM) en 2015 (antes de la intervención). Se recomienda actualizar este valor de acuerdo con los datos del levantamiento de la línea de base del Programa de Salud HO-L1195, programado para finales de 2021; se acordó incluir los 5 municipios beneficiados de este componente en dicho levantamiento. Además, se realizará un monitoreo continuo de este indicador a través del Sistema de Información Perinatal (SIP). Nota: Se refiere a 5 controles prenatales realizados por personal calificado de acuerdo con la norma para homologar con los indicadores y plan de evaluación de HO-L1195.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Ordenamiento del PPS elaborada e implementada en territorios priorizados.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.0	Aldeas en el programa con intervención integral implementada	Número	0	2021	P	60	60
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes SCGG-GS/CNISS

Observations: Se realizará el monitoreo de este indicador en las 60 aldeas definidas en la Estrategia de Priorización de las Aldeas para las Intervenciones Integrales, aprobado por el Comité Técnico del BVM en 2020.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.3	Hogares del PBVM que benefician de 3 o más programas de protección social (además del BVM)	Porcentaje	6.2	2021	P	12.4	12.4
					A	-	-

Details

Means of Verification: RUP SCGG-GS/CENISS

Observations: Se realizará el monitoreo de este indicador en las 60 aldeas definidas en la Estrategia de Priorización de las Aldeas para las Intervenciones Integrales, aprobado por el Comité Técnico del BVM en 2020.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.3	Fichas levantadas en el 2019 que han completado el proceso de control de calidad	Porcentaje	54.55	2021	P	100	100
					A	-	-

Details

Means of Verification: RUP / CENISS

Observations: En 2019 se levantó la FSU a nivel nacional; el proceso de control de calidad fue interrumpida en parte por la pandemia, por restricciones de movilidad en campo y cierre de oficinas del CENISS, y la priorización de CENISS de actividades para atender las emergencias ocasionadas por la pandemia y los dos huracanes ETA/IOTA.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Programa Bono Vida Mejor

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Número de personas en hogares del PBVM rural que reciben transferencias monetarias en los 52 municipios con intervencion integral	# of beneficiaries	P	-	262,685	-	12,658,037
			P (a)	-	262,685	-	12,658,037
			A	-	233,975	-	12,906,356
1.02	Número de personas en hogares del PBVM rural, que reciben transferencias monetarias como parte de la crisis socioeconomica causada por la emergencia COVID-19 y los huracanes ETA / IOTA, según el Reglamento Operativo.	# of beneficiaries	P	-	485,972	-	19,541,964
			P (a)	-	485,972	-	19,947,173
			A	-	269,852	-	15,383,422
1.03	Estructura de gestión y operativa del PBVM a nivel central implementado	Plan	P	1	1	905,456	2,512,874
			P (a)	1	1	1,563,137	2,548,099
			A	1	1	59,780.16	437,414.16
1.04	Sistema de Información de Gerencial del PBVM fortalecido	Sistema	P	1	1	76,000	329,000
			P (a)	1	1	230,000	329,000
			A	1	1	-	-
1.05	Número de Gestores fortalecido para atención al participante a nivel local	# de gestores	P	162	162	892,080	4,560,622
			P (a)	142	142	2,981,030	5,628,918
			A	93	157	72,825.39	1,500,360.39
1.06	Oficinas de Atención al Participante (OAP) fortalecidas	# de OAP	P	16	16	177,400	631,200
			P (a)	16	16	281,632	658,595
			A	16	16	20,861	179,192
1.07	Hogares del PBVM con inclusión socioeducativa, incluyendo acompañamiento especial a hogares en riesgo.	Porcentaje	P	20	40	293,100	680,300
			P (a)	20	40	217,000	684,794
			A	-	-	1,503	10,797
1.08	Parejas participantes del PVM con Talleres de ¡Cuidate!	# de parejas	P	500	4,860	127,013	444,206
			P (a)	500	4,837	204,029	489,520
			A	-	337	-	9,133
1.09	Aldeas con formación en Inclusión Productiva que reciben Capital Semilla No Reembolsable	# de aldeas	P	20	60	659,828	1,751,797
			P (a)	20	60	507,968	1,670,637
			A	-	-	16,715	132,520
1.10	Estrategia de comunicación social implementada	Estrategia	P	-	1	25,000	90,000
			P (a)	1	1	21,042	67,437
			A	-	-	-	-
1.11	Unidad de Monitoreo de Corresponsabilidades en Salud fortalecida	Unidad	P	1	1	219,859	1,000,000
			P (a)	1	1	364,480	1,000,000
			A	1	1	8,629.25	159,803.25
1.12	Observatorio de Pobreza creado y fortalecido	Observatorio	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	301,196	442,062
			A	-	-	-	-
1.13	Red Solidaria Diseñada (Estrategia Aldeas Intervenciones Integrales).	Estrategia	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	175,000	270,000
			A	-	-	-	-
1.14	Padrón Eje de Protección Social Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)/ Red Solidaria 2022 levantada	base de datos	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	2,044,160	2,044,160
			A	-	-	-	-
1.15	Modelo de Focalización Red Solidaria aprobada.	Modelo	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	77,000	77,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la oferta de los servicios educativos, priorizando el Tercer Ciclo

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	Estudiantes matriculados en el Tercer Ciclo de Educación Básica a través de una modalidad alternativa	# of students	P	1,014	3,348	960,180	1,818,872
			P (a)	1,014	2,748	789,019	2,324,869
			A	-	-	-	-
2.02	Estudiantes matriculados en Educación Media a través de una modalidad alternativa	Estudiantes	P	300	750	306,000	688,999
			P (a)	300	600	125,000	150,000
			A	-	-	-	-
2.03	Centros de Educación Básica (CEBs) dotados con mobiliario	CEB	P	-	40	-	135,000
			P (a)	40	40	135,000	135,000
			A	-	-	-	-
2.04	Centros de Educación Básica (CEBs) dotados con equipos tecnológicos	CEB	P	-	50	-	347,500
			P (a)	50	50	347,500	347,500
			A	-	-	-	-
2.05	Piloto de esquema de incentivos para el progreso educativo implementado	Redes	P	1	3	112,000	292,000
			P (a)	1	1	162,000	417,000
			A	-	-	-	-
2.06	Unidad de Monitoreo de Corresponsabilidad en Educación fortalecida	Unidad	P	1	1	395,308	965,126
			P (a)	1	1	80,541	379,762
			A	-	1	-	241,721
2.07	Jóvenes atendidos por los gestores móviles de emprendimiento	Jóvenes	P	1,314	3,348	77,500	232,500
			P (a)	1,314	3,348	86,063	279,007
			A	-	-	-	-
2.08	Innovaciones para Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) implementadas	Sistema	P	1	1	424,087	520,003
			P (a)	1	1	429,848	966,862
			A	-	-	-	7,703

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la Oferta y Calidad de Servicios de Salud, Priorizando los servicios materno infantil (MGD)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención en municipios más pobres	# of beneficiaries	P	34,281	35,666	760,355	3,041,420
			P (a)	34,281	35,666	1,013,807	3,041,420
			A	-	-	-	-
3.02	Estudios para el desarrollo de módulos de promoción y capacitación asegurando un enfoque intercultural y género, con información sobre los sistemas tradicionales, prácticas y conocimientos de los pueblos indígenas	estudio	P	1	3	30,000	180,000
			P (a)	2	3	30,000	180,000
			A	-	-	-	-
3.03	Micronutrientes entregados a gestores priorizados	Municipios	P	5	5	100,000	100,000
			P (a)	5	5	100,000	100,000
			A	-	-	-	-
3.04	Equipo de ultrasonido y equipo medico priorizado entregado en unidades de salud de los municipios priorizados	Municipios	P	5	5	-	130,000
			P (a)	5	5	130,000	130,000
			A	-	-	-	-
3.05	Gestores capacitados en telesonografia en municipios prioirzados	Municipios	P	5	5	50,000	50,000
			P (a)	5	5	50,000	50,000
			A	-	-	-	-
3.06	Municipios con Equipos de Salud Familiar (ESFAM) fortalecidos en temas de AINC, Criando con amor e Interculturalidad	Municipios	P	52	52	100,000	200,120
			P (a)	52	52	100,000	200,120
			A	-	-	-	-
3.07	Unidad de gestion descentralizada (UGD), fortalecida para el monitoreo , evaluaci;on y administratcion del programa	consultoría	P	6	6	133,515	534,060
			P (a)	6	6	150,594	534,060
			A	6	6	87,305	223,186

Component Nbr. 4 Ordenamiento de la Estrategia Vida Mejor

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
4.01	Unidad de Monitoreo y Evaluación fortalecida	Unidad	P	1	1	58,043	212,160
			P (a)	1	1	28,465	141,617
			A	1	1	-	113,152
4.02	Propuesta de un Modelo de Focalización con la nueva metodología de pobreza monetaria oficial, elaborada	Estudios	P	-	1	-	46,000
			P (a)	-	1	27,600	46,000
			A	-	1	-	18,400
4.03	Evaluaciones del programa realizadas	Evaluaciones	P	2	4	381,340	741,840
			P (a)	1	1	162,903	811,383
			A	-	-	-	-
4.04	Unidad de Analisis RUP y atención al usuario fortalecida	Unidad	P	1	1	103,700	372,145
			P (a)	1	1	141,220	330,324
			A	-	1	-	30,704
4.05	Puntos de Atención Locales RUP	Oficinas	P	16	16	195,250	627,855
			P (a)	16	16	309,045	670,676
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Unidad Ejecutora de la SSIS Operando	P	722,510	2,527,100
		P (a)	922,332	2,701,787
		A	272,257.34	898,720.34
	Auditoria externa de la SSIS contratada	P	138,500	472,900
		P (a)	113,825	298,212
		A	0	66,830
	Unidad Ejecutora de salud operando	P	208,134	664,400
		P (a)	82,246	664,400
		A	82,738	122,457
	Auditoría externa de salud contratada	P	30,000	100,000
		P (a)	40,000	100,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	8,662,158	59,200,000
		P (a)	14,524,682	63,515,431
		A	622,614.14	32,441,871.14

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Political Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		SHARE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Social Environment
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
23	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	23.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity
Others - Fiduciary Dimensions
