


# PMR Public Report

Operation Number	HO-L1199	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/13/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Comprehensive Strengthening of Tegucigalpa's Trauma and Emergency Care Network	Loan Number	4713/BL-HO
Executing Agency	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL)	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SERVICES
Team Leader	GODOY, HUGO DANILO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	09/24/21
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HO-L1199	53,820,000	53,820,000		0	0	53,820,000	27,000,000	50.17%	26,820,000
Aggregated	53,820,000	53,820,000		0	0	53,820,000	27,000,000	50.17%	26,820,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)
---

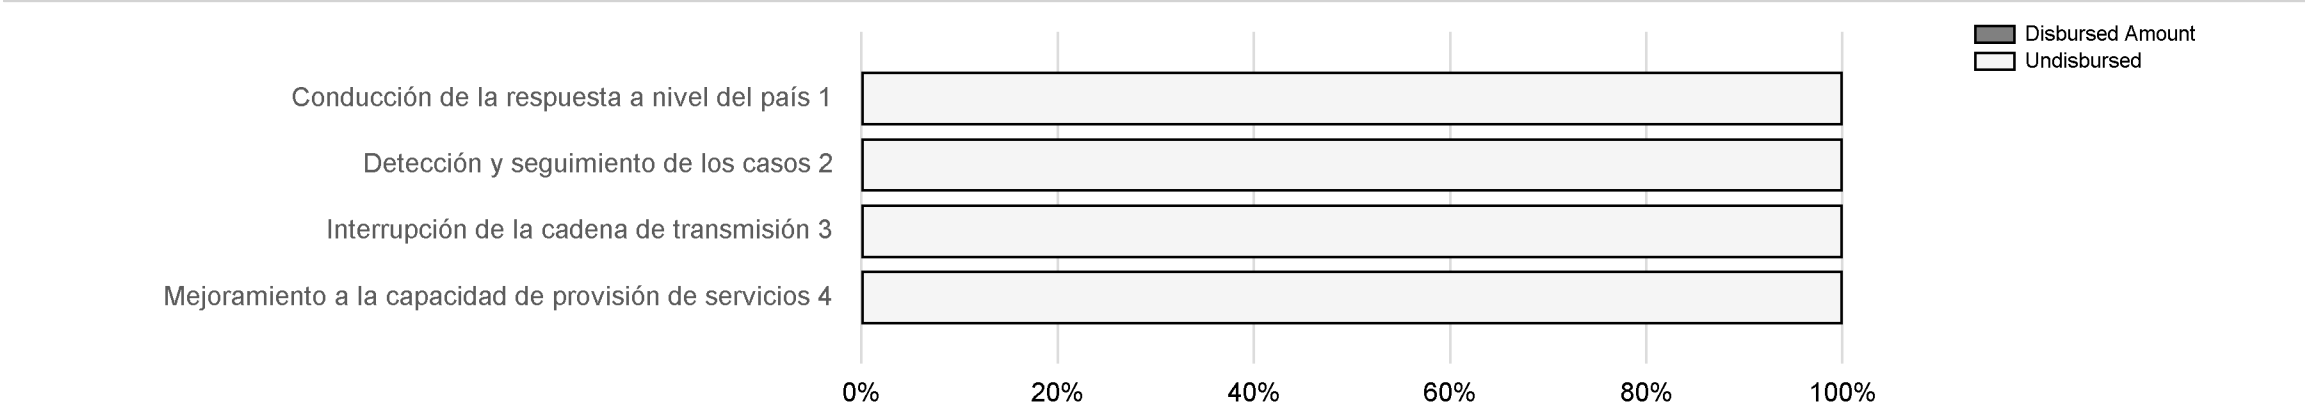

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: COVID

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.0	Número de muertes provocadas por COVID 19	Numero	23949	2021	2024	P	15,770
						A	-
Details							

Means of Verification: Registros de la Unidad de Gestión de la información del Hospital

Observations: Reducir 8% de la linea base

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.1	Casos de COVID 19 confirmados			Numero	1040297	2021	2024	P	721,877
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
1.2	Promedio diario de pacientes hospitalizados por COVID 19 durante el mes previo al reportes			Numero	1272	2021	2024	P	560
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
0.1	Porcentaje de hospitales y regiones sanitarias que atienden pacientes COVID con al menos un informe de monitoreo y seguimiento de los convenios de gestión realizado por la SESAL	%	0	2021	P	100	-	-	100
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de monitoreo de la UGD

Observations: Número de TUM certificados/ total de personal de atención prehospitalaria de emergencias.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
0.2	Porcentaje de actividades del PEPR-HOs implementada	%	48	2021	P	65	80	-	80
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de la Direccion General de Redes Integradas de Servicios de Salud

Observations: Total de días permanencia de los pacientes

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la detección y el seguimiento de los casos

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
1.1	Tasa acumulada de pruebas de detección realizadas	Pruebas por 100.000 habitantes	7023	2021	P	10,584	-	-	10,584
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes del Laboratorio Nacional de Virologia

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Apoyar intervenciones para interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Porcentaje de actividades ejecutadas como parte del PNIV	%	66	2021	P	75	90	-	90
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reportes del PAI

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	EOP 2024	
2.3	Número de personas de la población objetivo vacunadas			# of beneficiaries	113889	2021	P	1,981,000	4,662,000	-	4,662,000
							A	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes del PAI											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)						
Disaggregation			Male			P	-	-	-	-	
						A	-	-	-	-	
						P	-	-	-	-	
						A	-	-	-	-	
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	EOP 2024	
2.4	Porcentaje de ejecución del Plan Nacional de comunicación Estratégica para introducción de la vacuna COVID-19 implementado			%	60	2021	P	80	-	-	80
							A	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes del PAI											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator							
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	EOP 2024	
2.5	Porcentaje de mensajes adaptados Pueblos indígenas y afro hondureños (PIAH)			%	0	2021	P	20	-	-	20
							A	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes del PAI											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la capacidad de prestación de servicios											
Observation:											
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022	2023	2024	EOP 2024	
3.0	Porcentaje de triajes con Centros de estabilización habilitados para la atención 24/7 de pacientes COVID			%	13.5	2021	P	27	-	-	27
							A	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informe de la Direccion general de Redes de Servicios											
Observations: se alinea con el desafio de desarrollo de Inclusión Social e Igualdad, por medio de su enfoque de fortalecer la prestación de servicios de salud a los pacientes con sospecha y diagnóstico de COVID-19 que a través del MGD favorecen el alcance de poblaciones pobres y rurales											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	EOP 2024
3.2	Pacientes Covid-19 atendidos a traves de gestores de salud	# of beneficiaries	0	2021	P	487,022	-	-	487,022
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: Informe de la Direccion general de Redes de Servicios

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)						
Disaggregation		Male			P	-	-	-	-		
					A	-	-	-	-		
		Female			P	-	-	-	-		
					A	-	-	-	-		
<div>IndicatorUnit of MeasureBaselineBaseline Year202220232024EOP 2024</div>											
3.3	Porcentaje de regiones sanitarias con personal capacitado y que implementan servicios de telemedicina			%	0	2021	P	20	40	-	40
							A	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Informe de la Direccion general de Redes de Servicios

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1    Componente 1: Conducción de la respuesta a nivel del país

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Técnicos en monitoreo contratados para el fortalecimiento de la Unidad de Gestión descentralizada, Departamento de Primer Nivel de Atención y Departamento de Servicios de Segundo Nivel de la SESAL	Tecnicos	P	7	7	158,812.86	168,800
			P (a)	7	7	158,812.86	168,800
			A	3	3	39,197.43	49,184.57

Component Nbr. 2    Componente 2. Detección y seguimiento de los casos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	Unidad de Vigilancia epidemiológica fortalecida para el análisis y construcción de proyecciones y escenarios de número de casos y fallecimientos por COVID	Tecnico	P	1	1	32,418.29	40,500
			P (a)	1	1	32,418.29	40,500
			A	-	1	-	8,081.71
2.02	Oficinas de Regiones Sanitarias y establecimientos de salud fortalecidos con Internet y equipos de cómputo para el SIVS	Oficinas	P	28	28	120,000	120,000
			P (a)	28	28	120,000	120,000
			A	-	-	-	-
2.03	Laboratorios públicos dotados de insumos y reactivos para la realización de diagnósticos de COVID	Laboratorio	P	4	4	2,200,000	2,200,000
			P (a)	4	4	2,200,000	2,200,000
			A	-	-	-	-
2.04	Laboratorios públicos apoyados con servicios de internet y routers	Laboratorios	P	4	4	10,000	10,000
			P (a)	4	4	10,000	10,000
			A	-	-	-	-
2.05	Herramienta digital para la notificación de resultados de pruebas COVID-19 a pacientes implementado	Herramienta	P	1	1	150,000	150,000
			P (a)	1	1	150,000	150,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3    Componente 3. Interrupción de la cadena de transmisión

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	Dosis de vacunas contra la COVID-19 adquiridas y recibidas	Vacunas	P	2,653,560	2,653,560	12,499,300	14,500,000
			P (a)	2,653,560	2,653,560	12,499,300	14,500,000
			A	1,788,930	1,788,930	8,934,120	10,934,820
3.02	Plantas de generación eléctrica instaladas en almacenes de biológicos	Planta	P	3	3	300,000	300,000
			P (a)	3	3	300,000	300,000
			A	-	-	-	-
3.03	Medios de comunicación de Televisión y radio contratados para anuncios de mensajes de Vacunas y prevención del COVID-19.	Medios comunicacion	P	1	1	80,000	100,000
			P (a)	1	1	80,000	100,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4    Componente 4. Mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
4.01	Hospitales con convenios de gestión para la atención de pacientes con COVID 19 firmados.	Hospitales	P	-	27	-	10,188,456.64
			P (a)	-	27	-	10,188,456.64
			A	-	27	-	10,188,456.64
4.02	Regiones sanitarias con convenios firmados para el funcionamiento de establecimientos para brindar cuidados a los pacientes con COVID 19.	Regiones	P	-	20	-	5,570,714.05
			P (a)	-	20	-	5,570,714.05
			A	-	20	-	5,570,714.05
4.03	Salas ampliadas en hospitales para atención del COVID 19	Salas	P	2	2	1,000,000	1,000,000
			P (a)	2	2	1,000,000	1,000,000
			A	-	-	-	-
4.04	Gestores Fortalecidos en la gestion administrativa financiera de los convenios	Tecnicos	P	3	3	40,000	60,000
			P (a)	3	3	40,000	60,000
			A	1	1	-	-
4.05	Regiones de salud fortalecidas con servicios de telemedicina.	Regiones	P	4	4	90,000	180,000
			P (a)	4	4	90,000	180,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Unidad ejecutora	P	448,396	894,792
		P (a)	448,396	894,792

	Unidad ejecutora	A	138,577.93	138,577.93
	Auditoria externa	P	30,000	50,000
		P (a)	30,000	50,000
		A	0	0
	Aseguramiento Razonable de los Gestores	P	100,000	154,000
		P (a)	100,000	154,000
		A	0	0
	Gastos operativos	P	466,836.84	943,708
		P (a)	466,836.84	943,708
		A	4,829.36	14,863.68
Total Cost				
	Total Cost	P	17,725,763.99	36,630,970.69
		P (a)	17,725,763.99	36,630,970.69
		A	9,116,724.72	26,904,698.58

No information available for this section





IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
