


PMR Public Report

Operation Number	PE-L1171	Chief of Operations Validation Date	10/17/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/07/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Improving Access to Civil Registry Services and Quality Identification at the National Level	Loan Number	4297/OC-PE
Executing Agency	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-CIVIL REGISTRIES
Team Leader	RIVERA ARTEAGA, CESAR AUGUSTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PE-L1171	50,000,000	50,000,000	30,214,762	0	80,214,762	50,000,000	23,410,878	46.82%	26,589,122
Aggregated	50,000,000	50,000,000	30,214,762	0	80,214,762	50,000,000	23,410,878	46.82%	26,589,122

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

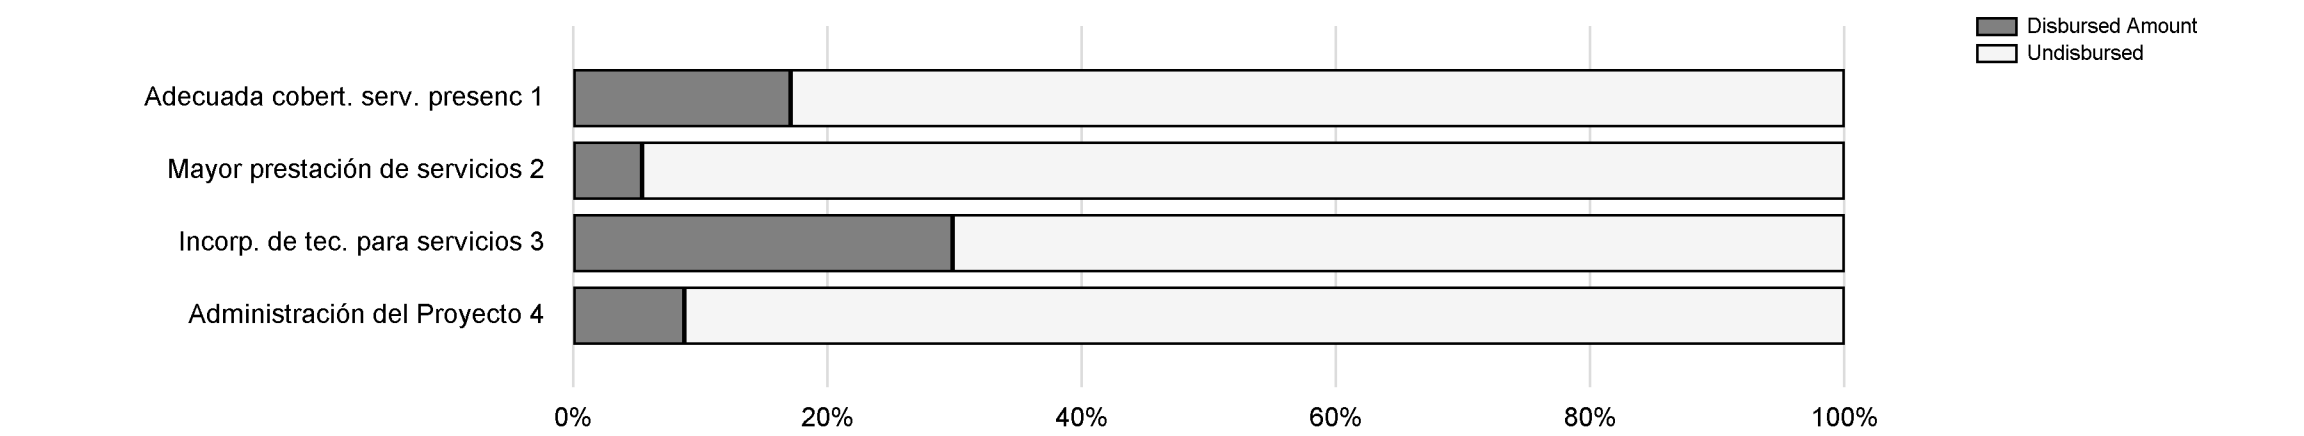

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Costo de transacción para la obtención de los Servicios Registrales y de Identificación (SRI) reducido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.0	Costo de transacción anual, unitario, derivado del cumplimiento de requisitos para inscripción y renovación del DNI	USD	9.37	2017	2024	P	6.31
						A	-

Details

Means of Verification: Se calculará el indicador con la metodología utilizada en el Estudio de preinversión SNIP y con encuesta a usuarios (ver PME).

Observations: Esta reducción de costos se debe a la implementación de la captura en vivo (enrolamiento). Fuente: Cálculos propios basados en el estudio de preinversión SNIP. Ver Análisis Económico.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2024	
0.1	Costo de transacción anual, unitario, para la obtención de copia certificada para migrantes internos	USD	54.29	2017	2024	P	5.16
						A	-

Details

Means of Verification: Se calculará el indicador con la metodología utilizada en el Estudio de preinversión SNIP y con encuesta a usuarios (ver PME).

Observations: Los migrantes internos son el 20% de la población. Si su acta no está digitalizada, deben trasladarse a su municipio para obtenerla. La digitalización de actas elimina la necesidad de viajar. Fuente: Cálculos propios basados en el estudio de preinversión SNIP. Ver Análisis Económico.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Calidad de los servicios de registro e identificación mejorada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
0.0	Número de actas registrales con errores detectadas y corregidas	#	0	2019	P	-	-	-	-	250,000	-	250,000
					A	-	-	-	-	-	-	

Details

Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC

Observations: La detección de errores se dará como parte del proceso de digitalización y corrección de actas. De 63 millones de actas originalmente en papel, 14 millones ya han sido digitalizadas, habiéndose identificado una tasa de error de 7%. Se asume que esa tasa de error se va a mantener para la digitalización de los 14 millones bajo este proyecto

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
0.1	Copias certificadas de actas registrales solicitadas vía web	#	0	2017	P	-	-	-	-	255,000	-	255,000
					A	-	-	-	-	-	-	

Details

Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC y con encuesta a usuarios (ver PME).

Observations: Fuente: Estudio de preinversión SNIP, pág. 1254 (682 en el pdf).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Acceso a los servicios registrales y de identificación para los ciudadanos de las comunidades más aisladas mejorado

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	DNI emitidos a partir de actas bilingües	%	0.16	2017	P	.16	-	-	-	.54	-	.54
					A	-	-	-	-	-	-	

Details

Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC

Observations: Porcentaje de los DNI emitidos a partir de acta bilingüe respecto al total de DNI (se asume 5,6 millones al año).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Eficiencia en la gestión de RENIEC mejorada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Costo anual de envío para tramitación de DNI y de actas registrales	Miles de USD	674	2017	P	674	-	-	-	246	-	246
					A	-	-	-	-	-	-	

Details

Means of Verification: Registros administrativos de RENIEC.

Observations: Esta baja de costos operativos se deriva de la sustitución de envíos físicos por transmisión electrónica, habilitada por los nuevos sistemas de información. Fuente: Estudio de Preinversión SNIP, pág. 1265 y 1268 (693 y 696 respectivamente en el pdf).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora de la calidad de los SRI

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
1.01	Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral electrónica implementada	Número de oficinas	P	160	200	304,988.97	820,501
			P (a)	108	200	443,906.97	1,228,679.91
			A	-	-	2,350	10,680.81
1.02	Ventanillas de oficinas de RENIEC con acta registral electrónica implementada	Número de ventanillas	P	110	150	-	32,897
			P (a)	-	150	91,523.11	538,371.11
			A	-	-	-	-
1.03	Actas registrales digitalizadas y revisadas	Número de actas (en millones)	P	6.5	10	13,837,902.9	25,319,014
			P (a)	2.1	10	6,354,671.3	24,009,471.15
			A	-	-	6,471,584	6,538,442.56
1.04	Ventanillas del RENIEC implementadas	Número de ventanillas	P	-	31	-	452,897
			P (a)	-	27	205,409.02	370,437.02
			A	-	-	-	-
1.05	Oficinas acondicionadas térmicamente	Número de oficinas	P	-	45	56,000	245,000
			P (a)	-	12	71,717.67	404,524
			A	-	-	3,642	128,955.33
1.06	Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas	Número de PVM	P	10	20	1,477,586	3,833,070.84
			P (a)	6	21	2,335,851.45	5,289,614.62
			A	-	-	1,322,419	1,999,645.17
1.07	Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada	Número de plataformas	P	-	1	35,000	1,740,000
			P (a)	-	1	68,610	1,492,349.6
			A	-	1	57,588	1,469,220.12
1.08	Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando	Número de ventanillas	P	300	450	31,427	2,203,897
			P (a)	-	450	369,441	2,130,583.04
			A	-	-	25,618	85,492.26
1.09	Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados	Números de centros	P	-	5	42,559	1,571,798
			P (a)	-	1	627,566	1,108,694.37
			A	-	-	-	73,706.37
1.10	Campañas de sensibilización a ciudadanos sobre nuevas modalidades de servicios realizadas	Número de campañas	P	1	1	-	185,714
			P (a)	-	1	-	102,143
			A	-	-	-	-
1.11	Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras implementadas por el proyecto	# of public officials	P	500	1,200	558,842	1,237,917.2
			P (a)	-	1,200	228,871.94	1,144,406.98
			A	-	-	-	11,385.04
1.12	Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados	Número de oficinas	P	-	433	886,840	2,305,075.83
			P (a)	433	433	582,499.22	685,293.2
			A	-	-	258,536	258,536
1.13	Equipamiento para descentralización del sistema de impresión de DNI funcionando.	Número de impresoras	P	-	-	-	-
			P (a)	27	35	2,501,567	3,848,838
			A	27	27	1,871,151	1,871,151

Component Nbr. 2 Mejora del Acceso a los SRI a población de comunidades aisladas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
2.01	OREC en comunidades nativas con servicios delegados	Número de OREC	P	170	300	904,429.4	1,841,867.92
			P (a)	80	300	270,421.28	1,215,766
			A	-	-	-	18,811.72
2.02	Unidades itinerantes equipadas	Número de unidades	P	-	16	2,403,652.97	6,768,499.01
			P (a)	5	16	1,976,979	5,205,727.98
			A	-	-	609,130	981,306.39
2.03	OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida	Número de servicios	P	500	1,000	4,666,240	4,953,165
			P (a)	450	1,000	693,548.41	4,578,452.02
			A	-	-	-	4,092.13
2.04	OREC con registro civil en lengua originaria funcionando	Número de OREC	P	140	400	308,367.71	985,572.03
			P (a)	240	400	400,194.32	1,239,811
			A	-	-	39,235	62,501.68

Component Nbr. 3 Modernización de los sistemas de gestión del RENIEC

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2024	2022	EOP 2024
3.01	Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRCI) implementado	Número de sistemas	P	1	1	6,166,324.06	13,182,723.99
			P (a)	-	1	979,965	11,278,645
			A	-	-	54,393	66,137.89
3.02	Sistema de información gerencial implementado	Número de sistemas	P	1	1	71,428.57	285,714
			P (a)	-	1	150,273.83	460,249.15
			A	-	-	-	58,447.32
3.03	PIDE en funcionamiento para acceder a las actas registrales	Número de sistemas	P	1	1	200,000	285,714
			P (a)	-	1	-	285,714.29
			A	-	-	-	-
3.04	Equipamiento de hardware y software de base para el SIRCI instalado y configurado	Número de sistemas	P	1	1	1,000,000	6,749,437
			P (a)	1	2	848,042.29	7,445,155.01
			A	1	1	-	3,831,051.05
3.05	Servicios en línea ofrecidos	Número de plataformas	P	1	1	136,674.17	1,135,143.97
			P (a)	-	1	731,971.42	2,072,692.55
			A	-	-	2,114	2,114

Other Cost

	Evaluación	P	0	57,142
		P (a)	20,304.57	57,142
		A	0	0
	Monitoreo y Auditorías	P	57,142.88	114,285.73
		P (a)	52,832.97	280,000
		A	21,535	48,714.2
	Administración	P	958,718	3,832,001.48
		P (a)	1,105,944.81	3,666,287
		A	469,621	2,609,276.07
	Mitigación ambiental	P	75,714	75,714
		P (a)	0	75,714

	Mitigación ambiental	A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	34,179,837.63	80,214,762
		P (a)	21,112,112.58	80,214,762
		A	11,208,916	20,129,667.11

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Inactive		Political Environment		
	Response Actions				
	3.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
12	Inactive		Planning		
	Response Actions				
	12.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	16.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
