

PMR Operational Report

Operation Number	CH-L1081	Chief of Operations Validation Date	03/17/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/20/17
Last Update	03/17/17	Country Representative Validation Date	05/02/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen Education Sector Management	Loan Number	3629/OC-CH
Executing Agency	Ministerio de Educación de Chile	Sector/Subsector	ED-PRI - EDUCATION-PRIMARY EDUCATION
Team Leader	JAIMOVICH,ANALIA VERONICA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	CHILE
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE CHILE		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CH-L1081	50,000,000	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

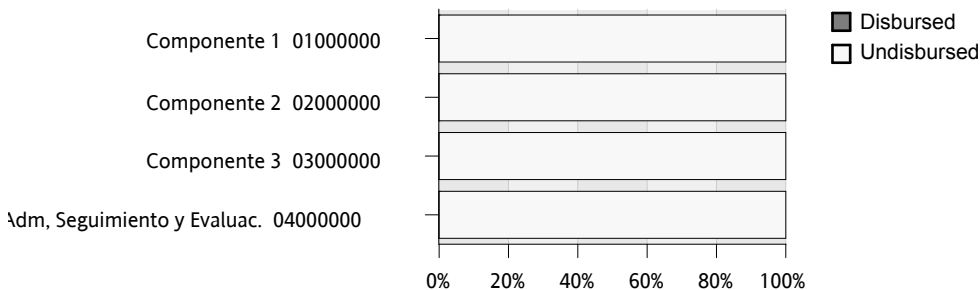

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Programa de Fortalecimiento de la gestión del sector educativo

Observation: (a) La tendencia reciente ha sido un aumento interanual promedio de 3 puntos porcentuales en el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente en escuelas públicas (MINEDUC, 2015). La meta del programa es detener dicha tendencia creciente. No se esperan cambios de mayor envergadura dentro de los 4 años del programa, debido a que los efectos de cambios institucionales solo se observan en el mediano plazo (McKinsey, 2010, Slavin et al, 2013).; (b) La evaluación de impacto del programa proveerá la información comparando el grupo de tratamiento (los primeros 6 territorios con la nueva institucionalidad) con el grupo control; (c) El SIMCE es el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación por el cual se aplican exámenes estandarizados anualmente en las asignaturas de lengua y matemática, entre otras. Los estudiantes clasificados en el nivel insuficiente no logran demostrar consistentemente que han adquirido los conocimientos y habilidades más elementales estipulados en el currículum para el nivel evaluado.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.0	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de lectura de 4o básico	%	44.4	2013	P	44.40	44.40
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.1	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de matemática de 4o básico	%	53.5	2013	P	53.30	53.50
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.2	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de lectura de 2o de media	%	63.6	2013	P	63.60	63.60
					P(a)		
					A		

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.3	Porcentaje de estudiantes de escuelas públicas en el nivel de desempeño insuficiente en SIMCE de matemática de 2o de media	%	67.4	2013	P	67.40	67.40
					P(a)		
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2020
0.4	Porcentaje de niños inscriptos en 1er grado de educación básica que están matriculados en escuelas públicas	%	40.2	2015	P	40.20	40.20
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Programa de fortalecimiento de la gestion del sector educativo

Observation: Se considera que un director de SLE está utilizando herramientas de gestión local cuando utiliza al menos uno de los instrumentos desarrollados en el componente II (liderazgo) para informar el desarrollo del plan de mejoramiento a nivel local. Se considera el 100% de los directores de SLE. Fuente: Informe de monitoreo de la UINEP. Responsable: UINEP

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Número de directores de SLE que utilizan herramientas de gestión local	Teachers (#)	0.0	2015	P	0.00	6.00	9.00	16.00	31.00
					P(a)		0.00	1.00	30.00	31.00
					A	0.00				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.1	Número de directores de escuela que reciben soporte técnico-pedagógico desde el nivel local	Teachers (#)	0.0	2015	P	0.00	231.00	347.00	616.00	1,194.00
					P(a)		0.00	38.00	1,156.00	1,194.00
					A	0.00				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.2	Número de estudiantes de educación básica beneficiados	Students (#)	0.0	2015	P	0.00	72,968.00	109,452.00	194,580.00	377,000.00
					P(a)		0.00	12,160.00	364,840.00	377,000.00
					A	0.00				

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	(a) girls				P	0.00	36,484.00	54,726.00	97,290.00	188,500.00
					P(a)		0.00	6,080.00	182,420.00	188,500.00
					A	0.00				0.00
	(b) boys				P	0.00	36,484.00	54,726.00	97,290.00	188,500.00
					P(a)		0.00	6,080.00	182,420.00	188,500.00
					A	0.00				0.00
	Afro-descendant				P					

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Afro-descendant					P(a)						
						A						
	Boys					P						
						P(a)			6,080.00	182,420.00		188,500.00
						A						
	Girls					P						
						P(a)			6,080.00	182,420.00		188,500.00
						A						
	Indigenous					P						
						P(a)						
						A						
	Men					P						
						P(a)						
						A						
	Post-secondary					P						
						P(a)						
						A						
	Pre-primary					P						
						P(a)						
						A						
	Primary					P						
						P(a)		0.00	12,160.00	364,840.00		377,000.00
						A						
	Secondary					P						
						P(a)						
						A						
	Women					P						
						P(a)						
						A						
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Número de estudiantes de educación media beneficiados	Students (#)	0.0	2015	P	0.00	38,930.00	58,936.00	104,774.00		203,000.00
					P(a)		0.00	6,500.00	196,500.00		203,000.00
					A	0.00					

Details

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					
	(a) girls				P	0.00	19,465.00	29,468.00	52,372.00		101,500.00
					P(a)		0.00	3,250.00	98,250.00		101,500.00
					A	0.00					0.00
	(b) boys				P	0.00	19,465.00	29,468.00	52,372.00		101,500.00
					P(a)		0.00	3,250.00	98,250.00		101,500.00
					A	0.00					0.00
	Afro-descendant				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)		0.00	3,250.00	98,250.00		101,500.00
					A						
	Girls				P						
					P(a)		0.00	3,250.00	98,250.00		101,500.00
					A						
	Indigenous				P						
					P(a)						
					A						
	Men				P						
					P(a)						
					A						
	Post-secondary				P						
					P(a)						
					A						
	Pre-primary				P						
					P(a)						
					A						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Pre-primary				P(a)						
					A						
	Primary				P						
					P(a)						
					A						
	Secondary				P						
					P(a)		0.00	6,500.00	196,500.00		203,000.00
					A						
	Women				P						
					P(a)						
					A						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP	docto	P	1	1	232,896	232,896
			P(a)		0		0
			A	0	0	0	0
1.2	Cupos para capacitación para personal de la UINEP/DEP	cupos	P	0	146		292,000
			P(a)		146		292,000
			A	0	0	0	0
1.3	Plataformas de información y gestión	plataform	P		2		4,218,341
			P(a)		2		4,218,341
			A		0	55,697	55,697
1.4	Campañas comunicacionales	campana	P	1	2	324,672	732,241
			P(a)		2		732,241
			A	1	1	374,495	374,495
1.5	Estrategia de gestión del cambio	estrategia	P		1		567,686
			P(a)		1		567,686
			A		0	0	0
1.6	Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP	paquete	P	46	146	87,874	341,006
			P(a)		146		341,005
			A	0	0	0	0
1.7	Contratación de personal en la UINEP/DEP	personas	P	46	184	1,778,172	7,367,781
			P(a)		184		5,867,098
			A	0	0	0	0
1.8	Documento con diseño de estrategia nacional de educación pública, incluyendo configuración de la DEP	docto	P		0		0
			P(a)		1		578,125
			A		0		0
1.9	Plataforma web para la educación pública	plataforma	P		0		0
			P(a)		1		475,813
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública	docto	P	1	3	471,569	845,359
			P(a)		3		845,359
			A	0	0	0	0
2.2	Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio	territorio	P		31		18,038,654
			P(a)		32		18,038,654
			A	0	0	0	0
2.3	Cupos individuales de capacitación para personal local	cupos	P		3,317		10,139,301
			P(a)		3,317		10,139,301
			A	0	0	0	0
2.4	Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales	oficinas	P		31		7,909,910
			P(a)		31		7,909,910
			A	0	0	0	0
2.5	Campañas comunicacionales a nivel territorio	territorio	P		31		3,958,515
			P(a)		31		3,958,515
			A	0	0	0	0
2.6	Estrategia de gestión del cambio a nivel territorio	territorio	P		31		3,871,907
			P(a)		31		3,871,907
			A	0	0	0	0
2.7	Documento con diseño de modelo técnico pedagógico para un SLE	docto	P		0		0
			P(a)		1		621,829
			A		0		0

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de una nueva institucionalidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1	Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública.	docto	P		3		694,322
			P(a)		3		694,322
			A	0	0	0	0
3.2	Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública	docto	P	1	2	87,336	200,875
			P(a)		2		200,875
			A	0	0	0	0
3.3	Plataforma integrada de gestión e información	plataform	P		1		1,500,000
			P(a)		1		1,500,000
			A		0	0	0
3.4	Instrumentos de planificación y gestión del SAC a nivel de territorio	territorio	P		31		2,728,000
			P(a)		31		2,728,000
			A	0	0	0	0
3.5	Cupos en capacitaciones para personal del SAC	cupos	P		310		702,144
			P(a)		310		702,144
			A	0	0	0	0
3.6	Cupos en capacitaciones para supervisores DEG	cupos	P		0		0
			P(a)		60		57,813
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
4.1	Informes de evaluación de procesos del programa	docto	P	1	3	166,666	500,000
			P(a)		3		500,000
			A	0	0	0	0
4.2	Informes de evaluación de impacto del programa	docto	P	1	3	270,000	900,000
			P(a)		3		900,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administracion, seguimiento y auditoria	P				4,259,062
		P(a)				4,259,062
		A			563,818	563,818

Total Cost

	Total Cost	P			3,419,185	70,000,000
		P(a)				70,000,000
		A			994,010	994,010

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Cupos en capacitaciones para supervisores DEG	Create Output	Este es un producto nuevo acordado con el Ministerio de Educacion. Se realizara durante 2017 la capacitacion de 60 supervisores de la DEG en los nuevos requisitos que impone la politica de fortalecimiento de la educacion publica.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Plataforma integrada de gestión e información	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Estrategia de gestión del cambio a nivel territorio	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Plataforma web para la educación pública	Create Output	Este es un nuevo producto acordado con el Ministerio de Educacion. En el marco de la estrategia comunicacional acordada previamente, se desarrollara un sitio web para la educacion publica.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Plataforma web para la educación pública	Modify Output	Este es un nuevo producto acordado con el Ministerio de Educacion. En el marco de la estrategia comunicacional acordada previamente, se desarrollara un sitio web para la educacion publica.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Contratación de personal en la UINEP/DEP	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública	Modify Output	Se han adecuado las estimaciones originales a los montos actualizados.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/15/2017	03/16/2017
Output	Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/15/2017	03/16/2017
Output	Campañas comunicacionales	Modify Output	Se han adecuado las estimaciones originales a los montos actualizados.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Plataformas de información y gestión	Modify Output	Se han adecuado las estimaciones originales a los montos actualizados.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Estrategia de gestión del cambio	Modify Output	Se han adecuado las estimaciones originales a los montos actualizados.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Instrumentos de planificación y gestión del SAC a nivel de territorio	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/15/2017	03/16/2017
Output	Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/15/2017	03/16/2017
Output	Instrumentos de planificación y gestión del SAC a nivel de territorio	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/15/2017	03/16/2017
Output	Informes de evaluación de impacto del programa	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Documento con diseño de estrategia nacional de educación pública, incluyendo configuración de la DEP	Create Output	Este es un nuevo producto acordado con el Ministerio de Educacion, que reemplaza al anterior producto 1.1. Se desarrollara un producto mas amplio, que comprende el diseno de una estrategia nacional para la educacion publica, incluyendo el diseno de la configuracion de la DEP planificado en el producto original.	03/16/2017	03/16/2017
Outcome	Número de directores de SLE que utilizan	Modify	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de	03/16/2017	03/16/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	herramientas de gestión local	Outcome Indicator	fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.		
Output	Campañas comunicacionales a nivel territorio	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública.	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Documento con diseño de modelo técnico pedagógico para un SLE	Modify Output	Este es un nuevo producto acrodado con el Ministerio de Educacion. Se realizara durante 2017 la produccion de un diseno de modelo tecnico pedagogico a ser utilizado en el territorio de anticipacion de Las Barrancas-Huasco	03/16/2017	03/16/2017
Output	Plataformas de información y gestión	Modify Output	Se han adecuado las estimaciones originales a los montos actualizados.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Estrategia de gestión del cambio	Modify Output	Se han adecuado las estimaciones originales a los montos actualizados.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/15/2017	03/16/2017
Output	Contratación de personal en la UINEP/DEP	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Cupos para capacitación para personal de la UINEP/DEP	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Estrategia de gestión del cambio a nivel territorio	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/15/2017	03/16/2017
Outcome	Número de estudiantes de educación media beneficiados	Modify Outcome Indicator	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Cupos individuales de capacitación para personal local	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública.	Modify Output	Se han adecuado las estimaciones originales a los montos actualizados.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio	Modify Output	Se han adecuado las estimaciones originales a los montos actualizados.	03/16/2017	03/16/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Cupos individuales de capacitación para personal local	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/15/2017	03/16/2017
Output	Cupos en capacitaciones para supervisores DEG	Modify Output	Este es un producto nuevo acordado con el Ministerio de Educacion. Se realizara durante 2017 la capacitacion de 60 supervisores de la DEG en los nuevos requisitos que impone la politica de fortalecimiento de la educacion publica.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Campañas comunicacionales a nivel territorio	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/15/2017	03/16/2017
Output	Campañas comunicacionales	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Cupos en capacitaciones para personal del SAC	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/15/2017	03/16/2017
Output	Informes de evaluación de impacto del programa	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/15/2017	03/16/2017
Output	Documento con diseño de modelo técnico pedagógico para un SLE	Create Output	Este es un nuevo producto acordado con el Ministerio de Educacion. Se realizara durante 2017 la produccion de un diseno de modelo tecnico pedagogico a ser utilizado en el territorio de anticipacion de Las Barrancas-Huasco	03/16/2017	03/16/2017
Outcome	Número de estudiantes de educación basica beneficiados	Modify Outcome Indicator	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Documento con diseño de estrategia nacional de educación pública, incluyendo configuración de la DEP	Modify Output	Este es un nuevo producto acordado con el Ministerio de Educacion, que reemplaza al anterior producto 1.1. Se desarrollara un producto mas amplio, que comprende el diseno de una estrategia nacional para la educacion publica, incluyendo el diseno de la configuracion de la DEP planificado en el producto original.	03/16/2017	03/16/2017
Outcome	Número de directores de escuela que reciben soporte técnico-pedagógico desde el nivel local	Modify Outcome Indicator	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Cupos en capacitaciones para personal del SAC	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Informes de evaluación de procesos del programa	Modify Output	El cambio se debe a que el Ministerio de Educacion ha modificado los plazos de implementacion de la politica de fortalecimiento de al educacion publica dentro de la cual se enmarca esta operacion, con lo cual los plazos de implementacion originalmente planeados se han movido hacia mas adelante.	03/16/2017	03/16/2017
