

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1067	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/18/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/24/17
<b>Last Update</b>	04/11/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/25/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Forest Sustainability and Competitiveness Program	<b>Loan Number</b>	2853/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS	<b>Sector/Subsector</b>	PA-FOR - ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-FOREST RESOURCES MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	ALVA HART,VIVIANA DEL CARMEN	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ARGENTINA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1067	60,000,000	60,000,000	14,800,000	0	74,800,000	60,000,000	22,950,000	38.25%	37,050,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000	14,800,000	0	74,800,000	60,000,000	22,950,000	38.25%	37,050,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

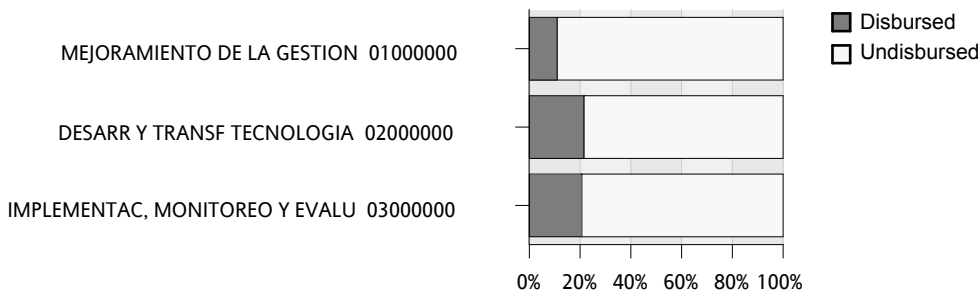

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Aumentar el valor agregado de la producción forestal

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.1	Participación del sector forestal en el PIB total (%)	%	1.5	2009	P	2.10
					P(a)	2.10
					A	
Details						
Means of verification: Fuente: FAO						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Impact Nbr. 2:** Aumentar las exportaciones forestales

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
2.1	Valor de las exportaciones (millones US\$)	Millones US\$	960.0	2012	P	1,307.00
					P(a)	1,307.00
					A	
Details						
Means of verification: Fuente: TRADE.NOSIS						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 3:** Disminuir la dependencia del país en la utilización de bosque nativo manteniendo el crecimiento del sector

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
3.1	Porcentaje de utilización por parte del sector foresto industrial de madera de bosques plantados	%	89.0	2012	P	95.00
					P(a)	95.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas de la Administración Nacional de Bosques, Servicio Forestal Nacional, IFONA, SAGPyA, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Humano

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
3.2	Tasa de crecimiento anual de la producción	%	2.4	2012	P	2.40
					P(a)	2.40
					A	

#### Details

**Means of verification:** PEA, SIIA y MAGyP

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Aumentar la superficie forestada con especies de alto valor y con prácticas de buen manejo para la producción de madera de calidad

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.1	Superficie manejada para la producción de madera de calidad	Area (Hectares)	600000.0	2012	P					1,200,000.00	1,200,000.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
					A	0.00		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Encuestas ad hoc a productores forestales en año base 2013 y el año meta 2017, inventarios forestales, reportes del INTA y Estadísticas de la DPF.

**Observations:** El total de hectáreas que se encuentran plantadas actualmente es de 1.200.000. Se espera que con el Programa se alcance la meta de mejor manejo para ese número de has.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.2	Superficie forestada con especies de alto valor	Has.	50000.0	2012	P					80,000.00	80,000.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
					A	0.00		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Encuestas ad hoc a productores forestales en año base 2013 y el año meta 2017, inventarios forestales, reportes del INTA y Estadísticas de la DPF.

**Observations:** Se considera madera de calidad aquella que puede ser dedicada a usos para productos decorativos, de apariencia o estructurales que cumple standards entre otros. Especies de alto valor son especies que comandan precios superiores al promedio por las caract

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Mejorar el acceso a cadenas de alto valor por parte de las MiPyMEs foresto y foresto industriales

**Observation:** Como cadenas de alto valor se entenderán todas aquellas que involucran la comercialización de productos donde se requiere madera seca.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
2.1	Diferencia en el porcentaje de nuevas MiPyMEs que se encuentran en zonas beneficiarias y no beneficiarias que se integran a nuevas cadenas de valor.	%	0.0	2012	P					30.00	30.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
					A	0.00		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Como zonas beneficiarias se identifica el área de influencia de los programas de viveros y primera transformación.

**Observations:** La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones. Las categorías de MiPyMES foresto industriales se definen con base en la producción mensual promedio de madera aserrada, según las siguientes categorías: (1) Micropymes: hasta 25 metros cúbicos; (2) Pequeñas: hasta 75 metros cúbicos; (3) Medianas: hasta 150 metros cúbicos; (4) Se excluye a las sociedades anónimas. Como cadenas de alto valor se entenderán todas aquellas que involucran la comercialización de productos donde se requiere madera seca.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Aumentar la disponibilidad y el acceso de información para las MiPyMEs forestales y forestoindustriales

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
3.1	MiPyMEs forestales y forestoindustriales que declaran utilizar el sistema de información para la toma de decisiones	MiPyMEs	2012	P					14,000.00	14,000.00
				P(a)		0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
				A	0.00		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Encuestas de línea de base y registros online

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 4:** Incrementar el nivel de formalidad de las MiPyMEs forestales y forestoindustriales

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
4.1	MiPyMEs forestales y foresto industriales que completaron el Programa de Verificación Independiente de la "Legalidad de la Madera" (1era y 2da Verificación in situ del cumplimiento legal)	MiPyMEs	2012	P			200.00	200.00	350.00	750.00
				P(a)		0.00	0.00	400.00	350.00	750.00
				A	0.00		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Registros del CERFOAR

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
4.2	Porcentaje de madera legal, con certificado de verificación, procesada en los centros de servicios financiados por el Programa	%	2012	P			5.00	25.00		30.00
				P(a)		0.00	0.00	30.00		30.00
				A	0.00		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Registros de los centros de servicios

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 5:** Incrementar la sostenibilidad de la gestión forestal de las MiPyMEs y la cadena de custodia

**Observation:**

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year							
5.1	MiPyMEs forestales y foresto industriales que certificaron su gestión forestal sostenible y su cadena de custodia con el CERFOAR	MiPyMEs	0.0	2012	P				40.00	40.00	80.00
					P(a)		0.00	0.00	40.00	40.00	80.00
					A	0.00		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Registros de certificación forestal del CERFOAR

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 6:** Incrementar la disponibilidad de especies de alto valor para los productores forestales en regiones prioritarias (Chaco, NOA, Valles Irrigados, Pampeana)

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
6.1	Especies difundidas en plantaciones forestales comerciales	Número de nuevas especies	0.0	2012	P					12.00	12.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
					A	0.00		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informes del INTA, publicaciones, visitas a campo y encuestas a productores

**Observations:** 8 especies exóticas y 4 nativas

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
6.2	Clones difundidos en plantaciones forestales comerciales	Número de nuevos clones	0.0	2012	P					20.00	20.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
					A	0.00		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informes del INTA, publicaciones, visitas a campo y encuestas a productores

**Observations:** 20 clones intra e interespecíficos

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 7:** Disminuir el riesgo de arribo y establecimiento de nuevas plagas y enfermedades forestales y mitigar los daños asociados con plagas y enfermedades presentes

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
7.1	Plagas y/o enfermedades cuarentenarias	Número de	0.0	2012	P					0.00	0.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

7.1	detectadas en la Argentina sin que logren altos niveles de prevalencia	plagas y/o enfermedades	0.0	2012	P(a)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					A	0.00		0.00			
Details											
Means of verification: FAO, SENASA											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

**Outcome Nbr. 8:** Incrementar la disponibilidad y la adopción de material vegetativo de calidad

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
8.1	Material de propagación disponible en viveros	Nº de plantines	2.25E7	2012	P					27,500,000.00	27,500,000.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	27,500,000.00	27,500,000.00
					A	0.00		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informes de producción de los viveros, datos del SIIF y encuestas a productores.

**Observations:** La zona de influencia se refiere al área en el que el vivero tiene mayor poder de acción. Es de esperarse que los productores localizados en esta zona sean más propensos a la adopción de plantines generados en los viveros. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.

Pro-Gender				No				Pro-Ethnicity			
								No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
8.2	Viveristas produciendo con tecnologías promovidas por el proyecto	Nº de viveristas	0.0	2012	P					61.00	61.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	61.00	61.00
					A	0.00		0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informes de producción de los viveros, datos del SIIF y encuestas a productores.

**Observations:** La zona de influencia se refiere al área en el que el vivero tiene mayor poder de acción. Es de esperarse que los productores localizados en esta zona sean más propensos a la adopción de plantines generados en los viveros. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.

Pro-Gender				No				Pro-Ethnicity			
								No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
8.3	Diferencia en la probabilidad de adopción de material de propagación disponible en viveros entre productores en zona de influencia y productores en otras zonas	%	0.0	2012	P					30.00	30.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
					A	0.00		0.00			

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details					
<b>Means of verification:</b> Informes de producción de los viveros, datos del SIIF y encuestas a productores.					
<b>Observations:</b> La zona de influencia se refiere al área en el que el vivero tiene mayor poder de acción. Es de esperarse que los productores localizados en esta zona sean más propensos a la adopción de plantines generados en los viveros. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.					
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No		

**Outcome Nbr. 9:** Mejorar el acceso a tecnologías de producción y capacitación por parte de las MiPyMEs para facilitar su vinculación a cadenas de valor y promover la incorporación de nuevos productos con mayor valor agregado

#### Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
9.1	Diferencia en la probabilidad de adopción de tecnologías de secado en horno, aserrado y/o debobinado entre MiPyMEs participantes y no participantes	%	0.0	2012	P				25.00	25.00
					P(a)		0.00	0.00	25.00	25.00
					A	0.00		0.00		

Details					
<b>Means of verification:</b> Encuestas a MiPyMEs y productores, registros de los centros de capacitación y transformación de la madera					
<b>Observations:</b> Se define como MiPyMEs participantes aquellas cuyos empleados o empleadores reciban entrenamiento en los centros de capacitación y transformación. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.					
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
9.2	Diferencia en el aprovechamiento de rollizos en la primera transformación entre MiPyMEs participantes y no participantes	%	0.0	2012	P				15.00	15.00
					P(a)		0.00	0.00	15.00	15.00
					A	0.00		0.00		

Details					
<b>Means of verification:</b> Encuestas a MiPyMEs y productores, registros de los centros de capacitación y transformación de la madera.					
<b>Observations:</b> Se define como MiPyMEs participantes aquellas cuyos empleados o empleadores reciban entrenamiento en los centros de capacitación y transformación. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.					
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No		

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
9.3	Diferencia en la proporción de madera seca producida entre participantes y no participantes	%	0.0	2012	P				15.00	15.00
					P(a)		0.00	0.00	15.00	15.00
					A	0.00		0.00		



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

##### Details

**Means of verification:** Encuestas a MiPyMEs y productores, registros de los centros de capacitación y transformación de la madera.

**Observations:** Se define como MiPyMEs participantes aquellas cuyos empleados o empleadores reciban entrenamiento en los centros de capacitación y transformación. La identificación de las áreas de influencia se realizará en base a la localización de las intervenciones.

**Pro-Gender**

No

**Pro-Ethnicity**

No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 1.1 Información Forestal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	Inventario Forestal Permanente relevado (parcelas medidas)	Inventario	P		1	279,440	1,903,700
			P(a)	0	1	239,672	1,903,620
			A	0	0	314,990	845,188
1.2	Infraestructuras de datos espaciales (IDE) disponible	IDE	P		1	150,250	776,850
			P(a)	0	1	3,744	777,323
			A	0	0	12,094	33,042
1.3	Plataforma de Servicios de Información para las MiPyMEs operativa	Plataforma	P		1	373,304	2,250,200
			P(a)	0	1	27,982	2,250,200
			A	0	0	84,083	84,083
1.4	Organismos públicos nacionales y provinciales fortalecidos a través de equipamiento, vehículos, servicios y difusión	Organismo	P		5	138,882	1,035,300
			P(a)	0	5	30,841	1,035,301
			A	2	2	70,080	70,080

## Component Nbr. 2 1.2 Promoción de la Certificación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Protocolos de Verificación y Acreditación del Programa de Verificación Independiente de la Legalidad de la Madera aprobados por el CERFOAR	Protocolo	P		18	1,890,600	6,092,000
			P(a)	18	18	85,774	6,092,000
			A	0	0	31,199	101,739
2.2	Planes de comunicación y difusión implementados	campana	P		1	97,100	573,300
			P(a)	0	1	13,047	573,300
			A	0	0	0	0
2.3	Grupos de MiPyMEs regionales certificados en gestión forestal sostenible y/o cadena de custodia	Grupos MiPymes	P	4	8	185,000	461,000
			P(a)	0	8	9,903	461,000
			A	0	0	35,314	111,366
2.4	CERFOAR fortalecida a través de asistencia técnica, estudios de apoyo y adquisición de seguimiento	CERFOAR	P		1		53,000
			P(a)	0	1	7,296	53,001
			A	0	0	3,741	12,058

## Component Nbr. 3 2.1 Investigación y Desarrollo Forestal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1	Proyectos de Investigación ejecutados (Fondos concursables)	Proyectos	P		15	297,500	850,000
			P(a)	0	34	125,670	1,118,142
			A	0	0	331,339	872,031
3.2	Informes de avance semestrales presentados por el INTA aprobados	Informe	P	2	8	2,841,695	13,064,600
			P(a)	2	6	1,411,250	12,796,457
			A	2	2	169,737	205,900

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 4 2.2 Sanidad Forestal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
4.1	Encuentros técnicos realizados	Eventos	P	33	109	112,057	443,000
			P(a)	14	100	40,322	404,669
			A	16	21	0	29,074
4.2	Instalaciones readecuadas y/o equipadas (ANR)	Instalaciones	P		6		390,000
			P(a)	2	6	113,846	390,000
			A	1	1	147,604	235,257
4.3	Técnicos, docentes y profesionales especialistas capacitados en manejo de plagas y enfermedades, y detección precoz	Personas	P	80	240	30,000	176,400
			P(a)	50	436	43,207	214,732
			A	206	301	95,034	131,808
4.4	Tableros para consulta de SENASA	Informe	P		2		20,000
			P(a)	1	2	12,791	20,000
			A	1	1	5,406	5,406

## Component Nbr. 5 2.3 Apoyo a la instalación y puesta en marcha de viveros forestales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
5.1	Viveros demostrativos instalados y/o mejorados en funcionamiento	Viveros	P		11	1,375,714	10,749,000
			P(a)	6	11	3,412,023	10,749,000
			A	5	5	2,451,045	3,103,232
5.2	Viveristas financiados para producir con tecnologías promovidas por el proyecto	ANRs	P	15	61	722,650	2,592,500
			P(a)	9	61	769,064	2,592,499
			A	7	7	487,383	504,524
5.3	Personal técnico de viveros públicos y privados y viveristas capacitados	Personas	P	144	600	535,650	2,260,600
			P(a)	60	600	22,143	2,260,599
			A	0	82	1,359	11,246

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 6 2.4 Mejora primera transformación mecánica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
6.1	Centros de calidad, de capacitación y de producción construidos o ampliados, equipados y en funcionamiento	Centros	P		10	9,621,500	16,390,500
			P(a)	3	10	9,310,010	16,390,501
			A	0	0	7,489,555	9,751,225
6.2	Productores asociados a los Centros asistidos financieramente para la adopción de tecnologías	ANRs	P	40	87	3,089,500	9,503,500
			P(a)	26	87	3,658,606	9,503,500
			A	8	42	1,527,663	1,581,282
6.3	Giras de productores MIPYMES para conocer experiencias exitosas y centros de demandas realizadas	Giras	P	1	2	42,500	85,000
			P(a)	1	2	0	85,000
			A	0	0	0	0
6.4	Operarios, Mandos Medios y Responsables Técnicos de empresas capacitados	Personas	P	445	1,400	409,500	1,288,000
			P(a)	60	1,400	142,857	1,288,001
			A	0	17	13,540	56,811
6.5	Estudios para el diseño de canales de distribución y comercialización	Informes	P	4	10	95,000	211,000
			P(a)	1	10	15,000	211,000
			A	0	0	0	23
6.6	Pequeños Productores financiados a traves de ANRs en Misiones	ANRs	P		0		0
			P(a)		30		0
			A	0	0	0	0

### Other Cost

	Costos operativos	P			510,752	3,630,550
		P(a)			699,437	3,617,041
		A			498,886	849,092

### Total Cost

	Total Cost	P			22,798,594	74,800,000
		P(a)			20,194,485	74,786,886
		A			13,770,052	18,594,467

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Encuentros técnicos realizados	Modify Output	Ejecución del producto en proceso. Se realizó en agosto la 3er reunión del Panel de Sanidad Forestal. En los meses de agosto y noviembre tuvieron lugar la segunda y tercera fecha de realización de las capacitaciones previstas en los módulos del Programa de Capacitación en Sanidad Forestal en las ciudades de Virasoro (Corrientes), Buenos Aires y San Carlos de Bariloche (Río Negro), dirigido a técnicos vinculados a la planificación y ejecución de planes de monitoreo de plagas y enfermedades forestales. En septiembre se realizó el Taller "Manejo de Hormigas cortadoras en Programas Forestales". Se realizaron 3 reuniones técnicas en las visitas realizadas a los Laboratorios de Jujuy, Esquel y Lujan. Durante el 2017 se continuará con los 3 módulos restantes del Programa de Capacitación en Sanidad Forestal y se realizará la 3era edición de las Jornadas Argentinas de Sanidad Forestal. Se refleja la ejecución presupuestaria en el producto 4,3.	03/09/2017	03/14/2017
Output	Inventario Forestal Permanente relevado (parcelas medidas)	Modify Output	Planificado para el 2018.	03/09/2017	03/14/2017
Output	Avance de medición de Parcelas del Inventario Forestal Permanente	Delete Milestone	Se acuerdo con la UE simplificar la matriz de productos, eliminando los hitos que no reflejan el avance del prestamo. Queda el producto Inventario Forestal permanente" medido en Informes y el hito de Numero de provincias que iniciaron campanas de relevamiento.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Avance de ejecución de las actividades de capacitación y asistencia técnica a través de cursos, talleres y estudios	Delete Milestone	Se acuerdo con la UE simplificar la matriz de productos, eliminando los hitos que no reflejan el avance del prestamo. Queda el producto "Personal tecnico de viveros publicos y privados y viveristas capacitados" medido en personas.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Avance de ejecución de los proyectos de investigación	Delete Milestone	Se acuerdo con la UE simplificar la matriz de productos, eliminando los hitos que no reflejan el avance del prestamo. Queda el producto Proyectos de investigacion ejecutados" medido en Informes y el hito de Proyecto de investigacion que inician ejecucion.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Informes de avance semestrales presentados por el INTA aprobados	Modify Output	Ejecución del producto en proceso. INTA presentó un informe de avance correspondiente al 2do semestre de 2017. El INTA está ejecutando algunas de las actividades previstas con fondos propios de la Institución. Se aprobó la cesión de crédito de UCAR al INTA en el mes de octubre de 2016. Si bien en el semestre informado se han comenzado algunos procesos de adquisición de equipamiento y de semillas, los mismos no pudieron concretarse antes de la finalización del ejercicio 2016. Por otro lado, la contratación de los técnicos se sigue realizando a través de la UCAR.	03/09/2017	03/14/2017
Output	Número de grupos de MiPyMEs regionales certificados en gestión forestal sostenible	Delete Milestone	Se acuerdo con la UE simplificar la matriz de productos, eliminando los hitos que no reflejan el avance del prestamo. Queda el producto "Grupos de MiPyMEs regionales certificados en gestion forestal sostenible" medido en Grupos MiPymes y el hito de Numero de MyPyMEs forestales y forestoindustriales capacitados en certificacion medido en personas.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Rodales semilleros, huertos semilleros, clones seleccionados inscriptos o a inscribir y ensayos de progenie de especies nativas y exóticas no tradicionales	Delete Milestone	Se acuerdo con la UE simplificar la matriz de productos, eliminando los hitos que no reflejan el avance del prestamo. Queda el producto "Informes de avance semestrales presentados por el INTA" medido en Informes y el hito de Acuerdo especifico de subejecucion INTAR-UCAR.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Colecciones de género de especies alternativas, nativas y exóticas con base genética ampliada para caracteres de madera para usos de apariencia	Delete Milestone	Se acuerdo con la UE simplificar la matriz de productos, eliminando los hitos que no reflejan el avance del prestamo. Queda el producto "Informes de avance semestrales presentados por el INTA" medido en Informes y el hito de Acuerdo especifico de subejecucion INTAR-UCAR.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Personal técnico de viveros públicos y privados y viveristas capacitados	Modify Output	Ejecución del producto en proceso. Se espera avanzar con la ejecución de este producto próximamente. Este producto depende de que los viveros demostrativos estén en funcionamiento y por eso se detecta la demora. Para el 2017 se espera que los viveros Pereyra Iraola, Arrayana, Termas de Río Hondo, Orán, Corfone y Conesa estén en funcionamiento con lo cual se avanzará en este producto.	03/09/2017	03/14/2017
Output	Avance de ejecución de actividades de	Delete Milestone	Se acuerdo con la UE simplificar la matriz de productos, eliminando los hitos que no reflejan el avance del prestamo. Queda el producto "Operarios, Mandos medios y Responsables tecnicos de empresas capacitados" medido en Personas y dos hitos de medicion de Informes y ANRs.	03/13/2017	03/14/2017

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	capacitación y asistencia técnica				
Output	Avance de entrega de ANRs a viveristas para la incorporación de tecnologías en la producción	Delete Milestone	Se acuerdo con la UE simplificar la matriz de productos, eliminando los hitos que no reflejan el avance del prestamo. Queda el producto "Viveristas financiados para producir con tecnologías promovidas" medido en ANRs y el hito de ANR adjudicado.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Tableros para consulta de SENASA	Modify Output	Se entregó el informe final de la consultoría "Elaboración de un digesto normativo conformado por leyes y reglamentaciones nacionales y provinciales relativas a la sanidad forestal". Se trabajará el análisis de riesgo de invasiones con el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo del SENASA.	03/09/2017	03/14/2017
Output	Estudios para el diseño de canales de distribución y comercialización	Modify Output	Se prevé dar inicio a la ejecución del producto durante el 1er semestre de 2017. Se prevee una consultoría para la elaboración de un Manual de construcciones en madera para los códigos de edificación.	03/09/2017	03/14/2017
Output	Avance de ejecución de las actividades de fortalecimiento de las capacidades en manejo de plagas y enfermedades y detección precoz	Delete Milestone	Se acuerdo con la UE simplificar la matriz de productos, eliminando los hitos que no reflejan el avance del prestamo. Queda el producto "Técnicos, docentes y profesionales especialistas capacitados en manejo de plagas y enfermedades" medido en Personas.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Infraestructuras de datos espaciales (IDE) disponible	Modify Output	Planificado para el 2018.	03/09/2017	03/14/2017
Output	Avance de acuerdos de cooperación firmados con productores de información geográfica	Delete Milestone	Se acuerdo con la UE simplificar la matriz de productos, eliminando los hitos que no reflejan el avance del prestamo. Queda el producto "Plataforma de Servicios de Información" medido en Plataforma.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Proyectos de Investigación ejecutados (Fondos concursables)	Modify Output	Planificado para el 2018.	03/09/2017	03/14/2017
Output	Viveristas financiados para producir con tecnologías promovidas por el proyecto	Modify Output	Ejecución del producto en proceso. Se continuará con la implementación de los PN formulados y con la formulación de ideas Planes de Negocio (PN) para la obtención de Aportes No Reembolsables (ANR) para adopción de tecnología en viveros forestales. Pese al relanzamiento de la convocatoria a nivel nacional en todo el ejercicio 2016 se recibieron solo 2 ideas proyecto nuevas y 9 en la provincia de misiones por lo que se considera que dada la situación económica del sector y el bajo porcentaje de ANR ofrecido esta herramienta no resulta atractiva.	03/09/2017	03/14/2017
Output	Productores asociados a los Centros asistidos financieramente para la adopción de tecnologías	Modify Output	Ejecución del producto en proceso. Durante el segundo semestre se entregó equipamiento en el marco del convenio firmado con la Cooperativa 19 de marzo limitada de Caimancito, Jujuy y se realizó un anticipo a la provincia de Misiones para el financiamiento de 7 convenios de ANRs	03/09/2017	03/14/2017
Output	Operarios, Mandos Medios y Responsables Técnicos de empresas capacitados	Modify Output	El avance de este producto depende en gran medida del avance del producto 6.1. Se firmó un convenio en el mes de diciembre de 2016 con la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) para el desarrollo y la gestión de un Plan de Capacitación para operarios y mandos medios de las industrias de la primera transformación mecánica de la madera. Ya se cuenta con el diseño curricular de las capacitaciones para operarios, mandos medios, técnicos y propietarios de viveros e industrias de la provincia de Misiones.	03/09/2017	03/14/2017
Output	Encuentros técnicos realizados	Modify Output	El cambio ha sido generado por la UE en su revisión de los objetivos para el 2017.	04/11/2017	04/11/2017
Output	Avance en la ejecución de ANRs entregados	Delete Milestone	Se acuerdo con la UE simplificar la matriz de productos, eliminando los hitos que no reflejan el avance del prestamo. Queda el producto "Productores asociados a los Centros asistidos financieramente para la adopción de tecnologías" medido en ANRs.	03/13/2017	03/14/2017
Output	Proyectos de	Modify	Ejecución en proceso. De los 36 convenios para Proyectos de Investigación Aplicada firmados continúan 34 en ejecución. Uno ya formalizó la	03/09/2017	03/14/2017

## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	Investigación ejecutados (Fondos concursables)	Output	rescisión y en el primer semestre se formalizará la del proyecto restante.		
