

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	NI-L1059	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/03/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/02/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to accompany the implementation of the National Policy for children in P	<b>Loan Number</b>	2725/BL-NI
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE LA FAMILIA	<b>Sector/Subsector</b>	IS-ECD - SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	SANCHEZ-MONIN, EMMANUELLE	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	NICARAGUA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE NICARAGUA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
NI-L1059	20,000,000	20,000,000	28,000,000	0	48,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00%	0
Aggregated	20,000,000	20,000,000	28,000,000	0	48,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

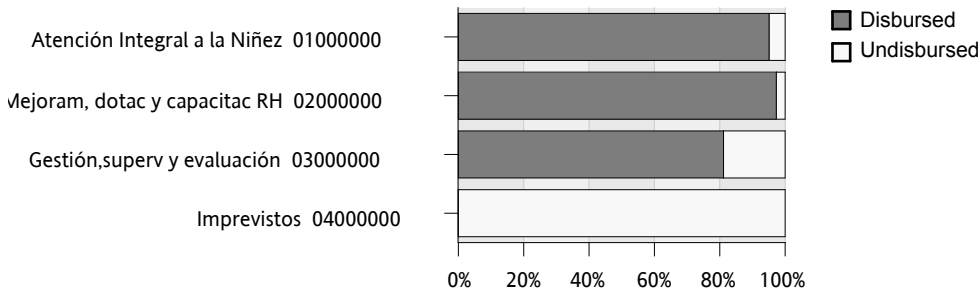

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Mejorar el bienestar de los niños y su desarrollo cognitivo y socioemocional, particularmente en poblaciones vulnerables

##### Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.1	Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo del lenguaje en comunidades beneficiarias	%	47.4	2013	P	39.50	39.77			39.77
					P(a)				40.00	40.00
					A	0.00				

##### Details

**Means of verification:** Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

**Observations:** Datos de línea base extraídos de la evaluación PAININ III.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.2	Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo social/individual en comunidades beneficiarias	%	31.1	2013	P	70.90	71.30			71.30
					P(a)				25.00	25.00
					A	0.00				

##### Details

**Means of verification:** Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

**Observations:** Datos de línea de base extraídos de la evaluación del PAININ III

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.3	Porcentaje de niños y niñas de 6 a 23 meses con desnutrición crónica en el área priorizada	%	10.1	2013	P	17.00	15.00			15.00
					P(a)				9.00	9.00
					A	0.00				

##### Details

**Means of verification:** Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

**Observations:** Datos de línea base extraídos de la ENDESA 2006-2007.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.4	Porcentaje de niños de 3 a 6 asistiendo el pre-	%	32.0	2013	P	40.00	65.00			65.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

1.4	escolar en comunidades beneficiarias.	%	32.0	2013	P(a)		40.00		60.00	60.00
					A	0.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

**Observations:** Datos de línea de base extraídos de datos administrativos Ministerio de Educación

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.5	Porcentaje de niños de 0 a 6 años registrados en el Registro Civil en las áreas priorizadas.	%	85.0	2013	P	80.00	95.00		95.00
				P(a)				90.00	90.00
				A	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Evaluación externa de medio término (18 meses) y final (42 meses)

**Observations:** Datos de línea de bases extraídos de datos administrativos MIFAN

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.4	Porcentaje de niños menores de 6 años con retrasos en el desarrollo motor fino en comunidades beneficiarias	%	31.2	2014	P				
				P(a)				25.00	25.00
				A	0.00				

#### Details

**Means of verification:** Evaluación Externa de Medio Término (18 meses) y final (42 meses)

**Observations:** Datos de línea de base extraídos de datos administrativos del Ministerio de Educación.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Padres y madres competentes para propiciar una adecuada nutrición, salud, educación, buen trato y participando activamente en la promoción y cumplimiento de los derechos de la primera infancia.

**Observation:** Fuentes: Datos de línea base extraídos de Verdisco et al (2009); Registros Programa Amor para los más chiquitos; Sistemas de referencia del MINSA/MINED/MIFAN y actores locales (Comisaría de la Mujer); Datos de línea base extraídos de Macours et al (2011). Evaluación de medio término y final.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.1	Porcentaje de niños y niñas de 0-3 años que recibieron 12 o más visitas según norma de atención durante el último año	%	0.0	2013	P	60.00				80.00
					P(a)		60.00		80.00	80.00
					A	0.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Registro Programa Amor para los más chiquitos

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.2	Porcentaje de niños y niñas de 3-6 años de las áreas priorizadas matriculados en el preescolar	%	35.0	2013	P	40.00				50.00
					P(a)		40.00		50.00	50.00
					A	0.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Registros de alumnos

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.3	Porcentaje de hogares donde por lo menos un miembro acudió a los servicios que están incluidos en el sistema de referencia en los últimos seis meses	%	14.0	2013	P	30.00				50.00
					P(a)		30.00		50.00	50.00
					A	0.00	0.00			

#### Details

**Means of verification:** Registros de Programa Amor para los más chiquitos y sistemas de referencia del Sistema MINSA/MINED/MIFAN y actores locales (comisarias de las mujer)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.4	Porcentaje de los padres quienes mostraron actitudes positivas en hogares con una mujer embarazada o un niño de 0-6 años, en la calidad del ambiente familiar.	%	82.0	2013	P	3.95				3.85
					P(a)					88.00
					A	0.00				

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details										
Means of verification: Datos serán revalidados con la recolección de línea de base, Evaluación externa y final										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.4	Porcentaje de respuestas correctas que dieron los padres en la prueba estandarizada sobre competencias parentales incluyendo actitudes y creencias (escala KIDI).	%	79.0	2013	P					
					P(a)			82.00	82.00	
					A	0.00				
Details										
Means of verification: Recolección de Línea de Base, Evaluación Externa y Final.										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1. Atención Integral a la niñez en comunidades priorizadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Familias con al menos una embarazada y/o menor de seis años con por lo menos una visita anual por el MIFAN-SNBS	Familias	P		66,500		705,984
			P(a)	2,500	50,000	34,440	519,504.37
			A	2,504	40,404	16,482	501,546.37
1.2	Niños de 0-3 años atendidos en visita mensual de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS	Children (#)	P		40,000		9,530,537
			P(a)	10,890	33,000	690,876	8,398,342.75
			A	8,639	32,347	390,025	8,044,491.75
1.3	Niños de 3-6 años con registro de evaluación bimestral de desarrollo y asistencia al preescolar por MINED-SNBS y visita bimestral de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS	Students (#)	P		40,000		1,843,750
			P(a)	0	30,000	0	3,728,391.58
			A	0	27,778	5,730	3,734,121.58
1.4	Niños/as menores de un año con cuarto control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Beneficiaries (#)	P		40,000		134,755
			P(a)	1,815	11,000	13,285	144,283
			A	1,815	11,393	13,297	144,295
1.5	Niños/a de 1 año cumplido y menor de cinco por cumplir con tercer control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Beneficiaries (#)	P		53,400		502,241
			P(a)	3,630	32,000	19,337	338,799.8
			A	3,630	31,209	19,366	338,828.8
1.6	Niños/as de cinco años cumplidos a 6 años por cumplir con segundo control de seguimiento de VPCD según norma de atención integral a la niñez.	Beneficiaries (#)	P		13,300		134,755
			P(a)	0	10,000	0	118,424
			A	0	5,886	0	118,424
1.7	Niños/as de 6 a 24 meses reciben micronutrientes en las áreas priorizadas.	niños	P		20,000		653,429
			P(a)	2,115	8,500	26,816	244,522.49
			A	2,115	19,534	26,600	244,306.49

## Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento de las condiciones de atención

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Agentes calificados a cargo de las visitas domiciliarias graduados de proceso de formación para dar dicha atención.	Agentes	P		2,375		950,000
			P(a)	30	7,604	26,780	939,511.23
			A	37	7,611	10,890	916,361.23
2.2	Espacios comunitarios y salas de estimulación temprana rehabilitados	Espacios Rehabilitados	P		250		1,750,000
			P(a)	30	231	113,400	1,457,172.26
			A	30	231	156,016	1,499,788.26

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Gestión, Supervisión y Evaluación

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Informes Semestrales de verificación de cobertura entregados	informes	P		6		275,000
			P(a)	1	5	0	0
			A	1	5	0	0
3.2	Informes de seguimiento mensual de los Comités Municipales de APLMC entregados.	informes	P		1,332		458,767
			P(a)	231	1,688	157,400	1,029,961.64
			A	198	1,655	83,408	955,969.64
3.3	Usuarios primarios del registro únicos de protagonistas activos en el MIFAN, MINSA y MINED durante el semestre anterior	Personas	P		480		250,000
			P(a)	47	147	27,170	266,139.77
			A	47	147	17,648	250,809.77
3.4	Informe anuales de la evaluación de desempeños entregados	Informes	P		3		350,000
			P(a)	1	4	86,871	266,912.23
			A	1	4	61,568	241,609.23
3.5	Informe de evaluación de impacto entregados	informes	P		1		500,000
			P(a)	1	2	270,000	450,000
			A	0	0	0	0

### Other Cost

Auditoría		P				
		P(a)			13,600	47,784
		A			13,600	42,584
Costo de Operación del Programa		P				1,218,229
		P(a)			303,083	1,730,900.82
		A			193,194	1,493,300.68
Costos Financieros		P				
		P(a)			0	319,350.06
		A			80,650	400,000.06
Imprevistos		P				
		P(a)			0	0
		A			0	0

### Total Cost

Total Cost		P				19,257,447
		P(a)			1,783,058	20,000,000
		A			1,088,474	18,926,436.86

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
