

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1067	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/04/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/02/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi	<b>Loan Number</b>	2614/BL-BO, 2614/BL-BO-1, 2614/BL-BO-2
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
<b>Team Leader</b>	BUSCARONS CUESTA,LUIS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BOLIVIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE BOLIVIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	Satisfactory		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1067	35,000,000	35,000,000	7,270,000	0	42,270,000	35,000,000	18,166,285.85	51.90%	16,833,714.15
<b>Aggregated</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>7,270,000</b>	<b>0</b>	<b>42,270,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>18,166,285.85</b>	<b>51.90%</b>	<b>16,833,714.15</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

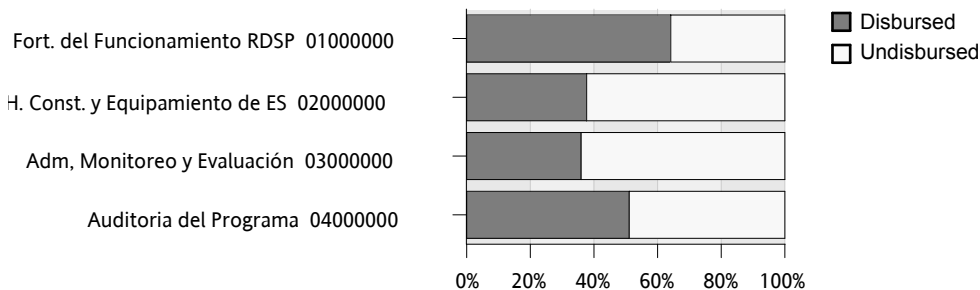

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Mortalidad materno infantil en el Departamento de Potosi reducida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Tasa de mortalidad infantil por 1000 NV	por 1000 NV	50.0	2003	P							30.00
					P(a)							30.00
					A				0.00			

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Demografia y Salud

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Razon de Mortalidad materna en el Departamento de Potosi	Razon	310.0	2008	P							100.00
					P(a)							100.00
					A				0.00			

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Demografia y Salud

**Observations:** Existe discrepancias entre las cifras de fuentes nacionales (Ministerio de Salud) e internacionales (OMS/OPS) para este indicador, siendo los internacionales en el rango de 350 - 400 para Potosí. Adicionalmente, es probable que en los primeros años de ejecución, se registrarán más muertes por mejoras en el registro.(2015, esta por publicarse un estudio específico sobre mortalidad materna a partir del levantamiento de información en puestos "Centinela")

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Tasa de Mortalidad neonatal	por 1000 NV	27.0	2003	P							0.00
					P(a)							11.18
					A				0.00			

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Demografia y Salud

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Cobertura de Parto Institucional	porcentaje	36.0	2010	P							55.00
					P(a)							55.00
					A				0.00	50.00		

#### Details

**Means of verification:** SNIS Departamental (Potosí)

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56.0	2010	P							80.00
					P(a)							80.00
					A				0.00			

#### Details

**Means of verification:** Registros hospitalarios

**Observations:** El proyecto deberá establecer un sistema de monitoreo específico para este indicador.

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10.0	2011	P							50.00
					P(a)							50.00
					A				0.00			

#### Details

**Means of verification:** Informes específicos del proyecto.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.4	Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número	0.0	2011	P							200.00
					P(a)							13.00
					A				0.00			

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

##### Details

**Means of verification:** Informes de Servicio Departamental de Salud, al final del proyecto se puede verificar con el Estudio de Brechas

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.5	Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Personas	50.0	2011	P						200.00
					P(a)						200.00
					A			0.00			

##### Details

**Means of verification:** Informe específico del proyecto.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.6	Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Beneficiaries (#)	1902.0	2013	P	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00
					P(a)	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00
					A		0.00	0.00	0.00		

##### Details

**Means of verification:** Registro del Bono Juana Azurduy

**Observations:** Se considerará al binomio Madre - Hijo que ha recibido atención al parto y atención post-parto

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

	Afro-descendant				P						
					P(a)						
					A						
	Boys				P						
					P(a)						
					A						
	Girls				P						
					P(a)						
					A						
	Indigenous				P						
					P(a)						

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

	Indigenous				A							
	Men				P							
					P(a)							
					A							
	Region				P							
					P(a)							
					A							
	Rural				P							
					P(a)							
					A							
	Urban				P							
					P(a)							
					A							
	Women				P							
					P(a)							
					A							
	Women-owned/led firms				P							
					P(a)							
					A							

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosi

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Diagnosticos del sector salud realizados.	Estudio	P		3		100,000
			P(a)		3	0	128,305.14
			A	0	3	0	128,305.14
1.2	Plan de promoción de salud implementado	Plan	P		1		1,018,000
			P(a)	0	1	480,780	511,066.79
			A	0	0	0	10,286.79
1.3	Obstetricas incorporadas al sistema de salud	Personas	P		30		210,000
			P(a)		30	180,812	486,147.83
			A	0	30	74,542	379,877.83
1.4	Personal de los centros de primer nivel capacitado	Personas	P		200		200,000
			P(a)	200	200	44,190	172,136.15
			A	0	0	0	77,946.15
1.5	Sistema de Comunicación de referencias y urgencias implementado	Sistema	P		1		500,000
			P(a)	0	1	1,455,679	1,628,371.77
			A	0	0	489,448	612,140.77
1.6	Protocolo de referencia y retorno elaborado y/o adecuado	Documento	P		1		75,000
			P(a)		1	0	5,002.48
			A	0	1	0	5,002.48
1.7	Unidad de transporte para referencias y urgencias incorporada	Unidad	P		1		450,000
			P(a)		1	0	311,846.22
			A	0	1	0	311,846.22
1.8	Estrategia de Gestión Institucional de la Red Departamental implementada	Estrategia	P		1		1,314,000
			P(a)	0	1	242,806	1,478,083.3
			A	0	0	0	1,235,277.3
1.9	Personas capacitadas en mantenimiento de equipo médico-industrial, gestión financiera-administrativa y/o gestión de infraestructura y personal	Personas	P		90	80,000	280,000
			P(a)	0	90	180,970	388,374.02
			A	0	0	0	207,404.02
1.10	Sistema de Gestión de Medicamentos implementado	Sistema	P		1		68,000
			P(a)	0	1	44,030	81,524.76
			A	0	0	0	37,494.76

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Inversiones en infraestructura y equipamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua diseñado	Hospital	P		1		310,000
			P(a)		1		452,429.71
			A	0	1	0	452,429.71
2.2	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua construido	Hospital	P		1	700,000	6,730,000
			P(a)	0	1	1,813,223.75	12,307,324.87
			A	0	0	72,337.03	3,313,543.16
2.3	Hospital "Madre Obrera" de Llalagua equipado	Hospital	P	1	1	2,106,000	2,106,000
			P(a)	0	1	0	1,362,867.55
			A	0	0	0	0
2.4	Hospital Ocuri construido	Hospital	P		1		4,200,000
			P(a)	0	1	935,750.72	6,048,545.33
			A	0	0	134,685.45	1,504,477.17
2.5	Hospital de Ocuri equipado	Hospital	P	1	1	1,180,000	1,180,000
			P(a)	0	1	0	1,105,118.79
			A	0	0	0	0
2.6	Hospitales de Ocuri y Llalagua operando	Hospital	P		2	4,220,000	4,220,000
			P(a)	0	2	0	4,220,000
			A	0	0	0	0
2.7	Centro de coordinación de urgencias construido	Centro	P		1		450,000
			P(a)		1	11,055.62	1,049,893.47
			A	0	1	0	1,038,837.85
2.8	Establecimientos de salud ampliados y/o remodelados	Establecimiento	P		1		2,800,000
			P(a)		7	217,523.46	2,777,825.04
			A	0	7	58,941.34	2,619,242.92
2.9	Establecimientos de salud construidos	Establecimiento	P	1	2		1,800,000
			P(a)	0	2	1,035,562.05	2,032,558.57
			A	0	1	33,172.18	910,158.78
2.10	Establecimientos de salud equipados	Establecimiento	P	1	8	5,707,185	8,549,185
			P(a)	4	11	1,108,293.64	2,106,427.52
			A	0	6	16,914.16	989,548.46

## Other Cost

Administración y/o fortalecimiento institucional FPS	P			2,239,815	2,674,815
	P(a)			214,602.93	2,047,009.35
	A			104,421.59	1,185,999.21
Administración y/o fortalecimiento institucional MSD y SEDES	P			80,000	740,000
	P(a)			250,000	1,007,705.46
	A			91,863	634,568.46
Auditorías	P			50,000	200,000
	P(a)			50,000	163,985.03
	A			38,218	102,203.03
Imprevistos	P			995,000	995,000
	P(a)				0
	A			0	0
Monitoreo y evaluación	P			1,100,000	1,100,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Monitoreo y evaluación	P(a)			96,197.79	397,450.85
		A			40,074	91,327.06

Total Cost

	Total Cost	P			18,458,000	42,270,000
		P(a)			8,361,476.96	42,270,000
		A			1,154,616.75	15,847,917.27



## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Hospital de Ocurí equipado	Modify Output	Se trata de un ajuste en el coste del producto por 0.08 centavos.	09/26/2017	09/27/2017
