

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1127	Chief of Operations Validation Date	10/12/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Strengthen. Provincial. Inst & Fiscal Managem. Stage II (PROFIP II)	Loan Number	2754/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL	Sector/Subsector	RM-DES - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Team Leader	REYES,JAVIER RAMIRO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1127	36,000,000	36,000,000	9,000,000	0	45,000,000	36,000,000	28,488,911.17	79.14%	7,511,088.83
Aggregated	36,000,000	36,000,000	9,000,000	0	45,000,000	36,000,000	28,488,911.17	79.14%	7,511,088.83

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

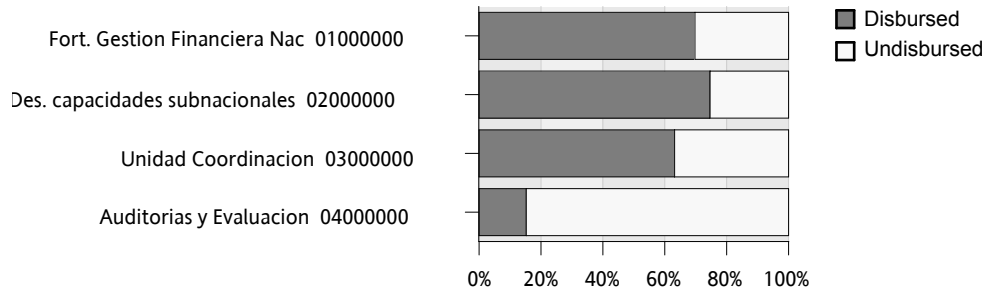

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Gestión pública orientada a resultados a nivel nacional y subnacional mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2018	EOP 2018
1.1	Puntaje del SEP- Pilar Gestión Financiera	Puntaje	3.3	2008	P	3.30		3.40
					P(a)	3.30		3.40
					A	3.40		

Details

Means of verification: Informes SEP- PRODEV ¿ próximas publicaciones previstas en 2012 y 2015

Observations: En Argentina el presupuesto está estructurado por programas. La Secretaría de Hacienda (SH) es el Órgano Rector (OR) en cuanto a gestión financiera, PxR y monitoreo y evaluación presupuestaria. El indicador considera a 3 pilares de los 5

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2018	EOP 2018
1.2	Puntaje del SEP- Pilar Presupuesto por Resultados	Puntaje	2.1	2008	P	2.20		2.60
					P(a)	2.20		2.60
					A	2.50		

Details

Means of verification: Informes SEP- PRODEV ¿ próximas publicaciones previstas en 2012 y 2015

Observations: En Argentina el presupuesto está estructurado por programas. La Secretaría de Hacienda (SH) es el Órgano Rector (OR) en cuanto a gestión financiera, PxR y monitoreo y evaluación presupuestaria. El indicador considera a 3 pilares de los 5

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2018	EOP 2018
1.3	Puntaje del SEP- Pilar Monitoreo y Evaluación	Puntaje	0.8	2008	P	1.40		2.00
					P(a)	1.40		2.00
					A	0.80		

Details

Means of verification: Informes SEP- PRODEV ¿ próximas publicaciones previstas en 2012 y 2015

Observations: En Argentina el presupuesto está estructurado por programas. La Secretaría de Hacienda (SH) es el Órgano Rector (OR) en cuanto a gestión financiera, PxR y monitoreo y evaluación presupuestaria. El indicador considera a 3 pilares de los 5

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Sistema público de gestión financiera y presupuestaria en las instituciones de la APN modernizado

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Número de programas presupuestarios de la APN con presupuesto primario gestionado en base a indicadores de resultado alineados con la programación presupuestaria	programas presupuestarios	16.0	2012	P	28.00	46.00	71.00	85.00		100.00
					P(a)	28.00	48.00	71.00	84.00	100.00	100.00
					A	36.00	48.00	73.00	81.00	0.00	

Details

Means of verification: Informes anuales de monitoreo de la SH

Observations: La SH realiza el seguimiento de categorías programáticas y/o proyectos de inversión que tienen metas físicas, mediante el Sistema de Seguimiento Físico. En 2010, este sistema cubrió el 66,3% de la cartera programática (265 programas sobre un total de 400).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Gasto primario de la APN administrado por el Sistema Integrado de Información Financiera internet (e-SIDIF) transaccional	% gasto primario	8.0	2012	P		30.00				100.00
					P(a)		30.00	0.00	100.00		100.00
					A		65.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Informes anuales de monitoreo de la SH

Observations: El e-SIDIF trabajará sobre un total de 109 organismos de la APN más los 40 órganos rectores.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Sistema financiero público renovado (presupuesto, tesorería, contabilidad, deuda). El sistema se llama e-SIDIF.	Systems	0.0	2015	P						
					P(a)			0.00	0.00		
					A		0.00	0.00	0.00		

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Gestión Pública orientada a resultados en las entidades públicas y/o mixtas sub-nacionales fortalecida

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Sub-índice de capacidad institucional del ICI	puntaje	0.24	2012	P	0.26	0.30	0.35	0.38	0.40	0.40

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	Sub-índice de capacidad institucional del ICI	puntaje	0.24	2012	P(a)	0.26	0.30	0.35	0.38	0.40		0.40
					A		0.32	0.37	0.37	0.00		
Details												
Means of verification: Informes anuales de seguimiento a la ejecución y metas del Programa elaborados por la UCEN												
Observations: La Línea de Base se construyó con el promedio de 34 proyectos evaluados al inicio del Programa. La meta será un promedio total de proyectos.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				
2.2	Atributo referido a las capacidades de gestión de políticas públicas orientadas a resultado a nivel sub-nacional (IGER)	puntaje	0.09	2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
					P			0.11				0.15
					P(a)			0.11	0.00	0.15		0.15
					A			0.12	0.00	0.00		
Details												
Means of verification: Informe de medición del IGER												
Observations: Atributo del IGER referido a gestión pública orientada a resultados sub-nacional. La LB se obtuvo como proxy, cubriendo 34 proyectos del PROFIP I. La meta se medirá en base a la totalidad de proyectos financiados con el PROFIP II												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la gestión presupuestaria y financiera gubernamental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Sistema e-SIDIF desplegado	sistema	P	1	1	1,624,560.3	16,754,446
			P(a)	1	1	4,028,001	15,894,081
			A	0	0	1,379,923	13,246,003
1.2	Herramientas y soluciones informáticas de PxR desarrolladas por los 4 ORs implementadas	Programas presupuestarios	P	15	84	300,445.69	4,245,554
			P(a)	19	100	1,006,821	4,303,654
			A	9	90	351,020	3,647,853

Component Nbr. 2 Fortalecimiento Institucional de la gestión pública sub-nacional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Proyectos de Desarrollo de la Capacidad Institucional implementados	proyectos	P	7	40	4,099,200	19,520,000
			P(a)	4	48	3,408,179	17,474,871
			A	4	48	1,170,653	15,237,345
2.2	Provincias beneficiadas con el programa	Government agencies (#)	P		0		0
			P(a)	0	19	0	0
			A	0	19	0	0

Other Cost

	Auditoría, Monitoreo y Evaluación e Imprevistos	P			225,656	940,000
		P(a)			44,239	89,137
		A			10,415	55,313
	Unidad Coordinadora	P			743,400	3,540,000
		P(a)			661,721	3,212,856
		A			269,084	2,820,219

Total Cost

	Total Cost	P			6,993,261.99	45,000,000
		P(a)			9,148,961	40,974,599
		A			3,181,095	35,006,733

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
