

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1053	Chief of Operations Validation Date	04/05/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/05/17
Last Update	04/05/17	Country Representative Validation Date	04/12/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for Social Reforms in Ceará - PROARES Phase II	Loan Number	2230/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL - STDS CEARA	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	OCHOA,FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1053	45,000,000	45,000,000	19,260,000	0	64,260,000	45,000,000	42,330,921.5	94.07%	2,669,078.5
Aggregated	45,000,000	45,000,000	19,260,000	0	64,260,000	45,000,000	42,330,921.5	94.07%	2,669,078.5

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

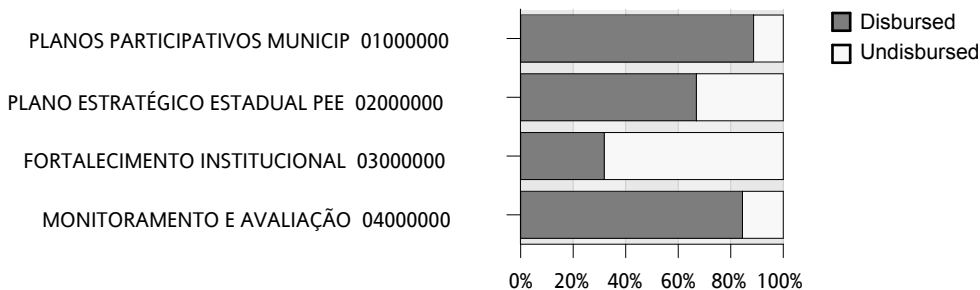

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Condiciones de vida de niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del Estado de Ceara mejoradas

Observation: El Banco y el gobierno estan negociando el modelo de evaluacion de impacto del Programa y muy posiblemente los indicadores estarán referidos a "desarrollo infantil temprano". La linea de base no ha sido recolectada hasta el momento. El atraso se debe a pr

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.1	Niños menores de cinco años con desnutrición crónica.	%		2010	P	
					P(a)	0.00
					A	

Details

Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento

Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.2	Niños con desarrollo motor adecuado para la edad	%		2010	P	
					P(a)	0.00
					A	

Details

Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento

Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.3	Niños con desarrollo social adecuado para la edad	%		2010	P	
					P(a)	0.00
					A	

Details

Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento

Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4	Niños con desarrollo lenguaje adecuado para la edad	%		2010	P	
					P(a)	0.00
					A	
Details						
Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento						
Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2017
1.5	Reincidencia de jovenes beneficiarios en conflictos con la ley en los ultimos 20 anos	%		2010	P	
					P(a)	0.00
					A	
Details						
Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento						
Observations: Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Cobertura de la red de servicios sociales orientada a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo ampliada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
1.1	Niños menores de 5 años inscritos en Centros de Educación Infantil (CEIS).	Children (#)		2011	P			
					P(a)			6,000.00
					A			4,065.00

Details

Means of verification: Sistema de Información del PROARES II.

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
1.2	Jóvenes atendidos en Cuadras o Centros Deportivos	numero		2011	P			
					P(a)			37,500.00
					A			20,500.00

Details

Means of verification: Sistema de Información del PROARES II.

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
1.3	Jóvenes atendidos en Polos de atención	numero		2011	P			
					P(a)			10,500.00
					A			6,000.00

Details

Means of verification: Sistema de Información del PROARES II.

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Calidad de los servicios de atención a los jóvenes beneficiarios mejorada

Observation:

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2016	2017	EOP 2017
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year				
2.1	Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de asesoria juridica	numero		2012	P			
					P(a)			0.00
					A			

Details

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
2.2	Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de capacitacion profesional	numero	2012	P			
				P(a)			0.00
				A			

Details

Observations: Os indicadores estão previstos de serem definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID. Projeto Piloto (sem meta do FDP)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
2.3	Valores, conocimientos y actitudes en adolescentes en conflicto con la ley	%	2012	P			
				P(a)			0.00
				A			

Details

Means of verification: Evaluacion cualitativa

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
2.4	Satisfaccion de los jovenes beneficiarios en el uso de instalaciones del programa	%	2012	P			
				P(a)			0.00
				A			

Details

Means of verification: Evaluacion cualitativa

Observations: Será realizada a pesquisa para identificar os níveis de satisfação e re inserção dos jovens em conflito com a Lei. Os indicadores estão previstos de serem definidos na Avaliação de

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Impacto, que esta sendo coordenada com o BID.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Capacidad institucional de municipios y la Secretaria de Trabajo y Desarrollo Social (STDS) en gestion y prestación de servicios sociales mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
3.1	Beneficiarios con conocimiento del Programa	%		2012	P			
					P(a)			80.00
					A			

Details

Means of verification: resultados levantamiento linea basal y seguimiento

Observations: Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID. A partir do plano de comunicação

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
3.2	Politica Estadual para acciones socioeducativas.	1		2012	P			1.00
					P(a)			1.00
					A			

Details

Observations: Plano Sócio Educativo elaborado em fase final de revisão.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	EOP 2017
3.3	Servicios sociales del Programa funcionando de acuerdo a guias y manuales.	%		2012	P			80.00
					P(a)			80.00
					A			

Details

Means of verification: Sistema de informacion del PROARES II

Observations: Manuais elaborados e não publicados.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Planes Participativos Municipales.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	Centros de Educación Infantil (CEIS) construidos y rehabilitados.	Centros	P		54		15,300,000
			P(a)	6	53	5,499,453.25	11,048,040.34
			A	3	51	673,490.59	10,474,037.34
1.2	Quadras y Centros Esportivos implantados.	quadras y centros	P		49		13,740,000
			P(a)		58	3,643,620.36	11,313,144.14
			A	3	54	422,544.5	10,518,924.14
1.3	Polos de Atención construido.	Polos de Atención	P		21		8,145,000
			P(a)		21	3,260,832.76	5,739,972.51
			A	1	20	622,093.77	5,506,261.01
1.4	Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) construidos.	Centros CRAS	P		41		6,152,000
			P(a)		41	1,265,520.33	6,219,683.11
			A	3	37	416,650.44	5,303,130.11
1.5	Bibliotecas implantadas.	Bibliotecas	P		4		856,000
			P(a)	2	4		861,757.7
			A	1	3	123,665.04	795,060.2

Component Nbr. 2 Plano Estratégico Estadual.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	Unidades de rehabilitacion social de jovenes construídas.	centros de rehabilitación	P		2		5,879,000
			P(a)		2	752,000	7,898,977.31
			A		2	0	7,898,977.31
2.2	Capacitación p/profissionais de centros de rehabilitacion realizadas.	capacitaciones	P		10		680,000
			P(a)		25		1,182,254.75
			A	1	24	125,799.86	1,157,707.71
2.3	Proyectos pilotos de insercion laboral de jovenes implementados.	proyectos	P		2		480,000
			P(a)	1	2	247,000	1,490,784.01
			A	1	1	1,001,166.01	1,087,612.01
2.4	Unidades de la Red socioeducativa informatizada.	Unidades	P		15		306,000
			P(a)		19		660,540
			A	2	19	233,068	660,540

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento institucional.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
3.1	Dirigentes y tecnicos del sistema de protección social do Ceará formados.	técnicos	P		60		450,000
			P(a)		160	116,000	452,956.65
			A	40	160	35,956.65	452,956.65
3.2	Capacitación en Planificación Participativa realizados.	capacitaciones	P		3		261,000
			P(a)		4		494,521
			A	1	4	218,597	494,521
3.3	Capacitación para la Gerencia de los Servicios Sociales realizadas.	capacitaciones	P		3		340,000
			P(a)		7	74,000	233,519.54
			A		7	0	233,519.54
3.4	Planes de Comunicación Social desarrollados y incrementados.	Planos	P		1		1,000,000
			P(a)		2	600,000	635,841.07
			A	1	1	234,880.31	234,880.31

Component Nbr. 4 Monitoreo y Evaluacion.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
4.1	Estudios y investigaciones realizados.	estudios	P		4		425,000
			P(a)		3		426,000
			A		2		123,000
4.2	Evaluación Intermedia realizada.	evaluaciones	P		1		700,000
			P(a)		1		23,000
			A		1		23,000
4.3	Evaluación Final realizada.	evaluaciones	P		1		700,000
			P(a)		1	100,000	100,000
			A		0	0	0
4.4	Sistema Informático de Monitoreo descentralizado implementado	sistema	P		1		270,000
			P(a)		4	75,000	297,951.81
			A	1	3	32,710.16	204,951.81

Other Cost

Administración y Auditoria.	P				3,907,000
	P(a)			184,784.08	4,995,151.52
	A			74,332.55	4,531,767.91
Contingencia.	P				1,572,000
	P(a)				0
	A				0
Costos Financieros.	P				3,097,000
	P(a)			380,082.35	3,077,496.07
	A			714,762.37	2,553,344.07

Total Cost

Total Cost	P				64,260,000
	P(a)			16,198,293.13	57,151,591.53
	A			4,929,717.25	52,254,191.12

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Dirigentes y tecnicos del sistema de protección social do Ceará formados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Capacitación para la Gerencia de los Servicios Sociales realizadas.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Capacitación p/profissionais de centros de rehabilitacion realizadas.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Capacitación p/profissionais de centros de rehabilitacion realizadas.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Quadras y Centros Esportivos implantados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Quadras y Centros Esportivos implantados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Evaluación Intermedia realizada.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Planes de Comunicación Social desarrollados y incrementados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Capacitación en Planificacion Participativa realizados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Polos de Atención construido.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Capacitación para la Gerencia de los Servicios Sociales realizadas.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Bibliotecas implantadas.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Unidades de la Red socioeducativa informatizada.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) construidos.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Evaluación Final realizada.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Unidades de rehabilitacion social de jovenes construidas.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Dirigentes y tecnicos del sistema de protección social do Ceará formados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Planes de Comunicación Social desarrollados y incrementados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Proyectos pilotos de insercion laboral de jovenes implementados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Unidades de la Red socioeducativa informatizada.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Capacitación en Planificacion Participativa realizados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Proyectos pilotos de insercion laboral de jovenes implementados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Estudios y investigaciones realizados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Centros de Educación Infantil (CEIS) construidos y rehabilitados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Sistema Informático de Monitoreo descentralizado implementado	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/13/2017	03/10/2017
Output	Centros de Educación Infantil (CEIS) construidos y rehabilitados.	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Sistema Informático de Monitoreo descentralizado implementado	Modify Output	Replanificação dos anos futuros de acordo com o que foi realizado até dezembro de 2016.	03/10/2017	03/10/2017
