

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1145	Chief of Operations Validation Date	10/12/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/22/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	MSME Competitiveness Support Program	Loan Number	2923/OC-AR
Executing Agency	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION	Sector/Subsector	PS-EMP - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
Team Leader	CASABURI,GABRIEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1145	50,000,000	50,000,000	30,000,000	0	80,000,000	50,000,000	18,562,659	37.13%	31,437,341
Aggregated	50,000,000	50,000,000	30,000,000	0	80,000,000	50,000,000	18,562,659	37.13%	31,437,341

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

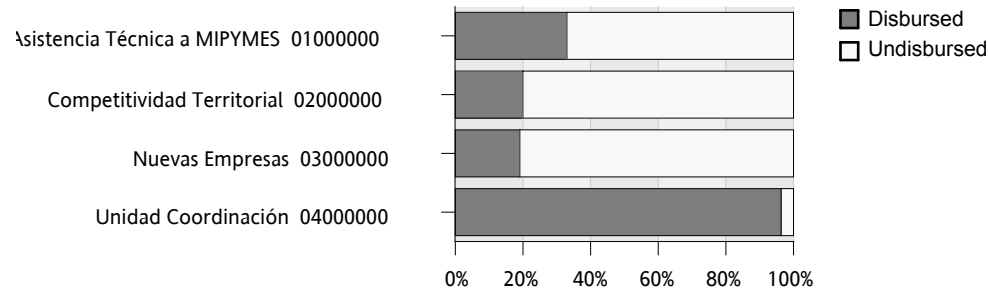

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Productividad de las MIPYMES mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.1	Diferencia en el cambio porcentual de la productividad total de los factores entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	P	3.00
					P(a)	3.00
					A	

Details

Means of verification: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros

Observations: Línea de base a construir

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.2	Diferencia en el cambio porcentual en el empleo entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	P	2.00
					P(a)	2.00
					A	

Details

Means of verification: Base de datos del sistema de monitoreo y evaluación del programa, entre otros

Observations: Línea de base a construir

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.3	Diferencia en el cambio porcentual de facturación entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas	Variacion %		2013	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	

Details

Means of verification: Encuesta a empresas participantes en el programa y al grupo de control, entre otros.

Observations: Línea de base a construir

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumento en la inversión de las MIPYMES en servicios de desarrollo empresarial

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	EOP 2019
1.1	Porcentaje de MIPYMES que invierten en SDE (Diferencia con un grupo de control)	Puntos porcentuales	70.0	2012	P			55.00
					P(a)			55.00
					A			

Details

Means of verification: Encuesta con empresarios y bases de datos de la SEPYME y del PACC, al principio del programa y al final

Observations: Unidad de Medida: Puntos porcentuales de diferencia entre el porcentaje de MIPYMES beneficiarias que compran SDE y el porcentaje de no beneficiarias que también lo hacen

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Acceso a servicios de desarrollo empresarial de empresas de aglomerados productivos aumentado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	EOP 2019
2.1	Número de acciones colectivas de compra de SDE o de mejora de su provisión colectiva territorial	Numero de acciones	0.0	2013	P	4.00		10.00
					P(a)	4.00		10.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Informes de avance del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Aumento en el número de empresas creadas y consolidadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	EOP 2019
3.1	Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas creadas con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control	Diferencia %	0.0	2012	P			15.00
					P(a)			15.00
					A			

Details

Means of verification: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros

Observations: Unidad de Medida: Diferencia porcentual de la tasa de supervivencia entre las empresas del programa y las del grupo control

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 4: Aumento del porcentaje de mujeres beneficiarias del programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	EOP 2019
4.1	Porcentaje de mujeres titulares de empresas beneficiarias del programa aumentado	Aumento %	18.0	2012	P	2.00		5.00
					P(a)	2.00		5.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Informes de avance del programa

Observations: Línea de base: Empresas existentes 18% - Emprendedores: 27%

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 5: Aumento de la participación de empresas de provincias del Norte Grande como beneficiarios del programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2019	EOP 2019
5.1	Porcentaje de empresas beneficiarias de las Provincias del Norte Grande (NG) sobre el total de las empresas beneficiarias aumentado	Aumento %	5.0	2012	P			6.50
					P(a)			6.50
					A			

Details

Means of verification: Informes de avance del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Asistencia Técnica a MIPYMES

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Empresas asistidas técnicamente (supone haber finalizado al menos una actividad)	Micro / small / medium enterprises (#)	P	500	1,500	10,000,000	37,600,000
			P(a)	500	1,767	10,000,000	37,600,000
			A	224	1,011	3,095,447	11,305,447

Component Nbr. 2 Articulación Productiva y Competitividad Territorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Aglomerados maduros asistidos (supone haber finalizado al menos una actividad)	Número de aglomerados	P	2	7	3,000,000	11,100,000
			P(a)	2	7	5,792,000	11,100,203
			A	2	6	100,773	3,006,976
2.2	Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Número de aglomerados	P	2	9	800,000	3,600,000
			P(a)	4	13	970,000	3,599,797
			A	7	15	372,660	753,457
2.3	Instituciones de la Plataforma Territorial Asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Instituciones	P	7	20	600,000	1,640,000
			P(a)	10	10	600,000	1,640,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Apoyo a Nuevas Empresas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
3.1	Emprendedores y empresas jóvenes asistidas (supone que la UE haya aprobado la primera rendición del proyecto)	Número de emprendedores y empresas jóvenes	P	100	400	3,300,000	12,000,000
			P(a)	100	464	3,887,000	12,000,000
			A	59	263	1,622,413	4,366,413
3.2	Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Número de acciones	P	7	30	400,000	1,710,000
			P(a)	7	27	547,000	1,710,000
			A	1	11	253,067	636,067
3.3	Número de Instituciones especializadas asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Instituciones	P	7	25	1,100,000	3,900,000
			P(a)	20	25	2,350,000	3,900,000
			A	1	6	93,782	573,782
3.4	Talleres y otras acciones de fomento del rol de la mujer emprendedora realizadas	Número de actividades	P	2	9	100,000	450,000
			P(a)	2	5	100,000	450,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración	P			1,600,000	8,000,000
		P(a)			2,124,000	8,000,000
		A			302,798	1,596,798

Total Cost

	Total Cost	P			20,900,000	80,000,000
		P(a)			26,370,000	80,000,000
		A			5,840,940	22,238,940

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Modify Output	De acuerdo con la replanificación enviada en el informe semestral ene-jun 2017.	09/04/2017	09/01/2017
Output	Número de Instituciones especializadas asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Modify Output	De acuerdo con la replanificación enviada en el informe semestral ene-jun 2017.	09/04/2017	09/01/2017
Output	Aglomerados maduros asistidos (supone haber finalizado al menos una actividad)	Modify Output	De acuerdo con la replanificación enviada en el informe semestral ene-jun 2017.	09/04/2017	09/01/2017
Output	Instituciones de la Plataforma Territorial Asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Modify Output	De acuerdo con la replanificación enviada en el informe semestral ene-jun 2017.	09/04/2017	09/01/2017
