



Operation Number: **GU0177**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/1/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/14/2015**
Division Chief validation date: **05/05/2015**
Country Representative validation date: **05/12/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Operation name: | Project to Support the Penal Justice Sector | Loan Number: | 1905/OC-GU,1905/OC-GU-1,1905/OC-GU-2,1905/OC-GU-3,1905/OC-GU-4,1905/OC-GU-5 |
| Executing Agency (EA): | SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ ,SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ ,ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEMALA ,Ministerio Público ,Instituto de la Defensa Pública Penal ,MINISTERIO DE GOBERNACION, GUATEMALA | | |
| Team Leader: | Santa Maria,Benjamin R. | Sector/Subsector: | MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE |
| Operation Type: | Loan Operation | Overall Stage: | Disbursing (From eligibility until all the loans are closed). |
| Lending Instrument: | Investment Loan | Country: | GUATEMALA |
| Borrower: | REPUBLICA DE GUATEMALA | Convergence related Operation(s): | |

Total Cost and Source

| | Original IDB | Current Active IDB | Local Counterpart | Co-Financing/Country | Total operation cost - Original Estimate |
|--------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| GU0177 | \$30,000,000.00 | \$30,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,170,020.00 |

Available Funds (US\$)

| | Current IDB | Disb. Amount to Date | % Disbursed | Undisbursed Balance |
|--------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|
| GU0177 | \$30,000,000.00 | \$6,357,677.52 | 21.19% | \$23,642,322.48 |


Environmental and Social Safeguards

| | |
|---|---|
| Main Operation | |
| Impacts Category: | C |
| Safeguard Performance Rating: | |
| Safeguard Performance Rating - Rationale: | |

Reformulation Information

| | |
|---|----|
| Main Operation | |
| Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? | NO |
| Date of approval: | |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

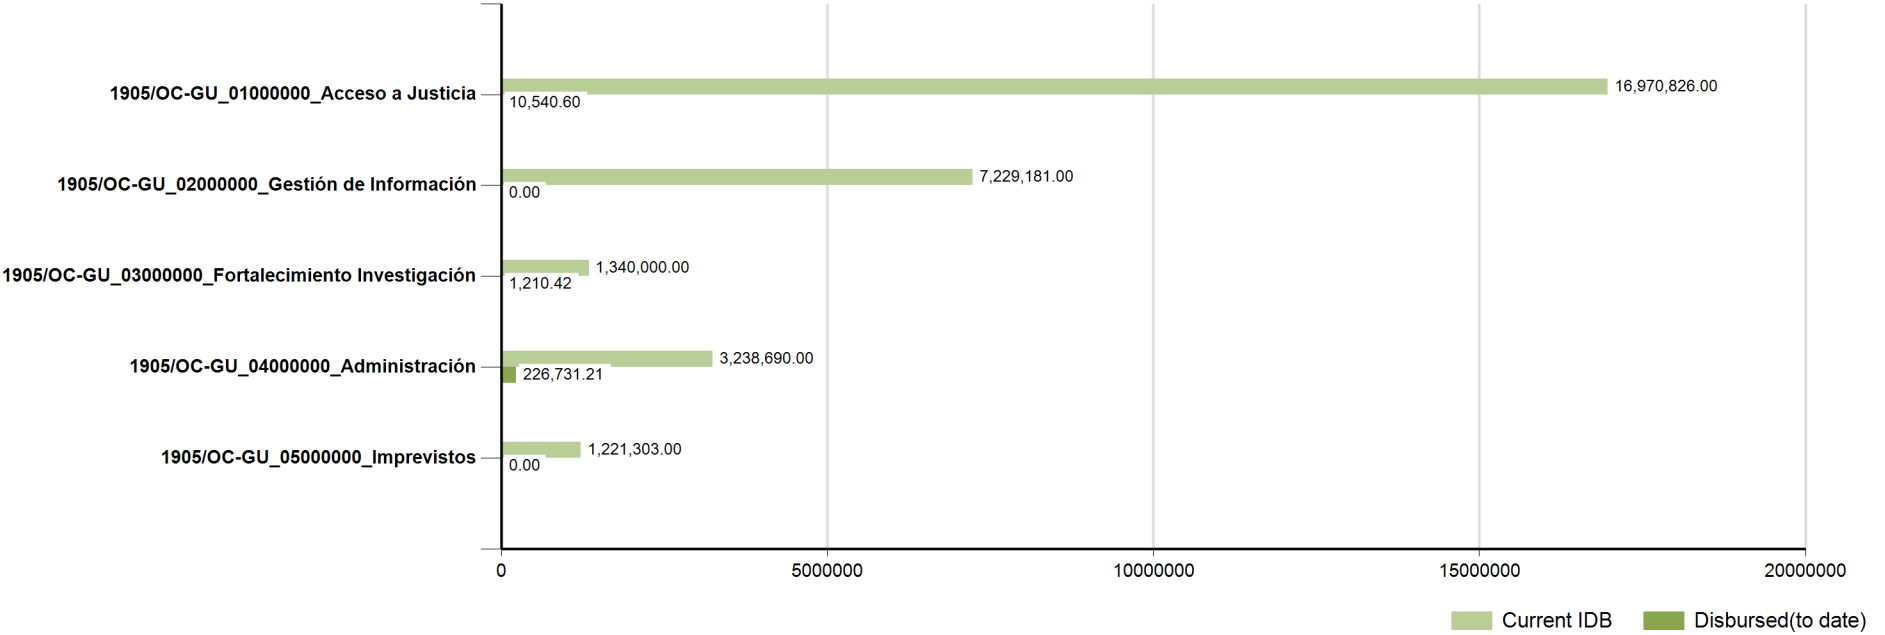

Results Matrix

Impacts

| Impact: | 1 Estado de Derecho fortalecido, a través de la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración de justicia penal. | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------|---------------|--|--|------|-------|
| Observation: | Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014: "Contribuir en el fortalecimiento del Estado de Derecho, a través de la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración de justicia pen | | | | | | | |
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | EOP | |
| 1.2 Aumentada en 10% la satisfacción de la población con respecto a los servicios de justicia en el área de influencia del programa. | | % | 0.00 | 2015 | 1. Estudio de Percepcion del sistema de justicia penal (encuesta piloto y grupos de enfoque de victimas, sentenciados y operadores); 2. Ventanilla de quejas, reclamos y satisfacción del servicio de los CIJP. | Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014 | P | 10.00 |
| | | | | | | | P(a) | 10.00 |
| | | | | | | | A | |

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

| Outcome: | 1 Aumentado el acceso, eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal. | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------|---------------|---|--|-------|------|
| Observation: | Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014 | | | | | | | |
| Indicators | Flags* | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification | Observations | EOP | |
| 1.0 Aumentada un 10% la cobertura poblacional de los servicios de justicia en el area de influencia del programa | | % | 0.00 | 2014 | 1. Estadísticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestión, informes de consultorías de evaluación de resultados y avances | Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014 | P | |
| | P(a) | | | | | | 10.00 | |
| | A | | | | | | | |
| Disaggregation Categories | | | | | | | EOP | |
| Jueces X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 1 a 23; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala] | | | | | | | P | |
| | | | | | | | P(a) | 1.10 |
| | | | | | | | A | |
| Disaggregation Categories | | | | | | | EOP | |

| Disaggregation Categories | | EOP |
|---|------|------|
| Jueces X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 1 a 23; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala] | P | |
| | P(a) | 1.10 |
| | A | |
| Disaggregation Categories | | EOP |

| | | |
|--|-------------|------------|
| Defensores Publicos X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 1 a 4; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala] | P | |
| | P(a) | 1.10 |
| | A | |
| Disaggregation Categories | | EOP |
| Ministerios Publicos X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 2 a 109; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala] | P | |
| | P(a) | 2.20 |
| | A | |
| Disaggregation Categories | | EOP |
| Policias de investigacion X 100,000 habitantes [la densidad actual esta en el rango de 2 a 75; este ultimo dato para la ciudad de Guatemala] | P | |
| | P(a) | 2.20 |
| | A | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------|------|--|--|-------------|------------|
| 1.1 Aumentado un 10% el numero de casos por tipo de delito que ingresan en el sistema de justicia penal segun perfil socioeconomico de las victimas e imputado (genero, edad, ocupacion y escolaridad) | | % | 130,794.00 | 2014 | 1. Estadisticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestion, informes de consultoria s de evaluacion de resultados y avances | Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014 | P | |
| | | | | | | | P(a) | 143,873.00 |
| | | | | | | | A | |
| 1.2 Disminuida a 24 horas la duracion en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaracion ante el juez competente en los centros integrados de justicia penal (CIJP) [La linea de base es 30 dias promedio, equivalente a 720 horas] | | Horas | 720.00 | 2014 | 1. Estadisticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestion, informes de consultoria s de evaluacion de resultados y avances | Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014 | P | |
| | | | | | | | P(a) | 24.00 |
| | | | | | | | A | |
| 1.3 Aumentado un 10% el numero de investigaciones abiertas por casos de homicidios y numero de investigaciones terminadas por casos de homicidios | | % | 42.00 | 2014 | 1. Estadisticas oficiales del sector justicia; 2. Informes del sistema de gestion, informes de consultoria s de evaluacion de resultados y avances | Cambios parciales acordados en Ayuda-Memoria del 24 de abril de 2014 | P | |
| | | | | | | | P(a) | 46.20 |
| | | | | | | | A | |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

| Acceso a la Justicia. | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
|--|---|-------------------|------|-------|--------------------|--------------|---------------|
| Outputs | Unit of Measure | 2014 | | EOP | 2014 | | EOP |
| Incrementado el acceso a la Justicia en cabeceras departamentales a través de la creación de centros integrados de justicia penal; sedes regionales de la defensa penal; juzgados de paz remodelados; comisarías tipo; estaciones o subestaciones; y fiscalías. [Línea de base: 5 centros de justicia ; 0 regionales del IDPP; 270 comisarías; 57 fiscalías distritales; y 24 remodelaciones de juzgados de paz] | Centros/Sedes/Juzgados/Comisarias/Fiscalías | P | 0.00 | 13.00 | P | 4,000,000.00 | 6,324,826.00 |
| | | P(a) | 0.00 | 30.00 | P(a) | 2,284,700.00 | 14,686,126.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| Sedes regionales de la defensa penal construidos. | Sedes regionales | P | 0.00 | 5.00 | P | 3,000,000.00 | 3,646,000.00 |
| | | P(a) | 0.00 | 0.00 | P(a) | 0.00 | 0.00 |
| | | A | | | A | | |
| Juzgados de Paz remodelados. | Juzgados de Paz | P | 0.00 | 15.00 | P | 446,000.00 | 2,355,000.00 |
| | | P(a) | 0.00 | 0.00 | P(a) | 0.00 | 0.00 |
| | | A | | | A | | |
| Comisarías Tipo Construidas. | Comisarías tipo | P | 0.00 | 5.00 | P | 500,000.00 | 2,103,000.00 |
| | | P(a) | 0.00 | 0.00 | P(a) | 0.00 | 0.00 |
| | | A | | | A | | |
| Fiscalías construidas. | Fiscalías | P | 0.00 | 5.00 | P | 500,000.00 | 2,267,000.00 |
| | | P(a) | 0.00 | 0.00 | P(a) | 0.00 | 0.00 |
| | | A | | | A | | |
| Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
| Outputs | Unit of Measure | 2014 | | EOP | 2014 | | EOP |
| Sistema de información interconectado y alimentado por todas las instituciones participantes [4 coejecutores] con datos homogéneos y confiables para instrumentar el necesario control de gestión de la función pública en el sector, y generar estadísticas confiables. | Sistema de Gestión | P | 0.00 | 1.00 | P | 1,525,000.00 | 7,179,181.00 |
| | | P(a) | 0.00 | 1.00 | P(a) | 4,022,240.00 | 3,442,180.25 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 235,239.25 | 235,239.25 |
| Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica. | | Physical Progress | | | Financial Progress | | |
| Outputs | Unit of Measure | 2014 | | EOP | 2014 | | EOP |
| Fortalecidas las capacidades técnicas y de investigación científica, y de organización y coordinación en las instituciones participantes. | Programa | P | 1.00 | 1.00 | P | 140,000.00 | 343,540.00 |
| | | P(a) | | 1.00 | P(a) | | 1,340,000.00 |
| | | A | 0.00 | 0.00 | A | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba. | Equipo | P | 0.00 | 1.00 | P | | 401,460.00 |
| | | P(a) | 0.00 | 0.00 | P(a) | | |
| | | A | | | A | | |
| Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas. | Unidades de trabajo | P | 1.00 | 1.00 | P | 69,000.00 | 238,540.00 |
| | | P(a) | 0.00 | 0.00 | P(a) | 0.00 | 0.00 |
| | | A | | | A | | |
| Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba. | Protocolo forense | P | 1.00 | 1.00 | P | 50,000.00 | 226,460.00 |
| | | P(a) | 0.00 | 0.00 | P(a) | 0.00 | 0.00 |
| | | A | | | A | | |
| Gestión del Programa | | | | | | | |

| Other Cost | | 2014 | Cost |
|----------------|------|-----------------|-----------------|
| Administración | P | \$900,000.00 | \$2,838,690.00 |
| | P(a) | \$238,690.00 | \$3,287,010.35 |
| | A | \$287,010.35 | \$287,010.35 |
| Imprevistos | P | \$635,000.00 | \$1,221,303.00 |
| | P(a) | | \$1,221,303.00 |
| | A | | \$0.00 |
| Total Cost | | 2014 | Total Cost |
| | P | \$11,765,000.00 | \$29,145,000.00 |
| | P(a) | \$6,545,630.00 | \$14,473,321.60 |
| | A | \$522,249.60 | \$522,249.60 |

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
