



Operation Number: **UR-L1016**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/20/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/20/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support for Agricultural Public Management	Loan Number:	2182/OC-UR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA		
Team Leader:	Hintze,Luis Hernando	Sector/Subsector:	AG
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	URUGUAY
Borrower:	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
UR-L1016	\$10,500,000.00	\$10,500,000.00	\$500,000.00		\$11,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
UR-L1016	\$10,500,000.00	\$10,499,644.40	100.00%	\$355.60


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

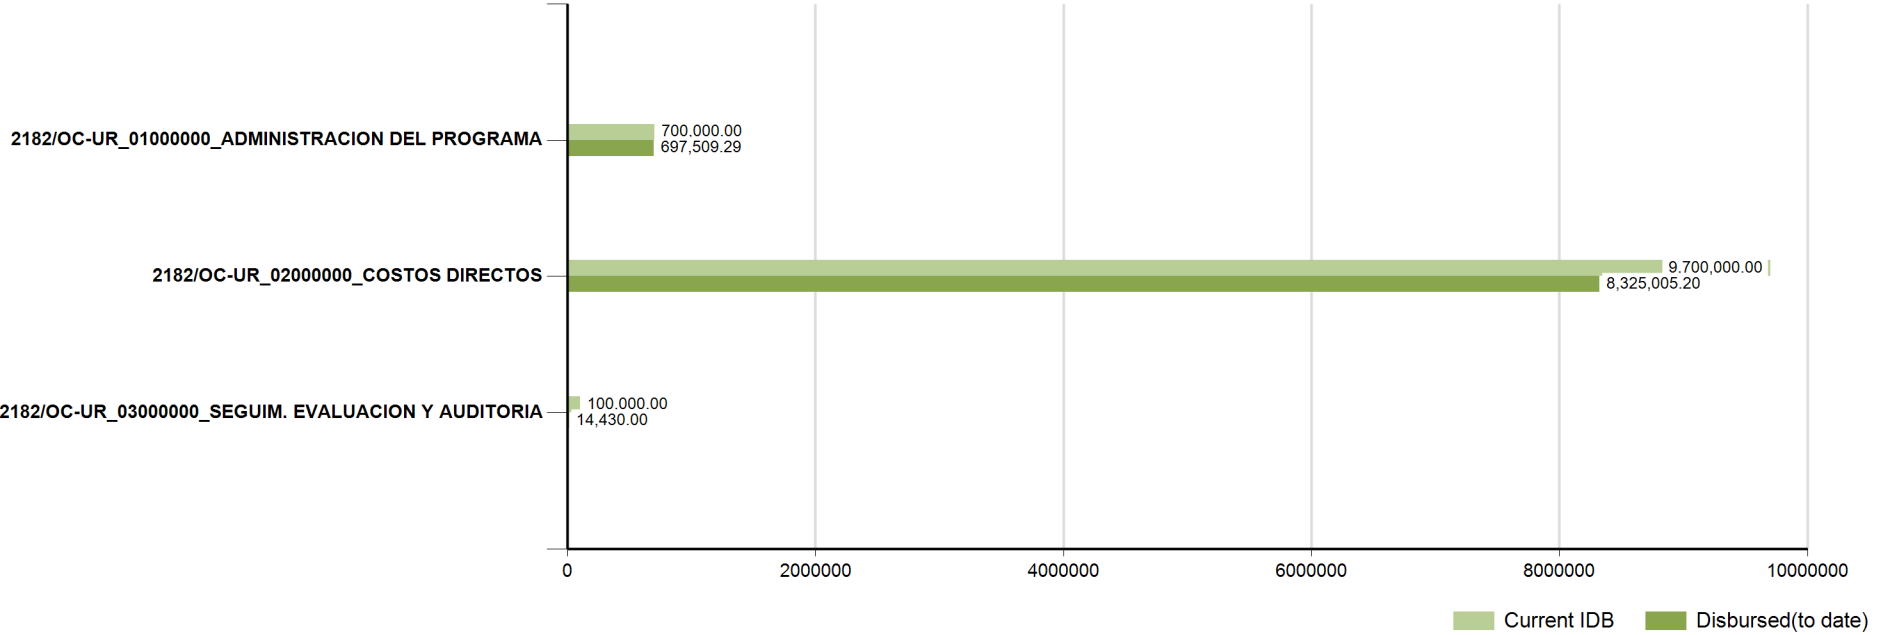

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mejorar la competitividad del secotr agropecuario del país, para garantizar la seguridad alimentaria y mantener y ampliar los mercados de exportación							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Productividad agropecuaria incrementada		% aumento	0.00	2010	DIEA - FAOSTAT		P	
							P(a)	5.00
							A	
1.2 Volumen de exportaciones		% aumento	0.00	2010	Banco Central		P	
							P(a)	10.00
							A	
1.3 Valor de las exportaciones		% aumento	0.00	2010	Banco Central		P	
							P(a)	5.00
							A	

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mejorada
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
1.1 Tiempo de respuesta a 5 trámites prioritarios		días	5.00	2010	registros administrativos del MSGP	Las líneas de base requieren ser calculadas para considerar todos los procesos que se estarán optimizando por intervención del Programa. Considerando que la línea de base no fue levantada en su momento, se incluirá como una actividad de la evaluación final la búsqueda de información que permita evaluar lo alcanzado respecto a este resultado.	P	
	P(a)						0.00	
	A						1.40	
1.2 Sistema de gestión del MGAP basado en prioridades, estrategias y resultados		sistema	0.00	2010	medición ad-hoc	En la línea de base el Sistema de gestión se basaba en la ejecución de actividades	P	
	P(a)						1.00	
	A						1.00	
Outcome:	2 Gestión de los servicios sanitarios adecuada a estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el área de barreras sanitarias y servicios de laboratorio							

Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Competencia de los paraprofesionales de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)		indice	3.00	2008	Auditoría independiente	Metodología DVE, PVS o similar - Organización Mundial de Sanidad Animal OEI	P	4.00
							P(a)	4.00
							A	3.00
2.2 Recursos Físicos de la DGSG		indice	4.00	2008	Auditoría independiente	Metodología DVE, PVS o similar - Organización Mundial de Sanidad Animal OEI	P	5.00
							P(a)	5.00
							A	4.00
2.3 Calidad de Laboratorios de la DGSG		indice	4.00	2008	Auditoría independiente	Metodología DVE, PVS o similar - Organización Mundial de Sanidad Animal OEI	P	5.00
							P(a)	5.00
							A	3.00
2.4 Comunicación de la DGSG		indice	4.00	2008	Auditoría independiente	Metodología DVE, PVS o similar - Organización Mundial de Sanidad Animal OEI	P	5.00
							P(a)	5.00
							A	4.00
2.5 Medidas sanitarias y procedimientos aplicados científicamente en la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)		%	50.00	2006	Auditoría independiente	Medición del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)	P	60.00
							P(a)	60.00
							A	60.00

2.6 Actualización de Recursos Humanos de la DGSA		%	25.00	2006	Auditoría independie nte	Medició n del Instituto Interame ricano de Coopera ción para Agricultu ra (IICA)	P	50.00
							P(a)	50.00
							A	50.00
2.7 Difusión oportuna sobre programas sanitarios de la DGSA		%	50.00	2006	Auditoría independie nte	Medició n del Instituto Interame ricano de Coopera ción para Agricultu ra (IICA)	P	60.00
							P(a)	60.00
							A	50.00
2.8 Servicios y procesos certificados de la DGSA		%	50.00	2006	Auditoría independie nte	Medició n del Instituto Interame ricano de Coopera ción para Agricultu ra (IICA)	P	75.00
							P(a)	75.00
							A	75.00



RF - Contribution



RF - Alignment



RF - Strategic Alignment



RF - Strategic Alignment during Execution



SI - Sector Indicator



CI - Country Indicator



PG - Pro-Gender



PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento de la gestión institucional del MGAP		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	2016	EOP	2016	EOP
Herramienta de Gestión del Plan estratégico del MGAP implementada	herramienta de gestión	P	1.00	P	178,167.00
		P(a)	1.00	P(a)	329,519.98
		A	0.50	A	209,883.5
Plan director del sitema de información, informática y telecomunicaciones implementado	plan	P	1.00	P	1,930,139.00
		P(a)	1.00	P(a)	502,837.48
		A	0.50	A	50,050.48
Estrategia de recursos humanos implementada	estrategia	P	1.00	P	118,778.00
		P(a)	1.00	P(a)	131,793.40
		A	0.50	A	116,190.68
Oficinas departamentales adecuadas al nuevo modelo de gestión, con ventanilla única y procesos TICs	oficinas	P	19.00	P	3,031,594.00
		P(a)	10.00	P(a)	126,970.62
		A	10.00	A	101,414.88
Estrategia de comunicación y difusión del MGAP implementada	estrategia	P	1.00	P	98,981.00
		P(a)	1.00	P(a)	26,136.26
		A	1.00	A	25,797.38
Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	2016	EOP	2016	EOP
Plan estratégico de inocuidad de alimentos con mecanismo de seguimiento y evaluación implementado	plan	P	1.00	P	210,000.00
		P(a)	0.05	P(a)	22,950.60
		A	0.00	A	0.00
Sistema de gestión de barreras sanitarias diseñado e implementado	sistema	P	1.00	P	1,415,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	3,500.00
		A	0.70	A	11,713.00
Plan director de laboratorios diseñado e implementado en su primera etapa	plan	P	1.00	P	2,975,000.00
		P(a)	0.00	P(a)	541,097.04
		A	1.00	A	273,450.14
Costos financieros y de administración					

Other Cost		2016	Cost
Administración del programa	P		\$874,029.00
	P(a)	\$55,137.71	\$843,881.87
	A	\$53,684.91	\$842,429.07
Seguimiento, evaluación y auditoría	P		\$100,000.00
	P(a)	\$25,000.00	\$39,430.00
	A	\$0.00	\$14,430.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P		\$10,931,688.00
	P(a)	\$1,277,493.45	\$10,673,522.43
	A	\$490,313.41	\$9,886,342.39

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
