



Operation Number: **EC-L1071**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/17/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/17/2015**
Division Chief validation date: **04/30/2015**
Country Representative validation date: **05/08/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	National System for Rural Land Information and Management and Technology Infrast		Loan Number:	2461/OC-EC
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA			
Team Leader:	Inurritegui Maurtua,Marisol	Sector/Subsector:	LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT	
Operation Type:	Loan Operation		Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan		Country:	ECUADOR
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
EC-L1071	\$90,000,000.00	\$90,000,000.00	\$38,000,000.00	\$0.00	\$128,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
EC-L1071	\$90,000,000.00	\$62,246,997.40	69.16%	\$27,753,002.60


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	Satisfactory

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

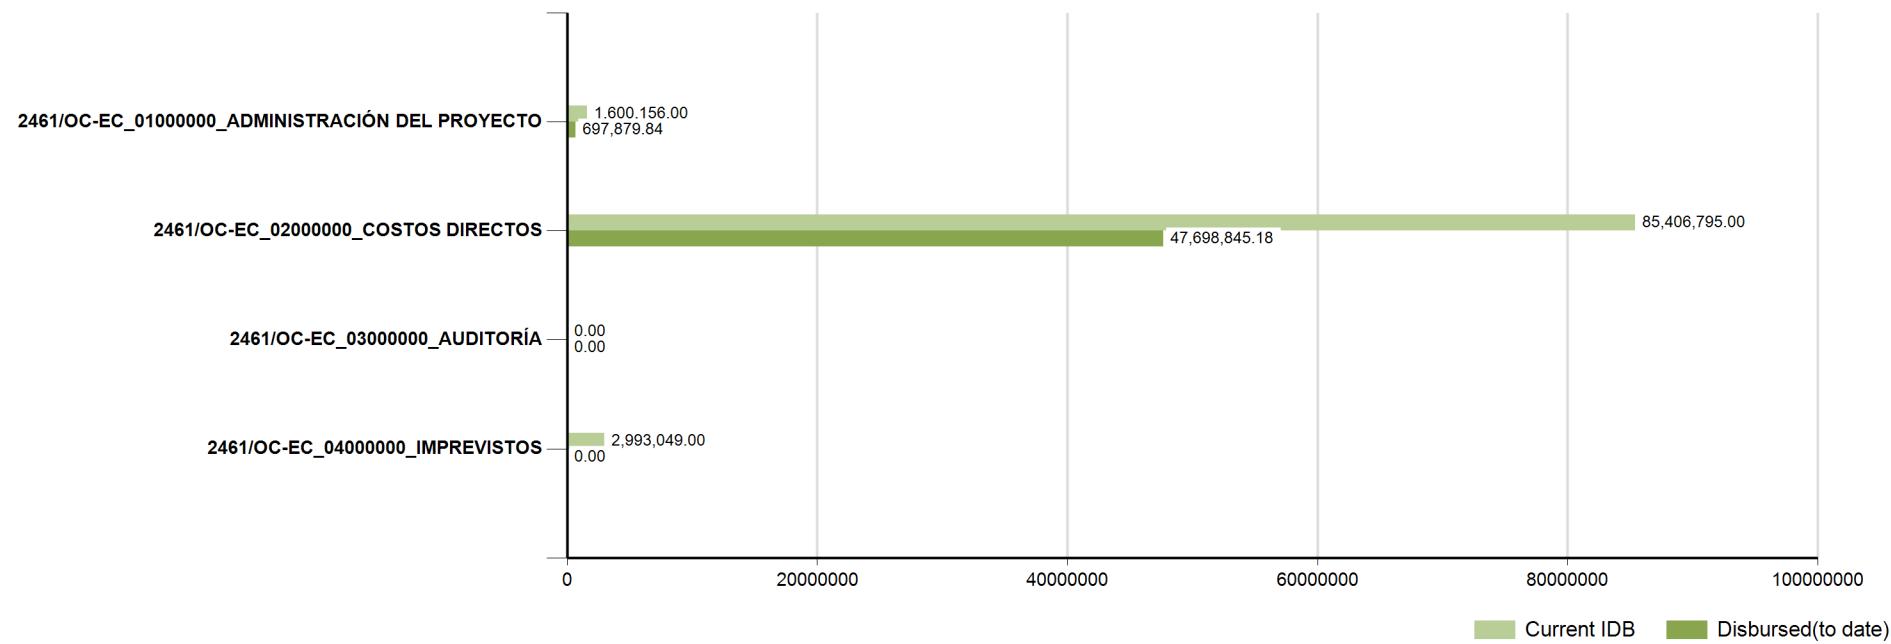

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Acceso a crédito de los hogares rurales incrementado							
Observation:	MEDIO DE VERIFICACION: Indicador 1.1. Evaluación de impacto de la operación							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Diferencia en acceso al crédito		%	0.00	2011	Evaluación de impacto de la operación	% de hogares con acceso a crédito entre beneficiarios y no beneficiarios del proyecto	P	35.00
							P(a)	35.00
							A	
Impact:	2 Valor de la base predial rural gravable de los municipios							
Observation:	MEDIO DE VERIFICACION: Indicador 2.1. Evaluación final de la operación							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Incremento en el valor de la base predial gravable con relación a cantones no incluidos en el proyecto		%	0.00	2011	Evaluación final de la operación		P	100.00
							P(a)	100.00
							A	



Outcomes

[illegible]

Observation:	MEDIO DE VERIFICACION. Indicador 3.1. Registros de la propiedad de los cantones							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Predios con situación legal de propiedad regularizada		Predios	0.00	2011	Registros de la propiedad de los cantones		P	170,000.00
							P(a)	170,000.00
							A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Información Cartográfica		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Ortofotomapas aprobados	Km2	P		236,122.00	P	80,000.00	29,643,006.00
		P(a)	30,614.00	211,138.00	P(a)	2,211,824.00	20,252,646.00
		A	34,248.00	211,138.00	A	966,098.00	19,670,646.00
Catastro y Regularización		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Predios Catastrados	Predios	P	165,245.00	800,000.00	P	10,966,258.00	44,298,578.00
		P(a)	300,000.00	986,153.00	P(a)	15,774,568.00	53,778,806.00
		A	372,745.00	635,055.00	A	11,394,274.00	30,603,540.00
Cantones con mapas temáticos completados	Cantones	P	27.00	50.00	P	4,980,706.00	9,774,975.00
		P(a)	10.00	46.00	P(a)	6,071,455.00	6,734,000.00
		A	4.00	23.00	A	4,450,850.00	4,770,112.00
Cantones con mapas de valoración completados	Cantones	P	30.00	50.00	P	1,470,000.00	2,516,300.00
		P(a)	5.00	46.00	P(a)	233,247.00	1,966,301.00
		A	2.00	7.00	A	218,100.00	601,390.00
Cantones con equipamiento cantonal instalado	Cantones	P		50.00	P	2,743,501.00	5,463,819.00
		P(a)	16.00	46.00	P(a)	441,919.00	1,019,857.00
		A	12.00	20.00	A	0.00	852,842.00
Centro geomático operando	Centro	P		1.00	P	184,333.00	700,603.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	700,000.00	459,062.00
		A	0.00	0.00	A	7,562.00	7,562.00
Estudio de reformas legales para sostenibilidad de la regularización realizado	Estudio	P		1.00	P		15,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		30,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema Nacional de Información de la Tierra		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Diseño y conformación de la base de datos nacional completada	Base de Datos	P		1.00	P	50,000.00	130,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		130,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	175.00
Centro de datos para el Sistema Nacional implementado	Centro	P		1.00	P		896,653.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	299,500.00	762,601.00
		A	0.00	1.00	A	91,336.00	678,387.00
Sistema de archivos de fotografía aérea y ortofotomapas implantado	Sistema	P		1.00	P		80,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		80,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	50,000.00
Estudio para la actualización rápida de mapas temáticos completado	Estudios	P	1.00	1.00	P	30,000.00	30,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)		30,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Cantones con mapas temáticos completados	Cantones	P	90.00	154.00	P	8,075,507.00	17,881,507.00
		P(a)	10.00	154.00	P(a)	6,181,960.00	14,077,860.00
		A	40.00	45.00	A	5,115,322.00	5,115,322.00
Sistema SIGTierras vía web	Sistema	P		1.00	P	278,400.00	2,404,400.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,754,291.00	5,773,368.00
		A	0.00	0.00	A	1,418,405.00	2,187,154.00
Monitoreo, evaluación y auditorías							
Administración del Proyecto							

Auditorías
Imprevistos

Other Cost		2014	Cost
Sistema de monitoreo y seguimiento implantado	P		\$80,000.00
	P(a)	\$30,939.00	\$111,701.00
	A	\$11,564.00	\$108,701.00
Evaluaciones realizadas (línea base, evaluación de medio término y evaluación final)	P		\$556,200.00
	P(a)	\$348,285.00	\$732,968.00
	A	\$277,167.00	\$277,167.00
Soporte en el uso de la información	P	\$883,833.00	\$2,761,877.00
	P(a)	\$185,246.00	\$465,200.00
	A	\$5,557.00	\$435,200.00
Administración y Gestión	P	\$949,718.00	\$5,414,743.00
	P(a)	\$1,787,709.00	\$8,084,869.50
	A	\$1,467,248.50	\$5,184,855.50
Estrategia de difusión	P	\$230,000.00	\$690,000.00
	P(a)	\$300,836.00	\$518,634.00
	A	\$110,949.00	\$218,634.00
Auditorías	P	\$50,000.00	\$200,000.00
	P(a)	\$46,000.00	\$172,358.00
	A	\$39,900.00	\$93,158.00
Imprevistos sobre costos directos	P	\$2,240,169.00	\$4,480,339.00
	P(a)	\$3,005,099.00	\$12,819,768.50
	A	\$2,227,031.50	\$2,227,031.50
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$33,212,425.00	\$128,018,000.00
	P(a)	\$39,372,878.00	\$87,603,086.00
	A	\$27,801,364.00	\$73,081,877.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistema de archivos de fotografía aérea y ortofotomapas implantado	Modify Financial P(a) value	Durante el año 2014 no se programaron realiza gastos para este producto, no hay variación financiera. No obstante, si bien al 2014 se ha completado las ortofotomapas, el sistema de archivo se tendrá listo una vez el módulo respectivo del SINAT esté listo y las mismas sean cargadas.	3/24/2015	3/24/2015
Output	Ortofotomapas aprobados	Modify Financial P(a) value	El pago final para el IGM que fue proyectado a pagar el 2014 en el tercer trimestre, por falta de techo presupuestario fue transferido al 2015.	3/24/2015	3/24/2015
Output	Ortofotomapas aprobados	Modify Physical P(a) value	Para el año 2014 se logró aumentar en un 11% la meta programada, con lo cual se da por terminado el cumplimiento de este producto. El total contratado fue de 240.032 km2, por lo que SIGTIERRAS aprobó el 88%. El restante de la superficie del país no ha podido ser cubierto por condiciones meteorológicas y topográficas, motivo por el cual la meta física al final del proyecto sería menor.	3/24/2015	3/24/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
