




PMR Operational Report

Operation Number		BR-L1414	Chief of Operations Validation Date		04/07/22							
Year- PMR Cycle		Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date		04/11/22							
Last Update		04/05/22	Country Representative Validation Date		04/19/22							
PMR Validation Stage		Validated by Representative	Current Validated Classification		SATISFACTORY							
			(As of 4/19/2022)									
Basic Data												
Operation Profile												
Operation Name		Program for Strengthening Social Inclusion and Healthcare Networks – PROREDES Fortaleza	Loan Number		3678/OC-BR							
Executing Agency		PREFECTURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	Sector/Subsector		HEALTH-HEALTH SERVICES							
Team Leader		MAC ARTHUR, IAN WILLIAM	Overall Stage		Fully Disbursed							
Operation Type		Loan Operation	Country		Brazil							
Lending Instrument		Investment Loan	PMR required		YES							
Borrower		MUNICIPIO DE FORTALEZA	Convergence related Operation(s)									
Events Data			Objective									
Supervision			The overall objective of the Program is to promote the reduction of social inequality, by implementing mechanisms and actions that contribute to the full development of the youth of Fortaleza, specifically favoring youth at risk and facing social vulnerability, as well as through investments to ensure the integrity of health care, improving access to specialized services for medium and high complexity and to hospitalization of youth and their families.									
Signature		12/28/17										
Ratification			Environmental and Social Safeguards				Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)					
Legal Effectiveness		12/28/17	Impacts Category		B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?		NO				
Total Eligibility		05/17/18	Risk		Moderate	Date of approval						
Partial Eligibility		05/17/18	Safeguard Performance Rating									
First Disbursement		07/30/18	Safeguard Performance Rating - Rationale									
Original Disbursement Expiration		12/28/21										
Current Disbursement Expiration		12/28/21										
Preparation												
On pipeline		05/13/14										
Start date PP Approved		10/02/14 01/13/15	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)					
ERM Approved		02/03/14	Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
DLP Approved by OPC		04/09/15	BR-L1414	65,475,000	65,475,000	65,475,000	0	130,950,000	65,475,000	65,475,000	100.00%	-
Negotiation		02/03/16	Aggregated	65,475,000	65,475,000	65,475,000	0	130,950,000	65,475,000	65,475,000	0.00%	-
Operation Approved		05/11/16										

Development Effectiveness Matrix		Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									
Economic Analysis											
Undefined	Yes										
Cost benefit analysis	No										
Cost effectiveness analysis	No										
General economic analysis (Economic rate of return)	No										
Evaluation											

Undefined	Yes
Random assignment	No
Non-experimental method	No
Ex-post cost benefit analysis	No
Ex-post cost effectiveness analysis	No
Before/after or With/without comparison	No

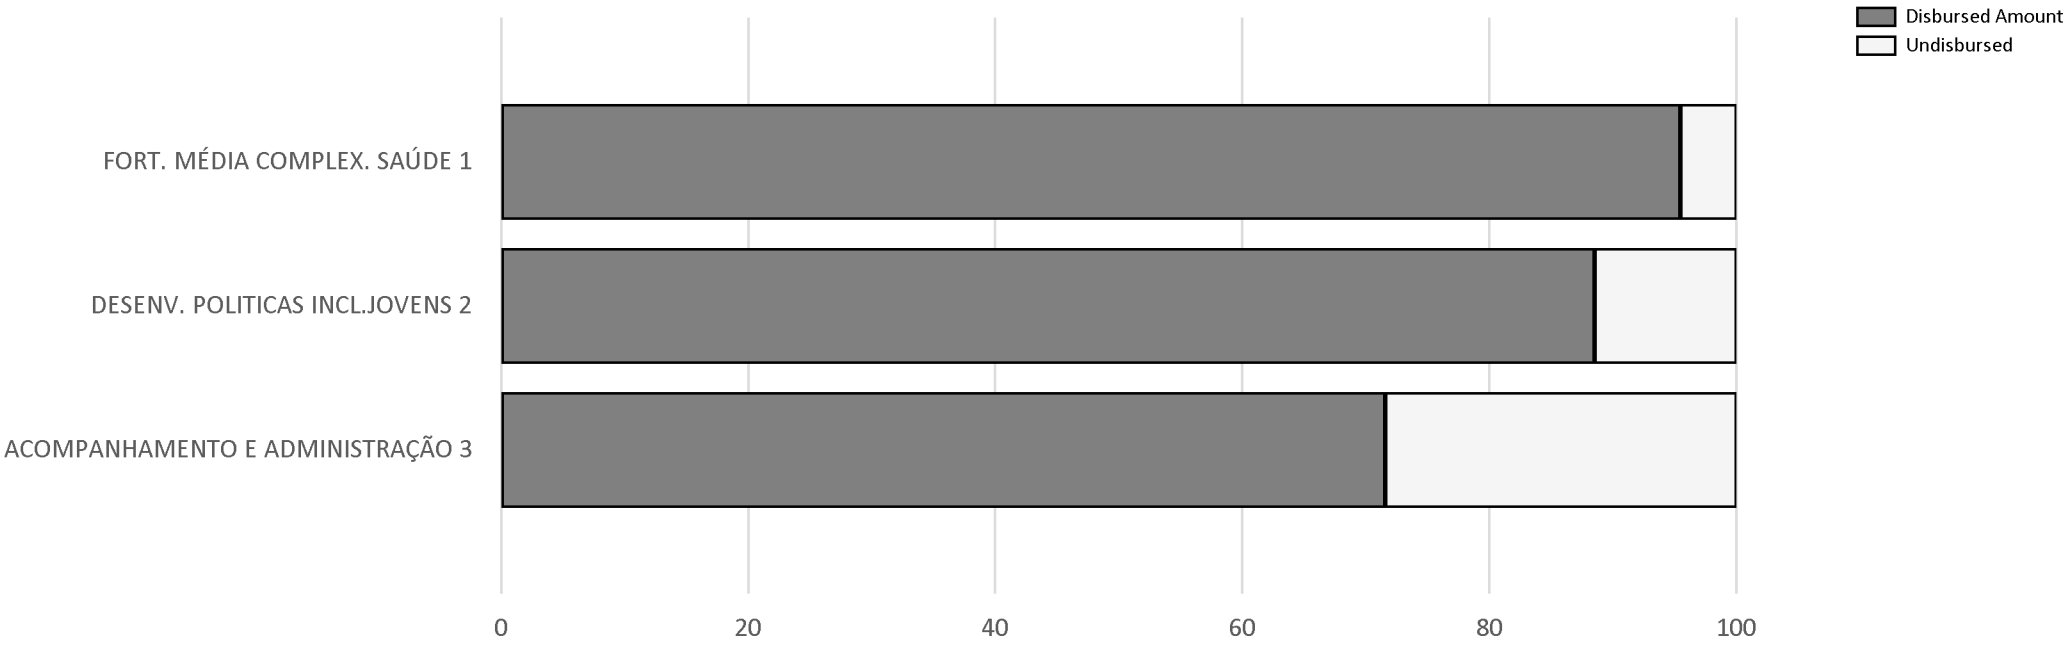

Printed on: August 8, 2022 3:10:21 PM

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población general y reducir las conductas de riesgo de jóvenes vulnerables del Municipio de Fortaleza (MF).

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.0	Tasa de mortalidad precoz (30-59 años) por diabetes mellitus y sus complicaciones.	por 100.000 hab	6	2017	2021	P	5
						A	-

Details

Means of Verification: DATASUS-SIM SUS (Sistema de Información sobre Mortalidad). Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística (IBGE)

Observations: Número de muertes por diabetes mellitus y sus complicaciones en la población residente en Fortaleza, en la franja etaria de 30 a 59 años / población residente en Fortaleza en la franja etaria de 30-59 años x 100.000 habitantes.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
			Hombres (línea de base 7.4/100 mil hombres)		P	6.4	
					A	-	
			Mujeres (línea de base 4.9/100 mil mujeres)		P	3.9	
					A	-	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.1	Tasa de mortalidad precoz (30-59 años) por accidente cerebrovascular.	por 10.000 hab	2.26	2017	2021	P	2.06
						A	-

Details

Means of Verification: DATASUS-SIM SUS (Sistema de Información sobre Mortalidad). Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística (IBGE)

Observations: Número de muertes por accidente cerebrovascular en la población residente en Fortaleza en la franja etaria de 30 a 59 años/población residente en Fortaleza en la franja etaria de 30-59 años x 10.000 habitantes.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
------------	----	---------------	----	---------------	--	--	--

		Hombres (línea de base 2.55/100 mil hombres)				P	2.35
						A	-
		Mujeres (línea de base 2.02/100 mil mujeres)				P	1.82
						A	-
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.2	Proporción de hospitalizaciones por causas seleccionadas sensibles a la Atención Básica (AB).	%	19.5	2017	2021	P	17.5
						A	-
Details							

Means of Verification: DATASUS SIH-SUS (Sistema de Información Hospitalaria).

Observations: Número de hospitalizaciones de residentes en Fortaleza por causas seleccionadas sensibles a la AB / total de hospitalizaciones clínicas de residentes en Fortaleza x 100.000.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
			Hombres (línea de base 23.8%)			P	21.8		
						A	-		
			Mujeres (línea de base 16.4%)			P	14.4		
						A	-		
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021		
0.3	Porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años certificados en los cursos profesionales realizados por la Política de Juventud que logran un trabajo en un período de 1 año después de su conclusión			%	23.1	2017	2021	P	32
								A	-
Details									

Means of Verification: Cuestionários específicos a los jóvenes certificados

Observations: Número de jóvenes que lograrón un trabajo/ jóvenes certificados x 100.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.5	Porcentaje de jóvenes beneficiados con crédito que siguen en actividades comerciales después de 1 año de recibir el crédito			%	32	2017	2021	P	36
								A	-
Details									

Means of Verification: Informes de monitoreo del Banco y del CEPPJ

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Redes integradas de servicios de salud y de inclusión social para la juventud en Fortaleza consolidada y expandida.

Observation:										
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Tasa anual de hospitalizaciones por diabetes mellitus y sus complicaciones en la población de 30 a 59 años de edad, residente en Fortaleza.	por 10.000 hab	1	2017	P	-	-	-	.8	.8
					A	-	-	-	.1	-
Details										
Means of Verification: DATASUS / SIH-SUS / IBGE										
Observations: Número de hospitalizaciones por diabetes mellitus y sus complicaciones en la población residente en Fortaleza, en la franja etaria de 30 a 59 años / población residente en Fortaleza en la franja etaria de 30-59 años x 10.000 habitantes.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Disaggregation		Mujeres (línea de base 0,8/10.000)			P	-	-	-	.6	.6
					A	-	-	-	-	-
		Hombres (línea de base 1,2/10.000)			P	-	-	-	1	1
					A	-	-	-	-	-
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Tasa anual de hospitalizaciones por accidente cerebrovascular en la población de 30 a 59 años de edad residente en Fortaleza.	por 10.000 hab	2.3	2017	P	-	-	-	2	2
					A	-	-	-	.3	-
Details										
Means of Verification: DATASUS SIH-SUS (Sistema de Información Hospitalaria).										
Observations: Número de hospitalizaciones por accidente cerebrovascular en la población residente en Fortaleza en la franja etaria de 30 a 59 años / población residente en Fortaleza en la franja etaria de 30-59 años x 10.000 habitantes.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Disaggregation		Mujeres (línea de base 1,8/10.000)			P	-	-	-	1.5	1.5
					A	-	-	-	-	-
		Hombres (línea de base 2,8/10.000)			P	-	-	-	2.5	2.5
					A	-	-	-	-	-
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.2	Tiempo promedio en días de espera entre la entrada en la fila de espera y la confirmación de la cita en: Endocrinología adulto	Días	1915	2017	P	-	-	-	180	180
					A	-	-	-	-	-
Details										
Means of Verification: Sistema de Regulación Municipal										
Observations: Tiempo promedio de espera (en días) entre el registro en la fila de espera y la confirmación de la cita médica en la especialidad considerada.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.3	Tiempo promedio en días de espera entre la entrada en la fila de espera y la confirmación de la cita en: Neurología adulto	Días	729	2017	P	-	-	-	180	180
					A	-	-	-	-	-
Details										
Means of Verification: Sistema de Regulación Municipal										
Observations: Tiempo promedio de espera (en días) entre el registro en la fila de espera y la confirmación de la cita médica en la especialidad considerada.										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						

Observations: Jóvenes de 15 a 29 años aprobados en la disciplina deportiva donde está registrado a cada mes

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Details

Observations: Jóvenes de 15 a 29 años certificados en los cursos de la Red CUCA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Details

Observations:

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

OUTPUTS PHYSICAL PROGRESS

Details

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

1.2	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	22 nuevas Unidades Básicas de Salud construidas.	UBS construida	P	0	19	0	3	0	-	22	
			P (a)	0	19	0	2	0	-	22	
			A	0	19	1	2	0	-	22	
Details											
Means of Verification: Catastro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) / Sistema de Gestión del Programa / Informe Semestral de Progreso											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									
1.3	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Edificio Adjunto del Hospital IJF II construido	Anexo Concluido	P	0	0	1	0	0	-	1	
			P (a)	0	0	1	1	0	-	1	
			A	0	0	0	1	0	-	1	
Details											
Means of Verification: Informe semestral de progreso											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									

1.4	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Unidades de Pronto Atendimento (UPA) en funcionamiento.	Ano-UPA financiado	P	0	2	2	2	0	-	6	
			P (a)	0	2	2	2	0	-	6	
			A	0	2	2	2	0	-	2	
Details											
Means of Verification: Informe semestral de progreso											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									
1.5	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Municipal de Salud implantado	Fortalecimiento Institucional concluido	P	0	0	0	1	0	-	1	
			P (a)	0	0	0	1	1	-	1	
			A	0	0	0	0	1	-	1	
Details											
Means of Verification: Sistema de Gestión del Programa / Informe Semestral de Progreso											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									

1.6	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Seminarios para mejorar la gestión de los equipos de salud realizados.		Seminario realizado	P	0	0	1	1	1	-	3
				P (a)	0	0	1	1	0	-	3
				A	0	0	1	2	0	-	3
Details											
Means of Verification: Sistema de Gestión del Programa / Informe Semestral de Progreso / Registro del Seminarios											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									
1.7	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Unidades de Saude com capacidade incrementada para atender aos pacientes de Covid 19,através da compra de equipamentos, EPI e mobiliarios.		Unidades	P	-	-	-	-	-	-	0
				P (a)	-	-	-	20	41	-	80
				A	-	-	-	39	41	-	80
Details											
Means of Verification: Informe semestral de progreso											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									
1.8	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Aquisição de testes rapidos para o diagnosticos de COVID-19		Unidade	P	-	-	-	-	-	-	0

Aquisição de testes rapidos para o diagnosticos de COVID-19	Unidade	P (a)	-	-	-	15,000	-	-	15,000
		A	-	-	-	15,000	142,850	-	157,850

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión del Programa / Informe Semestral de Progreso.			
Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

Component Nbr. 2: Componente 2. Desarrollo de Políticas Inclusivas para Jóvenes

2.1	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Centros CUCA contruidos, de acuerdo a los proyectos ejecutivos respectivos.	Centros	P	0	0	0	2	1	-	3	
			P (a)	0	0	0	1	2	-	3	
			A	0	0	0	1	2	-	3	

Details

Means of Verification:			
Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

2.2	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Centros CEU contruidos,equipados y en funcionamiento de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Cultura de Brasil.	Centros	P	0	0	0	1	1	-	2	
			P (a)	0	0	0	1	1	-	2	

Centros CEU contruidos,equipados y en funcionamiento de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Cultura de Brasil.	Centros	A	0	0	0	1	1	-	2	
---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Details

Means of Verification:

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

2.3	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Jóvenes capacitados por medio de programas de Juventud.	Jovem	P	0	24,164	39,282	46,672	47,565	-	157,683	
			P (a)	0	24,164	43,432	49,962	55,205	-	261,307	
			A	0	39,176	82,477	84,449	32,388	-	238,490	

Details

Means of Verification: Sistema de Gestión Integral del Programa / Sistema de Registro de Beneficiarios de los CUCA

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

Milestone				2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Proyectos y actividades para mejoría de la capacidad de los jóvenes por medio de la Red CUCA	Jovem	P	0	9,380	10,860	11,170	12,360	-	43,770
			P (a)	0	9,380	15,000	15,000	20,000	-	79,698
			A	0	14,983	21,606	23,109	15,185	-	74,883
	Jóvenes beneficiados con apoyo financiero para negócios	Jovem	P	0	10	52	62	0	-	124
			P (a)	0	10	62	62	62	-	191
			A	0	0	129	0	0	-	129
	Jóvenes beneficiados por acciones de promoción de la salud y reducción de conducta de riesgos	Jovem	P	0	14,200	27,150	33,570	35,000	-	109,920
			P (a)	0	14,200	27,150	33,570	35,000	-	170,028
			A	0	23,596	54,968	56,464	29,080	-	164,108
	Jóvenes beneficiados por acciones del Programa Protagonismo Juvenil	Jovem	P	0	474	1,015	1,125	15	-	2,629
			P (a)	0	474	1,015	1,125	15	-	12,118
			A	0	497	6,036	5,570	13,789	-	25,892
	Jóvenes beneficiados por programas de intercambio	Jovem	P	0	100	205	205	190	-	700
			P (a)	0	100	205	205	395	-	601
			A	0	100	106	0	0	-	206

Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
2.4	Areninhas construídas y equipadas	Areninhas	P	0	0	10	0	0	-	10
			P (a)	0	0	11	0	0	-	18
			A	0	0	18	0	47	-	65

Details			
Means of Verification:			
Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

2.5	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Estudios y protocolos de gestión del CUCA y CEU aprobados por la CEPPJ.		Estudo	P	0	0	1	2	1	-	4
				P (a)	0	0	1	2	3	-	4
				A	0	0	0	1	1	-	2
Details											
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso. Los estudios tendrán el perfil de demandas de los jóvenes											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									
2.6	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Encuestas de Juventud realizadas.		Encuesta	P	0	0	0	1	1	-	2
				P (a)	0	0	0	1	2	-	2
				A	0	0	0	-	2	-	2
Details											
Means of Verification: Informe de trabajo de campo y bases de datos remitidas por la CEPPJ											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									
2.7	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Seminarios técnicos de Políticas de Juventud realizados.		Seminário realizado	P	0	0	1	1	0	-	2

Seminarios técnicos de Políticas de Juventud realizados.	Seminário realizado	P (a)	0	0	1	1	0	-	2
		A	0	0	1	1	1	-	3

Details

Means of Verification:

Informe Semestral de Progreso. Incluyen Seminario sobre Modelos de Intervención y Reducción de Conductas de Riesgo

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

Component Nbr. 3: Componente 3. Seguimiento y Administración

3.1	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Administrativo (Alquiler de Automóviles)		Autos	P	0	0	2	2	2	-	6
				P (a)	0	0	2	0	0	-	0
				A	0	0	0	0	-	-	0
Details											
Means of Verification:											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									

3.1	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Informe de Evaluación del Programa		evaluación	P	0	0	1	1	2	-	4
				P (a)	0	0	2	1	4	-	4

Informe de Evaluación del Programa		evaluación	A	0	0	0	0	4	-	4
Details										
Means of Verification: En el año 1 son los informes de Línea de Base para Salud y Juventud (por separado), y en el año 4 los informes finales (por separado)										
Pro-Gender	No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity	No									

3.2	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Supervisión de Obras	Supervisión contratada por año	P	0	1	1	1	1	-	4
			P (a)	0	1	1	1	1	-	3
			A	0	0	1	1	1	-	3

Details										
Means of Verification: Contratos assinados/ relatorio semestral										
Pro-Gender	No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity	No									

OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Componente 1. Fortalecimiento de la Atención Especializada de Media Complejidad en Salud

Component revised cost: 64,703,919.85											
1.1	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Policlínicas de especialidades construidas, equipadas y en funcionamiento según las especificaciones técnicas del SUS.	Polliclinicas en funcionamiento	P	0	2,909,968	5,981,246	2,403,786	0	-	11,295,000	
			P (a)	0	2,909,968	6,836,669	2,403,786	761,336	-	8,476,250	

	Policlínicas de especialidades construidas, equipadas y en funcionamiento según las especificaciones técnicas del SUS.	Polliclinicas en funcionamiento	A	0	2,054,545	1,977,780	3,682,589	394,713.54	-	8,109,627.54
Details										
Means of Verification: Catastro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) / Sistema de Gestión del Programa / Informe Semestral de Progreso										
	Pro-Gender	No	CRF indicator							
	Pro-Ethnicity	No								

1.2	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	22 nuevas Unidades Básicas de Salud construidas.	UBS construida	P	0	4,400,000	536,041	1,063,959	0	-	6,000,000	
			P (a)	0	4,400,000	1,362,041	791,921	1,915	-	5,559,155	
			A	0	4,376,036	346,095	835,109	405,204.62	-	5,962,444.62	

Details										
Means of Verification: Catastro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) / Sistema de Gestión del Programa / Informe Semestral de Progreso										
	Pro-Gender	No	CRF indicator							
	Pro-Ethnicity	No								

1.3	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Edificio Adjunto del Hospital IJF II construído	Anexo Concluído	P	0	8,771,705	1,988,295	0	0	-	10,760,000	
			P (a)	0	8,771,705	1,818,872	1,700,721	2,891,615	-	14,244,546	
			A	0	8,411,129	1,529,344	1,412,458	2,083,740.62	-	13,436,671.62	

Details										
Means of Verification: Informe semestral de progreso										
	Pro-Gender	No	CRF indicator							
	Pro-Ethnicity	No								

1.4	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Unidades de Pronto Atendimento (UPA) en funcionamiento.	Ano-UPA financiado	P	0	8,367,816	8,432,184	6,844,000	0	-	23,644,000	
			P (a)	0	8,367,816	6,500,000	6,500,000	186,247	-	21,174,631	
			A	0	5,716,829	7,472,113	7,799,442	2,889,206.77	-	23,877,590.77	
Details											
Means of Verification: Informe semestral de progreso											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									
1.5	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Municipal de Salud implantado	Fortalecimiento Institucional concluído	P	0	25,000	2,021,120	4,700,380	0	-	6,746,500	
			P (a)	0	25,000	2,046,120	4,700,380	637,515	-	6,489,690	
			A	0	0	989,423	4,862,752	1,280,892.59	-	7,133,067.59	
Details											
Means of Verification: Sistema de Gestión del Programa / Informe Semestral de Progreso											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									
1.6	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Seminarios para mejorar la gestión de los equipos de salud realizados.	Seminario realizado	P	0	0	25,000	37,861	37,139	-	100,000	
			P (a)	0	0	25,000	37,861	37,139	-	37,139	

Seminarios para mejorar la gestión de los equipos de salud realizados.				Seminario realizado	A	0	0	0	0	0	-	0
Details												
Means of Verification: Sistema de Gestión del Programa / Informe Semestral de Progreso / Registro del Seminarios												
Pro-Gender		No	CRF indicator									
Pro-Ethnicity		No										

1.7	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Unidades de Saude com capacidade incrementada para atender aos pacientes de Covid 19,através da compra de equipamentos, EPI e mobiliarios.	Unidades	P	-	-	-	-	-	-	-	0
			P (a)	-	-	-	8,478,846.15	1,074,919	-	8,001,355	
			A	-	-	-	6,926,436	521,038.43	-	7,447,474.43	

Details												
Means of Verification: Informe semestral de progreso												
Pro-Gender		No	CRF indicator									
Pro-Ethnicity		No										

1.8	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Aquisição de testes rapidos para o diagnosticos de COVID-19	Unidade	P	-	-	-	-	-	-	-	0
			P (a)	-	-	-	721,153.85	-	-	721,153.85	
			A	-	-	-	721,154	310,012.08	-	1,031,166.08	

Details												
Means of Verification: Sistema de Gestión del Programa / Informe Semestral de Progreso.												
Pro-Gender		No	CRF indicator									
Pro-Ethnicity		No										

--

Component Nbr. 2: Componente 2. Desarrollo de Políticas Inclusivas para Jóvenes

Component revised cost: 60,942,023												
2.1	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Centros CUCA contruidos, de acuerdo a los proyectos ejecutivos respectivos.		Centros	P	0	4,207,705	15,045,925	14,889,222	8,997,648	-	43,140,500	
				P (a)	0	4,207,705	18,217,964	18,574,072	13,697,217	-	36,725,987	
				A	0	455,908	8,936,992	13,635,870	6,254,638.36	-	29,283,408.36	
Details												
Means of Verification:												
Pro-Gender		No	CRF indicator									
Pro-Ethnicity		No										
2.2	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Centros CEU contruidos,equipados y en funcionamiento de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Cultura de Brasil.		Centros	P	0	0	0	1,635,417	2,427,083	-	4,062,500	
				P (a)	0	0	2,329,167	866,666	2,288,427	-	3,912,580	
				A	0	0	1,134,222	489,931	242,020.86	-	1,866,173.86	
Details												
Means of Verification:												
Pro-Gender		No	CRF indicator									
Pro-Ethnicity		No										
	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Jóvenes capacitados por medio de programas de Juventud.		Jovem	P	0	2,470,910	-	-	-	-	-	

2.3	Jóvenes capacitados por medio de programas de Juventud.	Jovem	P (a)	0	-	-	-	-	-	-
			A	0	-	3,433,618	4,014,819	-	-	-
Details										
Means of Verification: Sistema de Gestión Integral del Programa / Sistema de Registro de Beneficiarios de los CUCA										
Pro-Gender		No	CRF indicator							
Pro-Ethnicity		No								
2.4	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Areninhas construídas y equipadas	Areninhas	P	0	4,400,000	1,850,000	0	0	-	6,250,000
			P (a)	0	4,400,000	6,250,000	0	1,109,630	-	7,565,861
			A	0	0	6,456,231	0	10,714,006.94	-	17,170,237.94
Details										
Means of Verification:										
Pro-Gender		No	CRF indicator							
Pro-Ethnicity		No								
2.5	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Estudios y protocolos de gestión del CUCA y CEU aprobados por la CEPPJ.	Estudo	P	0	33,143	196,225	117,465	10,667	-	357,500
			P (a)	0	33,143	132,766	222,400	138,724	-	216,710
			A	0	2,334	35,849	39,803	34,428.43	-	112,414.43
Details										
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso. Los estudios tendrán el perfil de demandas de los jóvenes										

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

2.6	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Encuestas de Juventud realizadas.	Encuesta	P	0	15,198	186,013	175,428	23,361	-	400,000	
			P (a)	0	15,198	120,000	200,000	378,653	-	378,653	
			A	0	0	0	0	240,000	-	240,000	

Details

Means of Verification: Informe de trabajo de campo y bases de datos remitidas por la CEPPJ											
Pro-Gender	No	CRF indicator									
Pro-Ethnicity	No										

2.7	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021	
	Seminarios técnicos de Políticas de Juventud realizados.	Seminário realizado	P	0	0	80,000	80,000	0	-	160,000	
			P (a)	0	0	80,000	80,000	0	-	0	
			A	0	0	0	0	53,746.7	-	53,746.7	

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso. Incluyen Seminario sobre Modelos de Intervención y Reducción de Conductas de Riesgo											
Pro-Gender	No	CRF indicator									
Pro-Ethnicity	No										

Component revised cost: 1,790,000

3.1	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Administrativo (Alquiler de Automóviles)		Autos	P	0	0	40,000	40,000	40,000	-	120,000
				P (a)	0	0	40,000	0	0	-	0
				A	0	0	0	0	-	-	0
Details											
Means of Verification:											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									

3.1	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Informe de Evaluación del Programa		evaluación	P	0	0	150,000	15,000	225,000	-	390,000
				P (a)	0	0	150,000	150,000	369,834	-	600,000
				A	0	0	31,118	199,048	128,396.26	-	358,562.26
Details											
Means of Verification: En el año 1 son los informes de Línea de Base para Salud y Juventud (por separado), y en el año 4 los informes finales (por separado)											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									

3.2	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2021
	Supervisión de Obras		Supervisión contratada por año	P	0	194,945	547,102	549,199	408,754	-	1,700,000
				P (a)	0	194,945	566,667	566,667	552,858	-	1,190,000
				A	0	0	211,818	425,324	525,083.05	-	1,162,225.05

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Status of the Implementation

O Programa teve uma participação crucial no combate a pandemia no estado do Ceara nos anos de 2020 e 2021. Por ter um componente voltado para o fortalecimento da saúde foram incluídos diversos itens para equipagem da rede hospitalar constante no programa no que tange o combate a Pandemia, como respiradores, EPIs, e outros equipamentos, tais aquisições somaram cerca de US\$ 10 milhões de dólares. Tais aquisições foram possíveis devido a economias feitas nos processos de licitação dos produtos do componente 2 e a valorização do dólar frente ao real, o que propiciou um saldo de recursos. Isto levou a necessidade de um remanejamento de recursos entre os componentes e o que gerou a necessidade de um aditivo contratual que está em fase de análise pelo governo federal para posterior assinatura. É importante frisar que nenhum produto do programa será impactado.

O andamento das atividades foi impactado pelos decretos de suspensão de diversas atividades, durante o ano de 2020, porém em 2021 o programa conseguiu retomar as atividades e realizar o que estava previsto. Foram realizadas diversas ações do componente de juventude, tendo sido beneficiados cerca de 40 mil jovens. Além disto foram concluídas as obras das duas policlínicas restantes e o prédio do edifício anexo do IJF.

O programa desembolsou todos os recursos previstos no contrato de empréstimo

Em 2021 houve um aditivo no programa que retirou duas policlínicas e o Cuca Vicente Pinzon que estavam previstos para serem realizadas com recursos de contrapartida, porém foram inseridas 47 novas Areninhas.

A retirada das Policlínicas não impacta no atingimento dos objetivos específicos do programa.

O programa se encerrou no final de 2021, tendo concluído todos os seus produtos. Encontra-se em curso a elaboração do relatório de avaliação final para apuração dos resultados do programa.

O programa apreentou uma contrapartida maior que a contrapartida contratada e ira realziar a devolução de US\$ 339 mil dolares.

Likelihood of Achieving Development Objectives

High	O programa tem uma alta probabilidade de atingir todos seus resultados Concluiu todos os produtos previstos no programa e está em fase de elaboração do relatório final para apuração dos resultados
------	---

Lesson Learned

Category	Lesson Learned	Entered in System
Intra/Inter Coordination, Project Management Capacity	Diante da circunstância inesperada da pandemia do Coronavírus, passou-se a utiliza com mais frequencia dos ganhos proporcionados pelo uso de Videoconferência, com a otimização de tempo, estreitamento de laços, reforçando o imagem positiva da(s) instituições e suas áreas. Bem como, com a redução de custos com deslocamento e telecomunicações e aumento da eficiencia operacional. Reuniões internas mais objetivas e produtivas.	3/24/2022
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage, Project Management Capacity	Forçaram o aumento dos prazos previstos nas aquisições por Atas de Registro de Preço para compras de produtos genuinamente importados, como equipamentos de tecnologia da informação e equipamentos para as unidades da área da saúde, pois muitos fornecedores estão se negando a garantir os valores oferecidos nas Atas por conta do aumento descontrolado do Dolar.	3/24/2022
Project Management Capacity, Cost and Budgetary Aspects	O SAFF possibilitou ao Município executar a prestação de contas de forma mais precisa, gerar relatórios de gestão e controle interno Programa com mais eficiência e permitiu aos gestores da UGP cumprir as cláusulas do contrato de empréstimo nº 3678-OC-BR, além de realizar um controle dos recursos do Programa de forma mais segura e eficiente.	3/24/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES										
Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy				
1	Inactive	Se a violência armada nos territórios dos CUCAs aumentar no período de execução do Programa, poderá haver uma queda no número de jovens frequentadores da rede CUCA, causando possível impacto negativo no resultado de número de jovens capacitados, jovens beneficiados por ações de promoção e ou redução de conduta de risco.	3 - Medium High	1 - Low	Low	Social Environment				
	Details									
	Associated Outputs			Source of Risk	Execution Environment	Type of Impact				
	Associated Outcomes			Responsible	-	Probability Factors		-		
	Description of Impact		-							
	Response Actions									
	0	Response Description			Management Strategy		Status			
		-			-		-			
		Details								
		Estimated Completion Date		-	Budget		0	Responsible		-
		Completion Date			Funding Source		-	Status Description		-
Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy				
2	Inactive	Que o sistema de gestão financeira não consiga ser ajustado, comprometendo a entrega dos relatórios financeiros.	3 - Medium High	4 - High	High	Economic and Financial Environment				
	Details									
	Associated Outputs			Source of Risk	Execution Environment	Type of Impact				
	Associated Outcomes			Responsible	-	Probability Factors		-		
	Description of Impact		-							
	Response Actions									
	0	Response Description			Management Strategy		Status			
		-			-		-			
		Details								
		Estimated Completion Date		-	Budget		0	Responsible		-
		Completion Date			Funding Source		-	Status Description		-
MATERIALIZED RISKS										

EVALUATION TRACKING


Validation Process						
Date	User	Role	Action	Comment	Classification	Workflow
03/24/2022	IANM	Team Leader	Completed by Team Leader	Workflow returned by Convergence Support Team- CHG0069850	Satisfactory	Progress Monitoring Report March Validation Workflow
04/04/2022	gperla	R5 Administrator	Rejected		Satisfactory	Progress Monitoring Report March Validation Workflow
04/05/2022	IANM	Team Leader	Completed by Team Leader		Satisfactory	Progress Monitoring Report March Validation Workflow
04/07/2022	PAOLAA	Chief of Operations	Validated by Chief of Operations		Satisfactory	Progress Monitoring Report March Validation Workflow
04/11/2022	Pibarraran	Division Chief	Validated by Division Chief		Satisfactory	Progress Monitoring Report March Validation Workflow
04/19/2022	PAOLAA	Representative	Validated by Representative		Satisfactory	Progress Monitoring Report March Validation Workflow

MONITORING INDICATORS


Show

Stage 3: After Operation Reaches 95% of total Disbursements

		Benchmark Indicator Value			
Indicator (I)	Project Indicator Value	Satisfactory	Alert	Problem	Traffic Light
Synthetic Indicator (SI)	3.00	2.5 <= I	2<=I<2.5	I<2	SATISFACTORY
# of months elapsed after 95% disbursements reached	3.00	I <=9.87	9.87I <=17.01	'I>17.01	SATISFACTORY
Accumulated disbursements to country's historic disbursements	1.00	1 >= I >=0.5	0.5 > I >=0.4	0.4 > I >= 0	SATISFACTORY
Cost Performance Index - CPI	1.38	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Cost Performance Index (annual - CPI(a)	1.18	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Schedule Performance Index - SPI	1.35	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Schedule Performance Index (annual)- SPI(a)	1.17	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Expected additional execution duration (months)	-11.10	N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only
Environmental and social safeguards performance rating		N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only

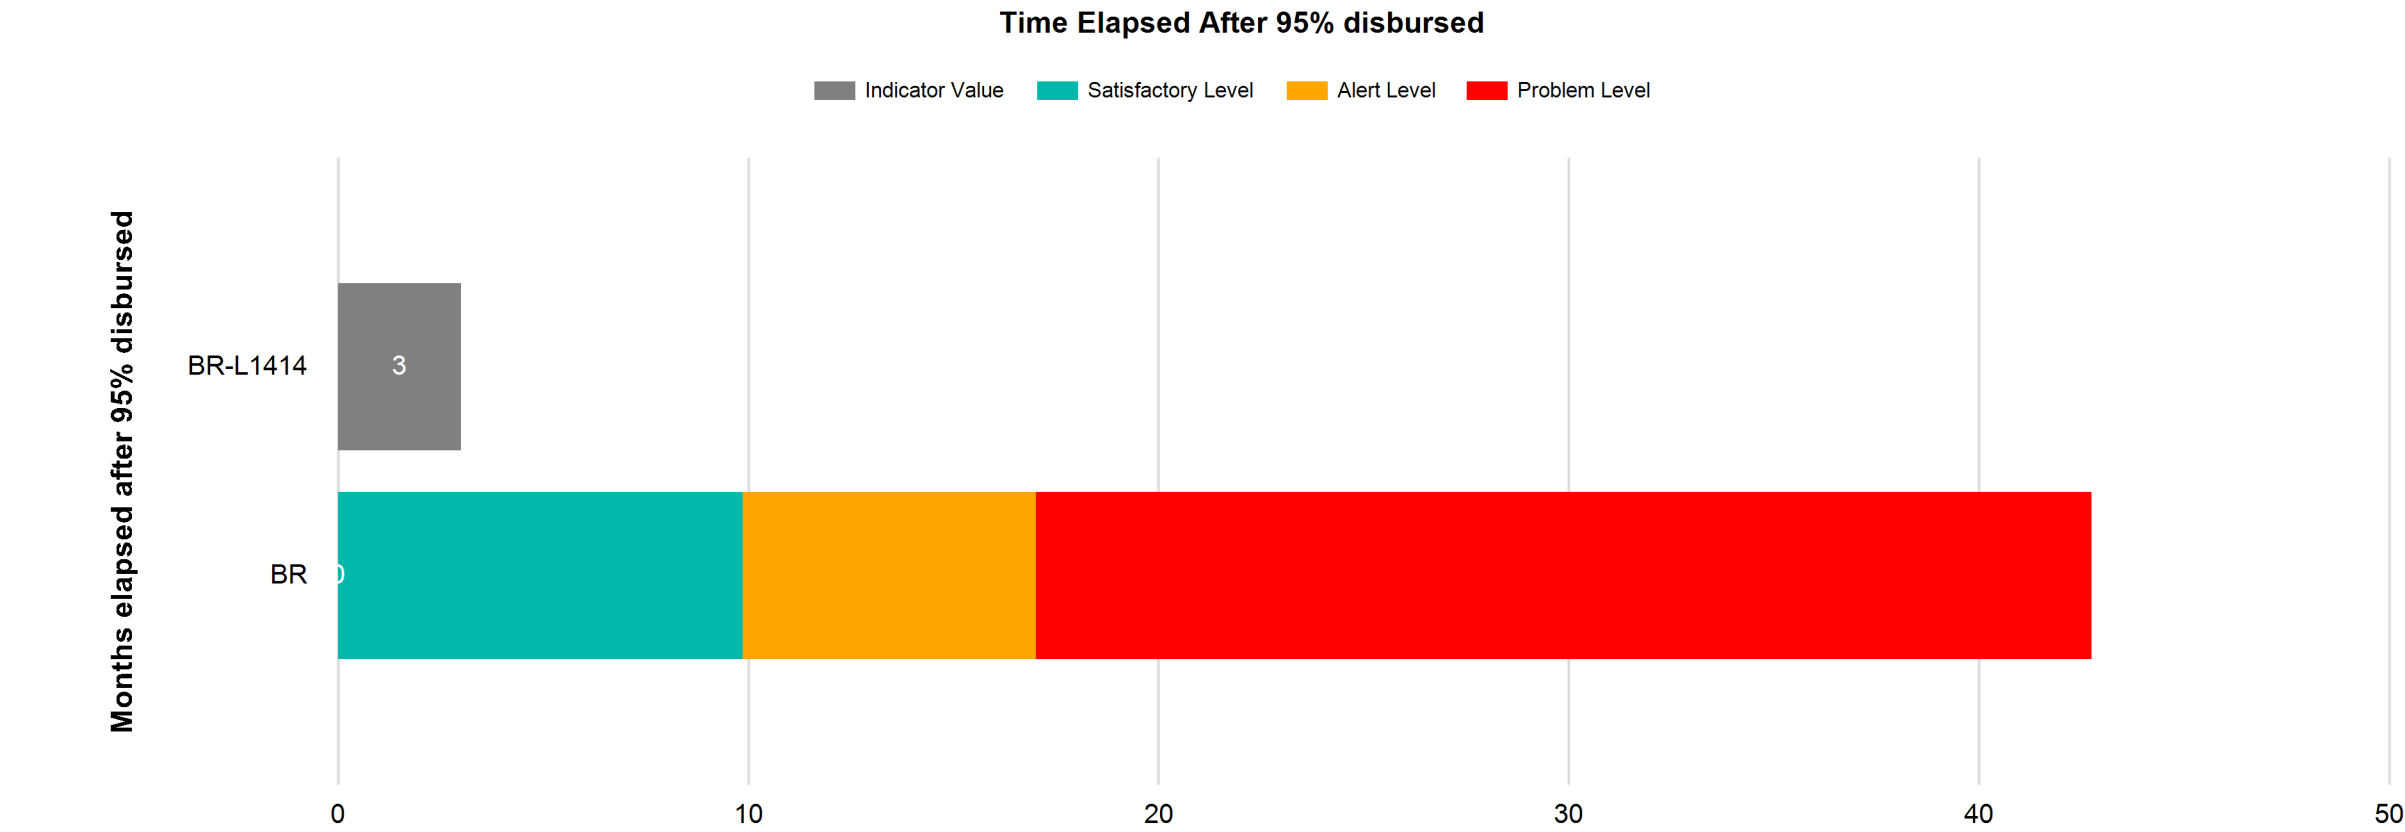


Accumulated disbursements as proportion of the total amount

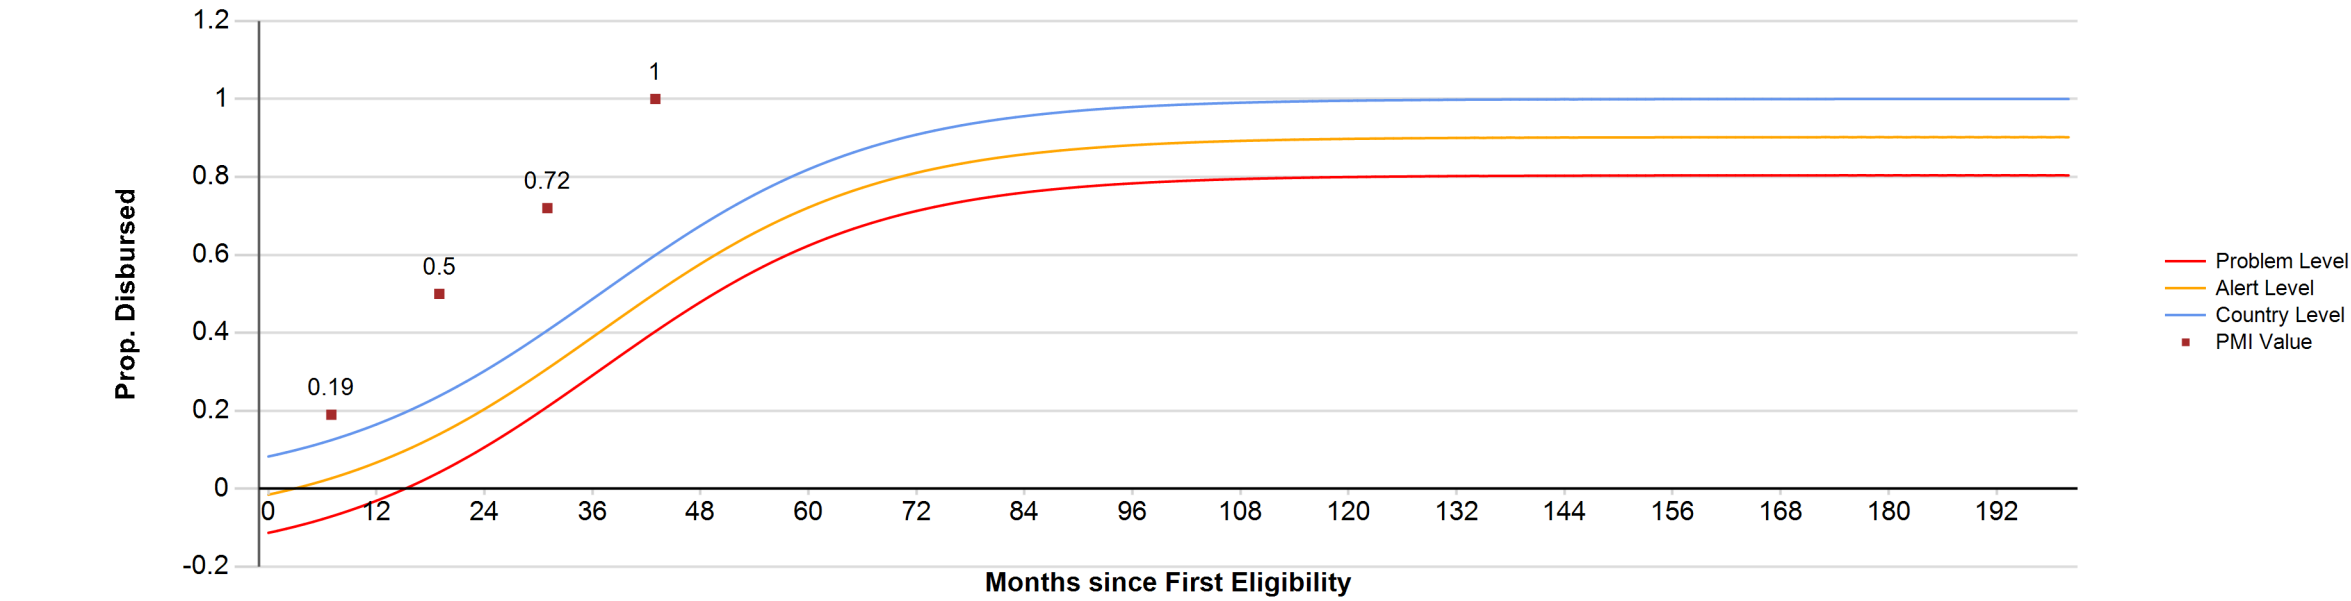

PV, AC, EV, PV(a), EV(a)

	2017	2018	2019	2020	2021
PV	0.00	35,796,390.00	77,440,677.00	114,209,138.00	129,570,000.00
AC	0.00	22,473,516.00	55,028,119.00	100,072,854.00	126,384,389.16
EV	0.00	27,697,706.60	67,620,711.56	107,077,414.32	174,663,933.27
PV(a)	0.00	35,796,390.00	74,542,598.00	106,300,543.00	127,435,942.85
EV(a)	0.00	27,697,706.60	59,946,630.77	110,216,542.55	149,499,935.58

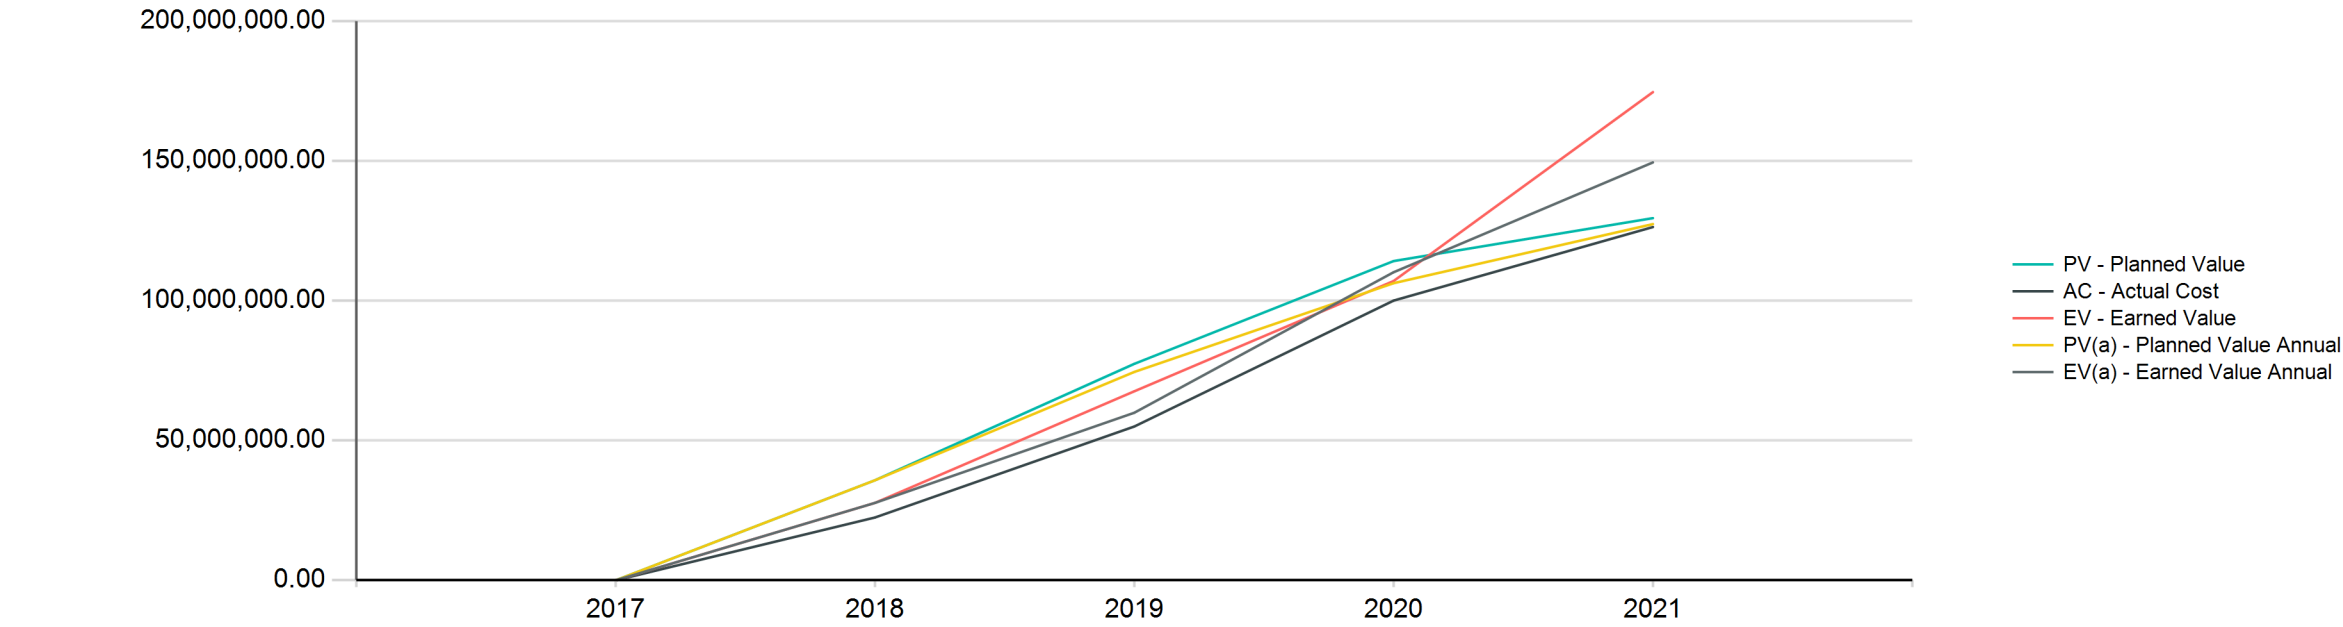

	2017	2018	2019	2020	2021
CPI	1.00	1.23	1.23	1.07	1.38
CPI(a)	1.00	1.23	1.09	1.10	1.18
SPI	1.00	0.77	0.87	0.94	1.35
SPI(a)	1.00	0.77	0.80	1.04	1.17

