
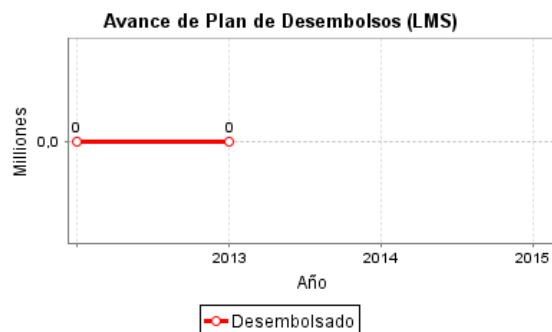


## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		
Sector:	EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION		
Número(s) de Préstamo:	2828/BL-BO	Monto Aprobado Actual: 40.000.000,00	BID Original: 40.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 40.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s):	BO-T1138, BO-T1171, RG-P1478, BO-T1185	Saldo: 40.000.000,00	Co-financiamiento/País:
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 40.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 02-abr-2013 Validado por Representante de País: 10-abr-2013

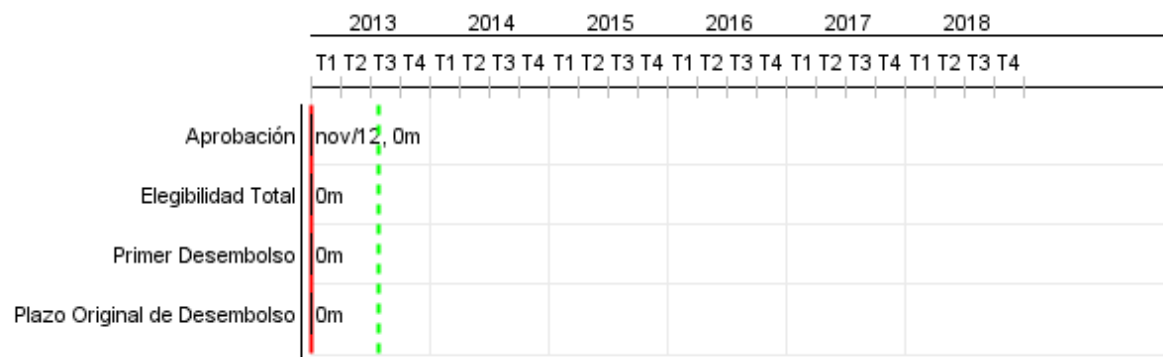

## Progreso Acumulado al 2012



## Resultados

<b>Resultado:</b>	La oferta del BTH implementada
-------------------	--------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Establecimientos en condición de entregar la nueva oferta del BTH	establecimientos		2013	P A	55,00
Salidas técnicas definidas	salidas técnicas		2013	P A	8,00
Estudiantes inscritos en el BTH en los establecimientos participantes en el programa	Estudiantes		2013	P A	26.000,00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Apoyo a la Gestión comunitaria, institucional y pedagógica de la ESCP</b>									
Diagnosticos participativos de necesidades, potencialidades y vocaciones productivas municipales elaborados.	Diagnosticos				52,00				188.000,00
Maestros de Secundaria reconvertidos en educación técnica y tecnológica	Docentes				1.000,00				212.000,00
Formación Profesional de egresados y titulados de carreras técnicas tecnológicas en el modelo Educativo Socio Comunitario Productivo	Docentes				1.000,00				412.000,00
<b>Construcción y Equipamiento para el BTH</b>									
Estudios de Preinversión de los Centros Tecnológicos Educativos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz	Estudios de Preinversión				3,00				120.000,00
Estudios de Preinversión de los Centros de Formación Integral Técnica Humanística	Estudios de Preinversión				14,00				420.000,00
Centros Tecnológicos Experimentales (CTES) de La Paz (El Alto), Cochabamba y Santa Cruz construidos	CTES				3,00				2.724.223,00
Centros de Formación Integral Técnica Humanística (CEFITHs) construidos	CEFITHs				14,00				11.451.300,00
Centros Tecnológicos Experimentales El Alto, Cochabamba y Santa Cruz equipados	CTEs				3,00				10.787.250,00
Centros de Formación Integral Técnica Humanística equipados	CEFITHs				14,00				7.700.000,00
Núcleos Educativos (Nes) en áreas rurales equipados.	NEs				38,00				3.572.747,00
Gastos Operativos FPS (5%) por la actividad de construcción de los CTE y CEFITH	N/A								746.080,00
<b>Sistema de monitoreo y evaluación del BTH</b>									
Línea de Base realizada	Línea de Base				1,00				100.000,00
Sistema de Información Educativa SIE complementada con información sobre especialidades tecnológicas productivas, comunidades, y otros del BTH	Sistema				1,00				90.000,00
Evaluación de los procesos de formación de maestros	Informe				1,00				100.000,00
Evaluación final de carácter cuantitativo y cualitativo de las estrategias de implementación del BTH	Informe				1,00				120.000,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BO-L1071 - Educación Secundaria Comunitaria Productiva  
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 01/04/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Evaluación de impacto del Programa	Informe				1,00				100.000,00
<b>Adminitración y Gestión del Programa</b>									
Unidad de Gestión del Programa	N/A								741.600,00
Auditoría	N/A								200.000,00
Gastos Operativos	N/A								214.800,00
<b>TOTAL</b>									<b>40.000.000,00</b>
