
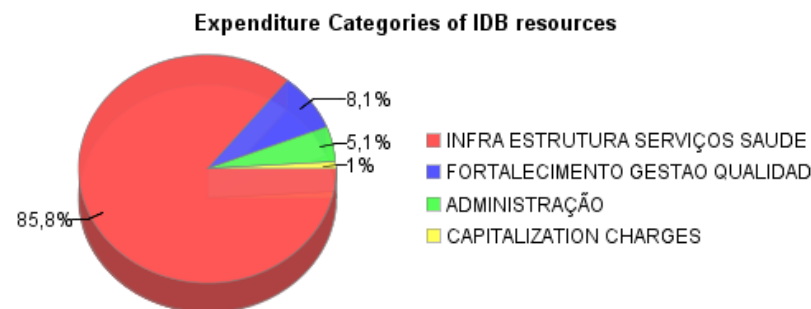
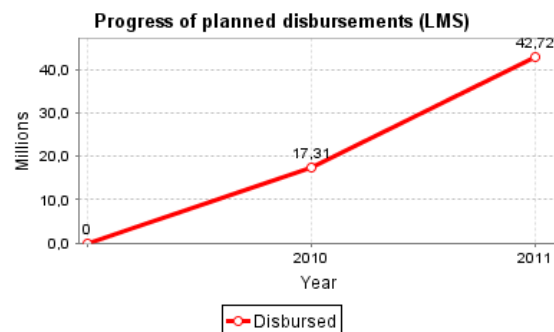



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Loan Number(s):	2137/OC-BR	Current Approved Amount:	77.000.000,00	Original IDB:	77.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	37.031.757,64	Current IDB:	77.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	48,09	Pari-passu:	62,00
Related Operation(s):		Balance:	39.968.242,36	Co-Financing/Country:	46.470.600,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	123.470.600,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 20, 2011 Validated by Country Representative: Sep 27, 2011

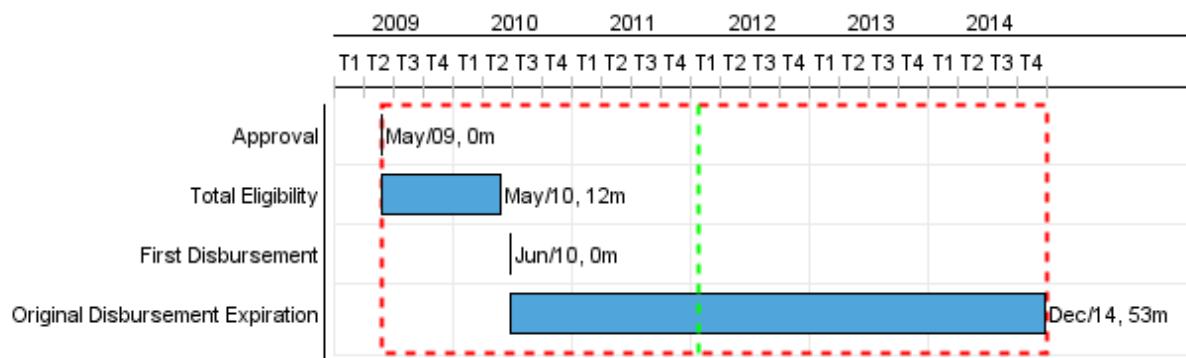

Accumulated Progress as of 2011

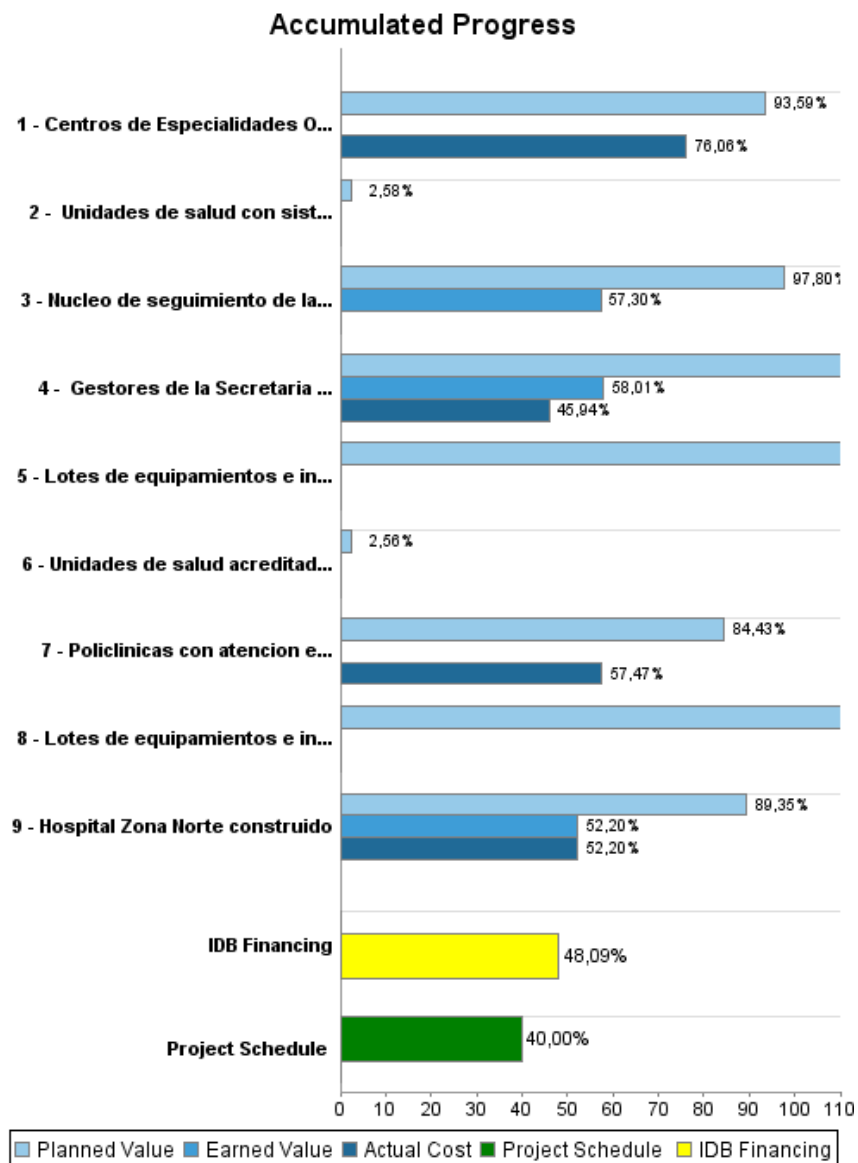

Outcomes

Outcome:	Disponibilidad de servicios de salud de nivel secundario y terciário expandida (acceso).
Comments:	A partir del ejercicio de marzo de 2010 entre SPD y SPH, se ha optado por añadir algunos indicadores de outcomes (de acceso y de calidad) no previstos en la matriz de resultados original del Programa. El ejecutor esta de acuerdo en incluírselos para el seguimiento del Programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	End of project
Cobertura de consultas especializadas	Porcentaje	20,00	2007	P A	25,00	30,00	30,00
Transferências obstétricas y de UTI neonatal solicitadas de la Macro Region de Sobral para Fortaleza.	numero de transferências	564,00	2008	P A	480,00	113,00	113,00

Outcome:	Servicios especializadas de salud con calidad mejorada.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2014	End of project
Promedio de tiempo de espera para consultas especializadas	numero de dias	90,00	2010	P A	60,00	30,00	30,00
Proporcion de mujeres mayores de 40 anos que reciben una mamografia al año	%	3,57	2008	P A	5,50	7,00	7,00
Proporção de consultas especializadas realizadas en las Policlinicas que fueron referenciadas de la atención básica	%		2011	P A	80,00	80,00	80,00
Taxa de infeccion intra hospitalaria (de los Hospitais Regionais do Cariri e Norte) en comparacion al Promedio del estado.	percentual de casos		2011	P A	90,00	70,00	70,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Expansión de los servicios especializados de salud.									
Hospital Zona Norte construido	Hospital				1,00	34.248.000,00	11.691.000,00		52.800.371,00
Policlinicas con atención especializado construidas	Personas	6,00			9,00	17.743.000,00	6.167.000,00		30.491.085,00
Centros de Especialidades Odontologicas (CEOs)	Personas	9,00			11,00	3.315.000,00	1.671.000,00		6.961.398,00
Lotes de equipamientos e instrumental quirurgico y mobiliario para CEOS comprados y en funcionamiento	Lotes	20,00			25,00	6.394.000,00			3.394.000,00
Lotes de equipamientos e instrumental quirurgico para el Hospital Zona Norte comprados y en funcionamiento.	Lotes				98,00	32.818.000,00			12.500.000,00
Fortalecimiento institucional da gestão da SESA e dos serviços de saúde.									
Gestores de la Secretaria de Estado de Salud (SESA) y de las unidades de salud capacitados.	numero d gestores	56,00			310,00	389.000,00	25.000,00		777.083,00
Unidades de salud con sistema de gestion integrada establecido.	unidades de salud				21,00	130.000,00			5.043.882,00
Nucleo de seguimiento de la calidad y supervisión de las nuevas unidades de salud establecido.	nucleo	1,00	1,00		1,00	283.000,00			493.882,00
Unidades de salud acreditadas o certificadas.	numero de certificaciones				13,00	90.000,00			3.513.953,00
Administración del Programa.									
TOTAL						95.410.000,00	19.554.000,00		115.975.654,00
