



Fondo Multilateral de Inversiones  
Miembro del Grupo BID

# REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO ENERO 2015 - JUNIO 2015

## SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Armonización de normas internacionales de contabilidad y de auditoría

Nro. Proyecto: BR-M1067 - Proyecto No.: ATN/ME-12645-BR

**Propósito:** Adoção oportuna e contínua das NIIF e NIA e a aplicação das mesmas pelas empresas brasileira de todos os portes.

**País Administrador**

BRASIL

**País Beneficiario**

BRASIL

**Grupo**

FCD - Sector financiero y mercado de capitales

**Subgrupo**

AUST - Normas de contabilidad y auditoría

**Agencia Ejecutora:**

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil


**Líder equipo de diseño:**

MARIA ELENA NAWAR



**Líder equipo de supervisión:**

LUCIANO SCHWEIZER


## CICLO DEL PROYECTO

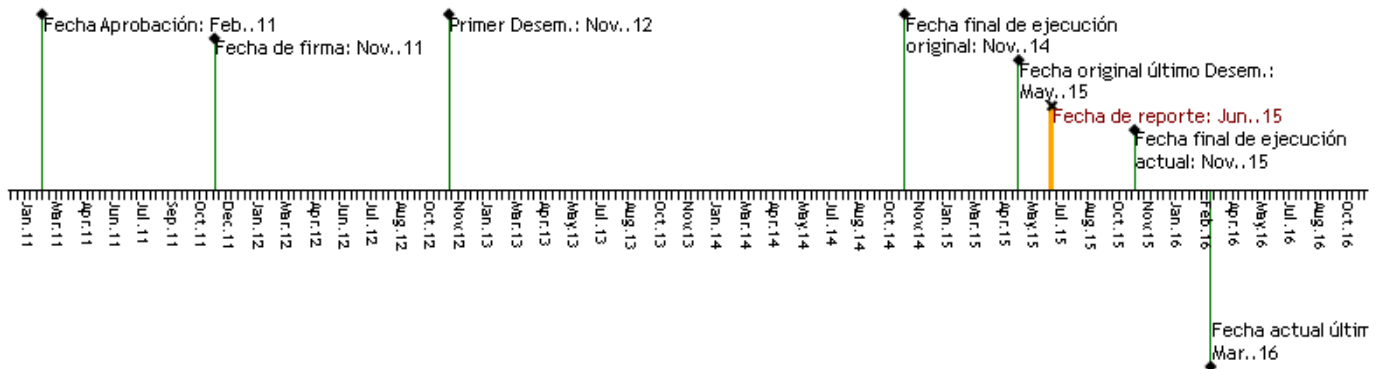


## RECURSOS

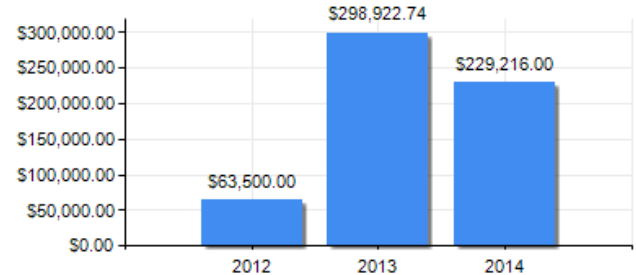

## PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Promedio FOMIN: 2.722

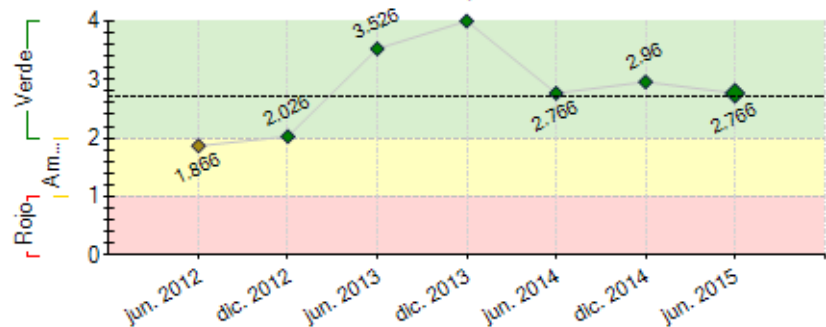

----- Promedio desempeño FOMIN

## RIESGOS EXTERNOS


### CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera:

Adquisiciones:

Capacidad Técnica:

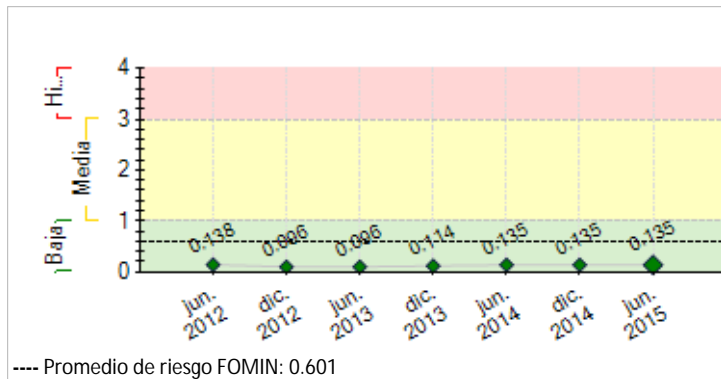

## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O processo de convergência às novas Normas Internacionais de Contabilidade e de Auditoria é um processo permanente, que tem demandado esforços ativos do Ibracon e dos demais parceiros desse Projeto, em especial, do CPC. Além disso, o Brasil tem apoiado tempestivamente a Fundação IFRS e o IFAC na elaboração de novas normas, através da participação no envio de respostas a todas às suas audiências públicas. Dessa forma, o Brasil tem deixado rapidamente a posição passiva que ocupava no início do processo de convergência, passando a ter uma posição de destaque nas decisões que afetam todo o mercado, no que diz respeito aos relatórios financeiros. Nesse sentido, através de esforços conjuntos, foram emitidos 48 CPCs, 20 ICPCs, 8 OCPCs, 8 Revisões Técnicas de Pronunciamentos e 16 NBC TAs, o que demonstra o empenho e comprometimento dos parceiros do Projeto e que possibilitou alcançarmos resultados antecipados nos itens C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3 e C.1.1.4, do Plano de Convergência. Outro ponto de destaque é que a IFRS PME foi aprovada e seu guia de aplicação disponibilizado. Percebeu-se ao longo da execução do Projeto que seria necessária a prorrogação de seu prazo, dado o alcance e a possibilidade de conseguirmos mais participantes no processo de capacitação on-line em IFRS e NIA, bem como promover novas ações em todos os Componentes, visando à sustentabilidade do Projeto e sua internacionalização com a criação de um novo projeto que durará até maio de 2016.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Nesta fase final do projeto, a execução estará dedicada ao intercâmbio com países da região, na tentativa de transferência de conhecimento, juntamente com instituições representativas no tema. Projeto com desempenho satisfatório. Objetivos, metas e indicadores com alcance programado, produção e disseminação de conhecimento e capacitação de profissionais. Os resultados alcançados permitiram ao Projeto a conquista de premiações, o que fortalece o reconhecimento no seu campo de atuação. Os módulos de capacitação a distância tem alcançado o atendimento de profissionais em praticamente todos os estados. O projeto tem recebido demandas de instituições do setor, relacionados a necessidades específicas de atendimento, em especial empresas startup, de tecnologia, que requerem convergência às normas.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Normas importantes foram divulgadas pelo IASB como, por exemplo, a IFRS 15 sobre Receitas, em maio de 2014, que altera de forma significativa o reconhecimento das Receitas. Já foram adotadas medidas pelo Ibracon para a tradução dessa norma e sua incorporação no próximo livro de IFRS, que é usado como base para a emissão de pronunciamentos contábeis no Brasil. Como parte do projeto de harmonização contábil (Componente II do Projeto), neste segundo semestre de 2014, houve a inclusão de 19 turmas de professores todos os Estados. O total de professores do projeto, nessas turmas, atingiu a marca de 1000 participantes. As turmas para capacitação de preparadores (profissionais) foram criadas, com foco nos profissionais de PMEs e já possui mais de 200 matriculados, com expectativa de mais 300 participantes para o primeiro semestre de 2015. Adicionalmente, em julho 2014, o projeto foi premiado pela Blackboard como exemplo de iniciativa de capacitação on-line, cerimônia realizada nos USA, sendo o único país latino americano a receber tal honraria. No que tange o Componente III (Difusão), foram emitidas duas edições da Revista Transparência e premiados os melhores trabalhos e artigos nos Prêmios Transparência Universitário e Jornalismo, com viagem à Londres para conhecer o IASB e participar da reunião mundial dos países que adotam as IFRS (World Standard Setters Meeting) e do fórum mundial de IFRS realizado em Londres, premiações que são contrapartidas do Ibracon ao Projeto.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Adoção oportuna e contínua das NIIF e NIA e a aplicação das mesmas pelas empresas brasileira de todos os portes.	R.1	Percentual das NIIF emitidas pelo CPC adotadas pelos reguladores (CFC, CVM, BACEN, SUSEP).	0			100	100	
			Dic. 2011			Jun. 2015	Dic. 2012	
	R.2	Percentual das NIAs emitidas pelo IBRACON e CFC adotadas pelos profissionais das firmas auditoras.	0			100	100	
			Dic. 2011			Jun. 2015	Jun. 2012	
	R.3	Percentual das empresas participantes do mercado de capitais e do sistema financeiro que preparam suas demonstrações financeiras consolidadas aplicando as NIIFs e são auditadas em base às NIAs.	0	80		100	100	
			Dic. 2011	Jun. 2014		Jun. 2015	Dic. 2010	
	R.4	Percentual de PMEs apoiadas pelo Sebrae que tem acesso a serviços de contabilidade e auditoria baseadas nas NIIFs para PMEs.	0	2		5	0	
			Dic. 2011	Dic. 2013		Jun. 2015	Jun. 2012	
<b>Componente 1: Plano de convergência</b>								
<b>Peso:</b> 30%	C1.11	Percentual das NIIFs e NIAs traduzidas.	0			100	100	Finalizado
			Dic. 2011			Jun. 2012	Dic. 2012	
	C1.12	Percentual das Normas Internacionais revisadas e homologadas [38 Normas, 16 IFRICs E 11 NIAs].	0			100	100	Finalizado



Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Foi criado um hot site permanente para que os professores e profissionais que participaram dos treinamentos possam, após a conclusão dos cursos, interagir. A ideia é que possam trocar materiais, experiências e, sobretudo, se manter atualizados.

### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

*[No se encontraron lecciones aprendidas]*
