
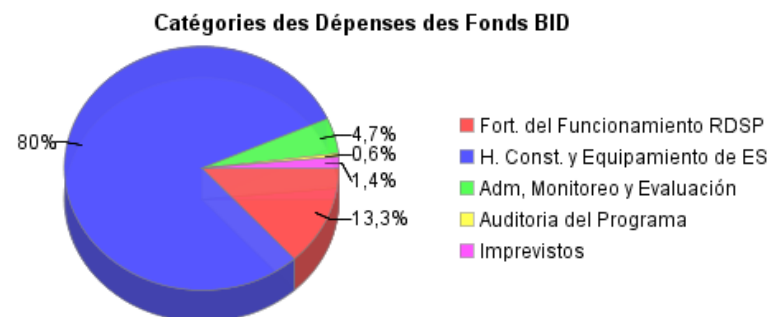
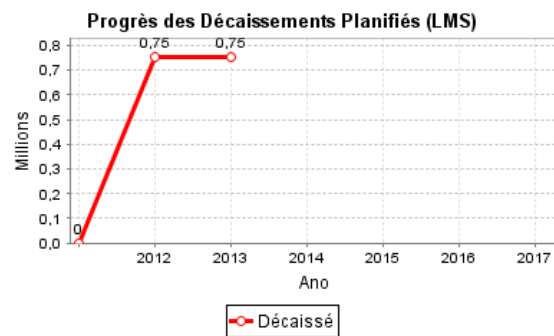



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA				
Secteur:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Numéro(s) de Prêt(s):	2614/BL-BO	Montant Courant Approuvé:	35.000.000,00	Initial BID:	35.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	750.000,00	Courant BID:	35.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	2,14	Pari Passu:	83,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-T1145	Solde:	34.250.000,00	Cofinancement/Pays:	7.270.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	42.270.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	276

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2013 Validé par le Représentant: 25-sep-2013

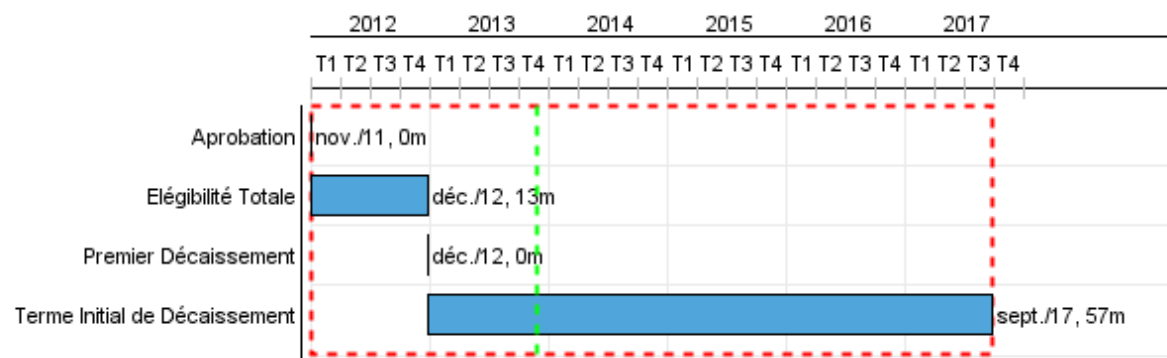

Progrès Cumulé à 2013

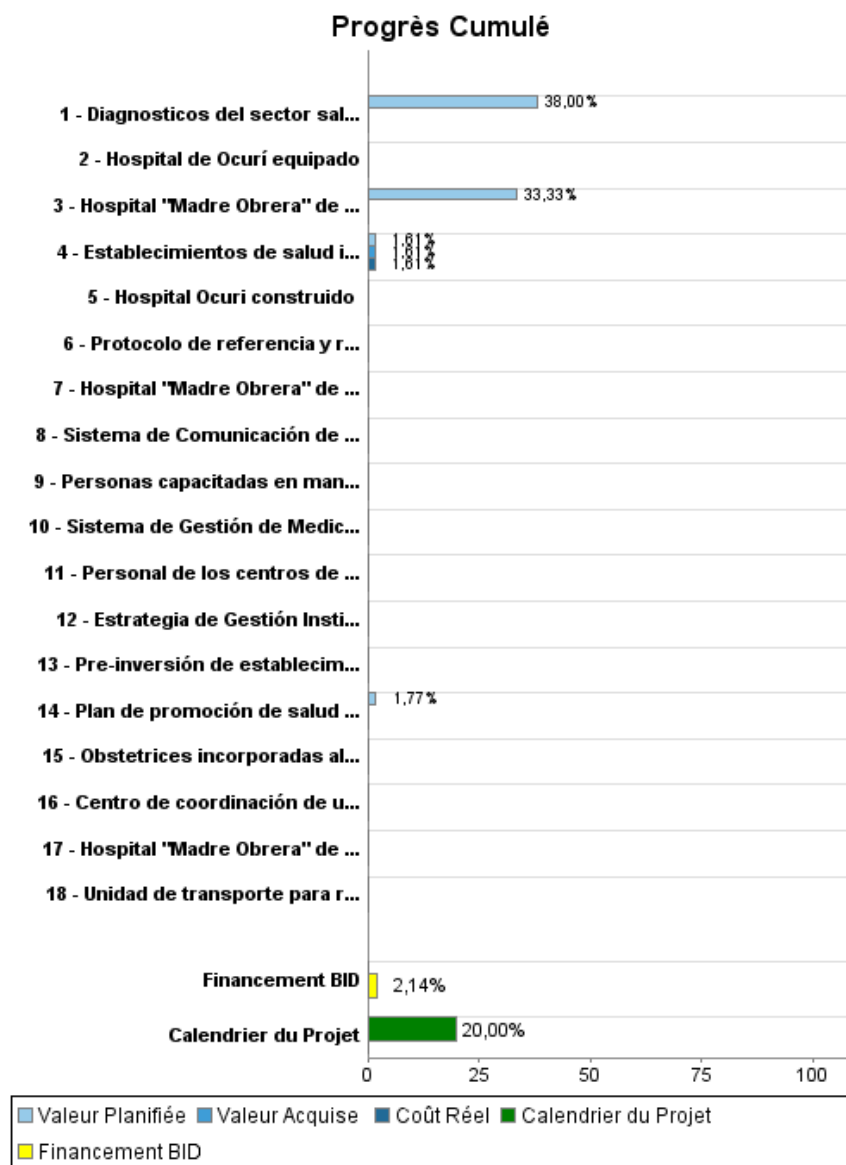

Résultats

Résultat:	Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin du Projet
Cobertura de Parto Institucional	porcentaje	36,00	2010	P						55,00
				A						
Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56,00	2010	P						80,00
				A						
Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10,00	2011	P						50,00
				A						
Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número		2011	P						200,00
				A						
Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Personas	50,00	2011	P						200,00
				A						
Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Personas		2012	P		500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	5.000,00
				A						

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosi									
Diagnosticos del sector salud realizados.	Estudio	1,00			3,00	38.000,00			100.000,00
Plan de promoción de salud implementado	Plan				1,00	18.000,00			1.018.000,00
Obstetricas incorporadas al sistema de salud	Personas				30,00				190.000,00
Personal de los centros de primer nivel capacitado	Personas				200,00				200.000,00
Sistema de Comunicación de referencias y urgencias implementado	Sistema				1,00				500.000,00
Protocolo de referencia y retorno elaborado y/o adecuado	Documento				1,00				25.000,00
Unidad de transporte para referencias y urgencias incorporada	Unidad				1,00				450.000,00
Estrategia de Gestión Institucional de la Red Departamental implementada	Estrategia				1,00				1.294.000,00
Personas capacitadas en mantenimiento de equipo médico-industrial, gestión financiera-administrativa y/o gestión de infraestructura y personal	Personas				90,00				200.000,00
Sistema de Gestión de Medicamentos implementado	Sistema				1,00				48.000,00
Inversiones en infraestructura y equipamiento									
Hospital "Madre Obrera" de Llallagua diseñado	Hospital				1,00	100.000,00			300.000,00
Hospital "Madre Obrera" de Llallagua construido	Hospital				1,00				5.830.000,00
Hospital "Madre Obrera" de Llallagua equipado	Hospital				1,00				5.106.000,00
Pre-inversión de establecimientos de salud realizada	Documento				1,00				10.000,00
Hospital Ocuri construido	Hospital				1,00				3.600.000,00
Hospital de Ocuri equipado	Hospital				1,00				2.400.000,00
Establecimientos de salud intervenidos	Establecimiento o				11,00		133.136,81		8.249.185,00
Centro de coordinación de urgencias construido	Centro				1,00				450.000,00
Administración y/o fortalecimiento institucional FPS	N/A					5.000,00			2.074.815,00
Administracion y Monitoreo									
Auditorias	N/A								200.000,00
Imprevistos	N/A								995.000,00
Administración y/o fortalecimiento institucional MSD y SEDES	N/A					30.000,00	14.312,00		660.000,00

RAPPORT DE SUIVI

BO-L1067 - Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi
2013 1^o período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 13/09/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Monitoreo y evaluación	N/A								1.100.000,00
TOTAL						191.000,00	147.448,81		35.000.000,00
