



Operation Number: **UR-L1071**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**  
Last Update: **3/27/2015**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/10/2015**  
Division Chief validation date: **04/23/2015**  
Country Representative validation date: **04/24/2015**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Program to Support Future Entrepreneurs	Loan Number:	2775/OC-UR
Executing Agency (EA):	Agencia Nacional de Investigación e Innovación		
Team Leader:	Angelelli,Pablo Javier	Sector/Subsector:	ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	URUGUAY
Borrower:	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		
		Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
UR-L1071	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
UR-L1071	\$8,000,000.00	\$2,318,181.07	28.98%	\$5,681,818.93


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

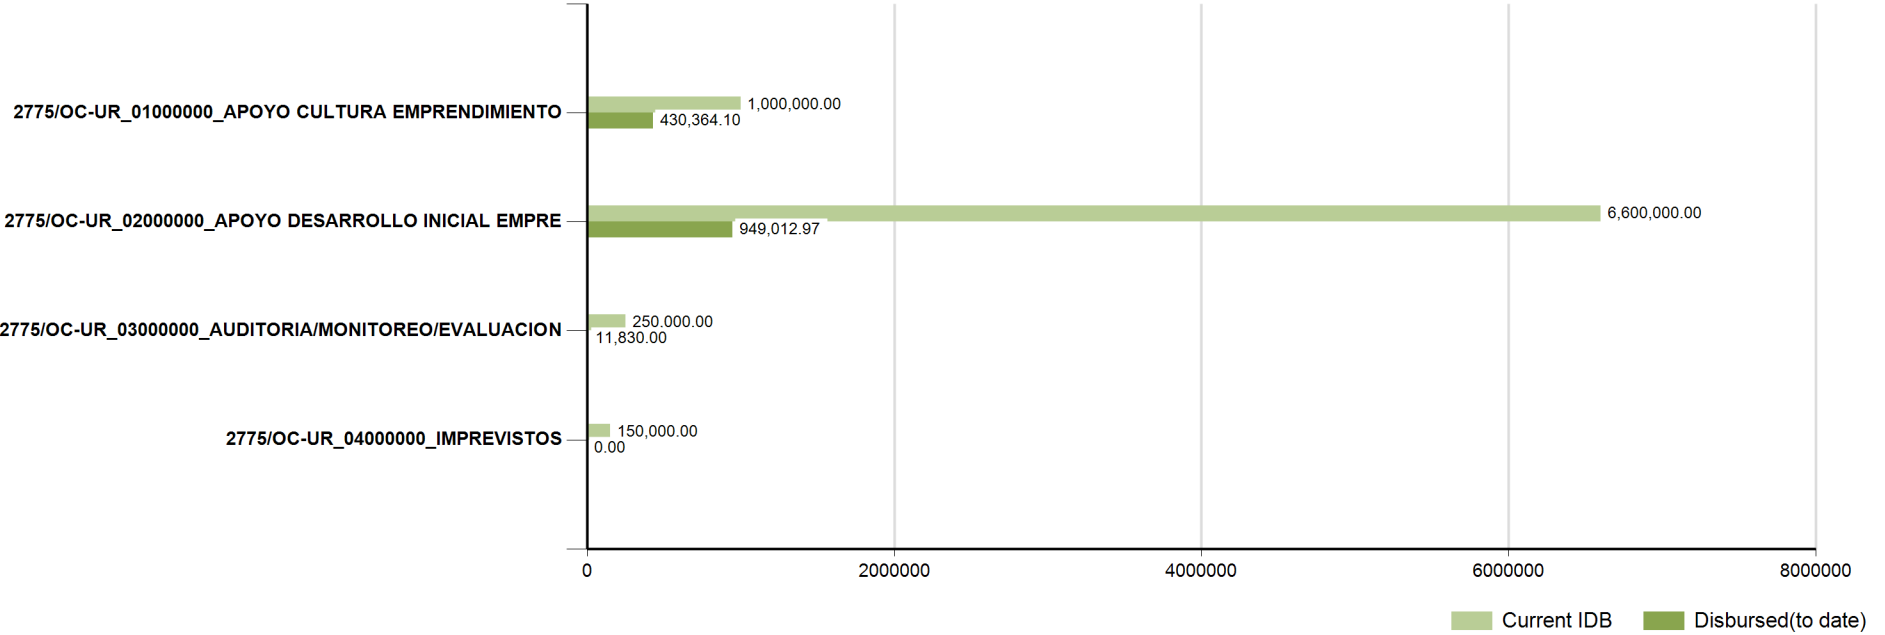

## Results Matrix

## Impacts

Impact:	1 Inversión en innovación en empresas de menos de 5 años.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 1. Inversión en innovación en empresas de menos de 5 años.		Miles Pesos	1,009,300.00	2009	Fuente: Encuesta de Actividades de Innovación (EAI) Industria y Servicios ANII.	Para la línea de base se utilizó la EAI 2007-2009. Para la meta 2017 se utilizará la EAI 2016-2018. Como estimación preliminar en el 2017 se puede calcular la inversión directa en innovación realizada por los beneficiarios del programa.	P	1,059,765.00
							P(a)	1,059,765.00
							A	

RF - RF Indicator   SI - Sector Indicator   CI - Country Indicator   PG - Pro-Gender   PE - Pro-Ethnicity

## Outcomes

Outcome:	1 Apoyo a la cultura de emprendimiento.									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015			EOP
1.1 1. Porcentaje de la población de 18 a 64 años que está emprendiendo o es dueño-gerente de un nuevo negocio por oportunidad.		Porcentaje	8.72	2010	Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.		P		9.15	
							P(a)		9.15	
							A			
1.2 2. Porcentaje de mujeres en la población de 18 y 64 años que está emprendiendo o es dueño gerente de un nuevo negocio.		Porcentaje	8.12	2010	Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.		P		8.52	
							P(a)		8.52	
							A			

1.3 3. Porcentaje de la población entre 18 y 64 años que considera que el emprendedorismo es una opción de carrera deseable.		Porcentaje	67.13	2010	Base de datos del GEM. La línea de base es el promedio del indicador para el período 2006-2010.		P		70.50	
							P(a)		70.50	
							A			
Outcome:	2 Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015			EOP
2.1 4. Nuevas empresas exitosas creadas y/o aceleradas por el programa.		Empresas	0.00	2012	Fuente: Base de datos de empresas apoyadas e incubadas.	Las empresas consideradas exitosas son las empresas apoyadas por el programa que logran al menos cuatro empleos, ventas anuales superiores a US \$30.000 y que realizan gastos en innovación.	P	10.00		50.00
							P(a)	10.00		50.00
							A			
2.2 5. Inversión privada movilizada por el programa hacia emprendimientos.		Dólares	0.00	2012	Fuente: Base de datos de las incubadoras.		P	600,000.00		1,000,000.00
							P(a)	600,000.00		1,000,000.00
							A			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

C.1. Apoyo a la cultura de emprendimiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Número de proyectos de fomento del emprendimiento financiados a las instituciones de la Red Emprender.	Informe	P	8.00	40.00	P	64,400.00	301,600.00
		P(a)	8.00	47.00	P(a)	64,400.00	301,527.00
		A	26.00	39.00	A	144,927.00	195,927.00
Personas sensibilizadas y capacitadas para emprender	personas	P	2,000.00	10,000.00	P	63,001.00	300,000.00
		P(a)	2,000.00	10,062.00	P(a)	63,001.00	300,000.00
		A	3,122.00	5,262.00	A	177,613.00	204,613.00
Número de reuniones de la Red Emprender realizadas.	Reuniones	P	1.00	5.00	P	102,480.00	400,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	102,480.00	399,280.00
		A	1.00	2.00	A	109,280.00	184,280.00
C.2 Apoyo al desarrollo inicial de emprendimientos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Número de empresas admitidas en incubadoras apoyadas por el programa.	Empresas	P	16.00	82.00	P	388,560.00	1,700,000.00
		P(a)	16.00	93.00	P(a)	388,560.00	1,699,614.00
		A	5.00	6.00	A	403,614.00	517,614.00
Número de proyectos de emprendedores del exterior apoyados para su instalación en Uruguay.	Proyectos financiados	P	5.00	20.00	P	251,890.00	1,200,000.00
		P(a)	5.00	20.00	P(a)	251,890.00	1,200,000.00
		A	6.00	6.00	A	183,391.00	208,391.00
Número de proyectos de puesta en marcha y despegue empresarial financiados.	Proyectos financiados	P	21.00	108.00	P	577,500.00	3,000,000.00
		P(a)	21.00	108.00	P(a)	577,500.00	3,000,000.00
		A	15.00	22.00	A	458,549.00	527,549.00
Número de proyectos de apoyo a la gestión de fondos de inversión financiados.	Proyectos financiados	P	2.00	4.00	P	75,000.00	400,000.00
		P(a)	2.00	4.00	P(a)	75,000.00	399,990.00
		A	3.00	3.00	A	161,700.00	161,700.00
C.3 Administración, Monitoreo y Evaluación							

Other Cost		2014	Cost
Administración, Monitoreo y Evaluación	P	\$40,000.00	\$400,000.00
	P(a)	\$40,000.00	\$400,000.00
	A	\$7,990.00	\$11,990.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$1,562,831.00	\$7,701,600.00
	P(a)	\$1,562,831.00	\$5,691,381.00
	A	\$1,647,064.00	\$2,012,064.00

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output		Número de empresas admitidas en incubadoras apoyadas por el programa.	Modify Physical P(a) value	Replanificación, según progreso físico a fines de 2014.	3/27/2015	3/25/2015
Output		Número de proyectos de apoyo a la gestión de fondos de inversión financiados.	Modify Financial P(a) value	Replanificación, según progreso financiero a fines de 2014.	3/25/2015	3/25/2015
Output		Número de empresas admitidas en incubadoras apoyadas por el programa.	Modify Financial P(a) value	Replanificación, según progreso financiero a fines de 2014.	3/25/2015	3/25/2015

Output	Número de reuniones de la Red Emprender realizadas.	Modify Financial P(a) value	Replanificación, según progreso financiero a fines de 2014.	3/25/2015	3/25/2015
Output	Número de proyectos de fomento del emprendimiento financiados a las instituciones de la Red Emprender.	Modify Financial P(a) value	Replanificación, según progreso financiero a fines de 2014.	3/25/2015	3/25/2015
Output	Personas sensibilizadas y capacitadas para emprender	Modify Physical P(a) value	Replanificación, según progreso físico a fines de 2014.	3/25/2015	3/25/2015
Output	Número de proyectos de fomento del emprendimiento financiados a las instituciones de la Red Emprender.	Modify Physical P(a) value	Replanificación, según progreso físico a fines de 2014.	3/25/2015	3/25/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
