



Operation Number: **CH-L1061**  
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**  
Last Update: **7/10/2014**  
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **07/10/2014**  
Division Chief validation date: **07/11/2014**  
Country Representative validation date: **07/11/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Apoyo para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior	Loan Number:	2539/OC-CH
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA		
Team Leader:	Robert,Carolyn	Sector/Subsector:	TD
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	CHILE
Borrower:	REPUBLICA DE CHILE	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CH-L1061	\$7,562,600.00	\$7,562,600.00	\$3,427,700.00	\$0.00	\$10,990,300.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CH-L1061	\$7,562,600.00	\$4,971,180.30	65.73%	\$2,591,419.70


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

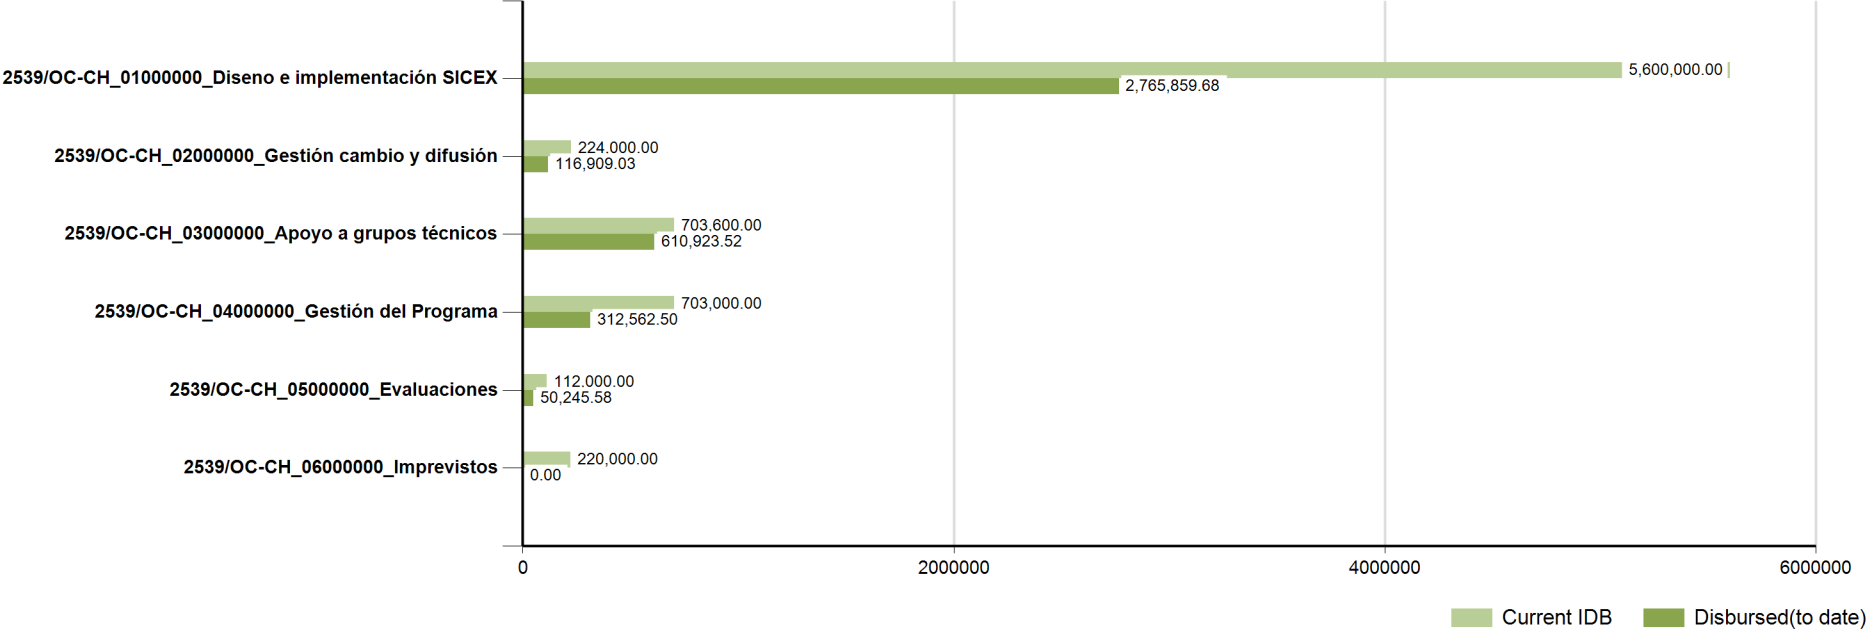

## Results Matrix

## Impacts

<b>Impact:</b>	1 Mayor eficiencia en la gestión del comercio exterior y reducción de la brecha con las economías desarrolladas.							
<b>Observation:</b>								
<b>Indicators</b>	<b>Flags*</b>	<b>Unit of Measure</b>	<b>Baseline</b>	<b>Baseline Year</b>	<b>Means of verification</b>	<b>Observations</b>	<b>EOP</b>	
1.1 Doing Business Report del Banco Mundial		días	21.00	2011			<b>P</b>	18.00
							<b>P(a)</b>	18.00
							<b>A</b>	

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

## Outcomes

<b>Outcome:</b>	1 Todos los servicios públicos vinculados directamente con las operaciones de comercio exterior participan del SICEX											
<b>Observation:</b>												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	2015	EOP
1.1 Servicios públicos participantes del SICEX		# Agencias	0.00	2011	Portal Unico para la tramitacion de todas las operaciones de comercio exterior		P	6.00	11.00	15.00	19.00	19.00
	P(a)						6.00	11.00	15.00	19.00	19.00	
	A											
<b>Outcome:</b>	2 Creciente porcentaje de operadores de comercio exterior poseen conocimiento del SICEX.											
<b>Observation:</b>												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	2015	EOP
2.1 Porcentaje de exportadores con conocimiento del SICEX		%	0.00	2011	Encuesta		P	50.00	70.00	90.00		90.00
	P(a)						50.00	70.00	90.00		90.00	
	A						25.00					
2.2 Porcentaje de importadores con conocimiento del SICEX		%	0.00	2011			P		50.00	70.00	90.00	90.00
	P(a)							50.00	70.00	90.00	90.00	
	A											
<b>Outcome:</b>	3 Porcentaje creciente de operaciones de comercio exterior y de su valor se realizan a través del SICEX											
<b>Observation:</b>												

<b>Outco</b>	3 Porcentaje creciente de operaciones de comercio exterior y de su valor se realizan a través del SICEX
--------------	---

Observ	
--------	--

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	EOP		
3.1 Porcentaje de operaciones de exportación que se realizan a través de SICEX			%	0.00	2011			P	10.00	50.00	70.00	95.00	95.00	
								P(a)	10.00	50.00	70.00	95.00	95.00	
								A						
3.2 Porcentaje de operaciones de importación que se realizan a través del SICEX			%	0.00	2011			P		10.00	50.00	70.00	70.00	
								P(a)		10.00	50.00	70.00	70.00	
								A						
3.3 Porcentaje de utilización del SICEX según valor de exportaciones			%	0.00	2011			P	20.00	40.00	70.00	90.00	90.00	
								P(a)	20.00	40.00	70.00	90.00	90.00	
								A						
3.4 Porcentaje del valor de importaciones que se realizan a través del SICEX			%	0.00	2011			P		20.00	40.00	70.00	70.00	
								P(a)		20.00	40.00	70.00	70.00	
								A						
Outcome:	4 Disminución tiempo requerido para operaciones de comercio exterior.													
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	EOP		
4.1 Días para concretar exportaciones			días	6.00	2011	Encuesta		P					3.00	
								P(a)						3.00
								A						
4.2 Días requeridos para concretar importaciones			días	5.00	2011			P					2.50	
								P(a)						2.50
								A						
Outcome:	5 Disminución costos operacionales de trámites de comercio exterior													
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	EOP		
5.1 Costo de operación que no necesita visto bueno adicional			US \$/trámite	7.70	2011	Encuesta		P					3.85	
								P(a)						3.85
								A						
5.2 Costo de operación que sí necesita visto bueno adicional			US \$/trámite	45.10	2011	Encuesta		P					22.55	
								P(a)						22.55
								A						

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Diseño e implementación SICEX		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Diseño Portal único central de SICEX	Software central	P	1.00	1.00	P		822,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	2,236,000.00	2,339,000.00
		A	1.00	1.00	A		2,183,000.00
Desarrollos en agencias del diseño SICEX	sistemas informáticos	P	7.00	15.00	P		801,039.00
		P(a)	7.00	8.00	P(a)	898,250.00	331,164.00
		A	5.00	5.00	A	38,000.00	331,164.00
Modulos piloto del portal único SICEX funcionando	Módulos portal	P	1.00	3.00	P		1,232,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	1,677,000.00	1,786,800.00
		A	1.00	1.00	A	105,800.00	105,800.00
Diseminación y gestión del cambio		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Estrategias de gestión y diseminación elaboradas	Estrategias	P	1.00	2.00	P		80,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)		21,700.00
		A	2.00	2.00	A	21,700.00	21,700.00
Campañas de difusión realizadas	Campañas	P	2.00	3.00	P		30,000.00
		P(a)	2.00	2.00	P(a)	124,000.00	
		A	2.00	2.00	A		
Funcionarios públicos capacitados	Funcionarios y Empresarios	P	36.00	54.00	P		30,000.00
		P(a)	36.00	96.00	P(a)	1,640.00	43,900.00
		A	96.00	96.00	A	5,000.00	7,900.00
Apoyo a grupos de técnicos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Consultorías de apoyo a grupos técnicos	consultorías individuales	P		14.00	P		348,478.00
		P(a)		27.00	P(a)	580,000.00	744,478.00
		A	5.00	27.00	A	249,000.00	597,478.00
Costos indirectos							

Other Cost		2013	Cost
Gestión del Programa	P		\$425,043.00
	P(a)	\$569,000.00	\$1,064,615.00
	A	\$225,000.00	\$491,615.00
Evaluaciones	P		\$52,501.00
	P(a)	\$66,000.00	\$111,170.00
	A	\$12,650.00	\$41,170.00
Auditorías	P		\$12,000.00
	P(a)	\$27,000.00	\$81,000.00
	A		
Gastos Financieros	P		\$37,870.00
	P(a)	\$75,000.00	\$801,970.00
	A	\$17,500.00	\$43,970.00
Imprevistos	P		\$0.00
	P(a)		
	A		

Total Cost		2013	Total Cost
	P		\$3,870,931.00
	P(a)	\$6,253,890.00	\$4,181,797.00
	A	\$674,650.00	\$3,823,797.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.
