



Operation Number: **CH-L1061**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2014**
Last Update: **4/3/2015**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **04/17/2015**
Division Chief validation date: **05/05/2015**
Country Representative validation date: **05/14/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Apoyo para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior	Loan Number:	2539/OC-CH
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA		
Team Leader:	Robert,Carolyn	Sector/Subsector:	TD
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	CHILE
Borrower:	REPUBLICA DE CHILE	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CH-L1061	\$7,562,600.00	\$7,562,600.00	\$3,427,700.00	\$0.00	\$10,990,300.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CH-L1061	\$7,562,600.00	\$5,927,611.03	78.38%	\$1,634,988.97


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

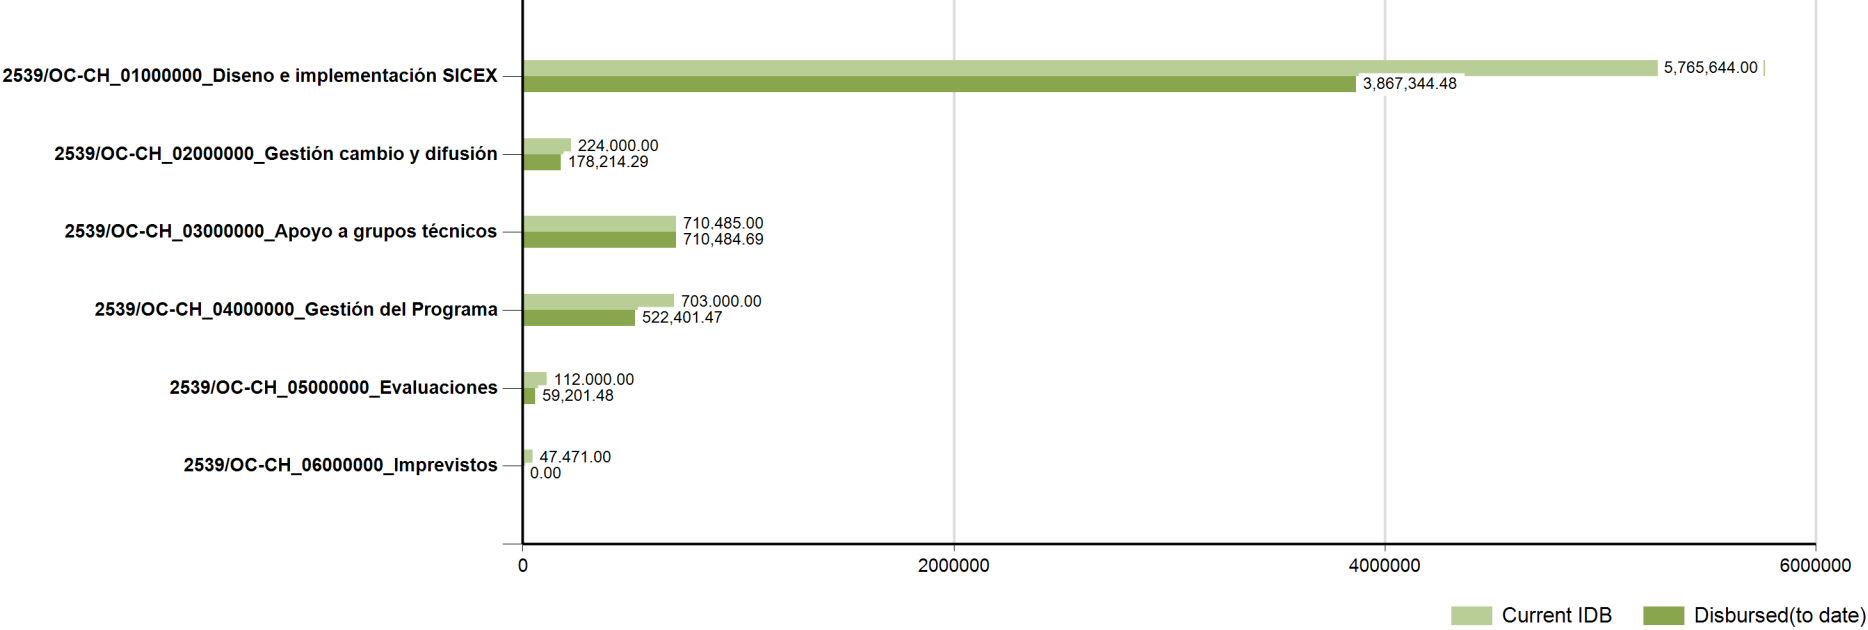

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	EOP	
3.1 Porcentaje de operaciones de exportación que se realizan a través de SICEX			%	0.00	2011	Informe preparado por SICEX		P	10.00	50.00	70.00	95.00	95.00
								P(a)	10.00	50.00	70.00	95.00	95.00
								A			0.01	0.00	
3.2 Porcentaje de operaciones de importación que se realizan a través del SICEX			%	0.00	2011	Informe preparado por SICEX		P		10.00	50.00	70.00	70.00
								P(a)		10.00	50.00	70.00	70.00
								A			0.00		
3.3 Porcentaje de utilización del SICEX según valor de exportaciones			%	0.00	2011	Informe preparado por SICEX		P	20.00	40.00	70.00	90.00	90.00
								P(a)	20.00	40.00	70.00	90.00	90.00
								A			0.24		
3.4 Porcentaje del valor de importaciones que se realizan a través del SICEX			%	0.00	2011	Informe preparado por SICEX		P		20.00	40.00	70.00	70.00
								P(a)		20.00	40.00	70.00	70.00
								A			0.00	0.00	
Outcome:	4 Disminución tiempo requerido para operaciones de comercio exterior.												
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	EOP	
4.1 Días para concretar exportaciones			días	6.00	2011	Encuesta		P					3.00
								P(a)				3.00	3.00
								A			0.00	0.00	
4.2 Días requeridos para concretar importaciones			días	5.00	2011	Encuesta		P					2.50
								P(a)				2.50	2.50
								A			0.00	0.00	
Outcome:	5 Disminución costos operacionales de trámites de comercio exterior												
Observation:													
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	EOP	
5.1 Costo de operación que no necesita visto bueno adicional			US \$/trámite	7.70	2011	Encuesta		P					3.85
								P(a)				3.85	3.85
								A			0.00	0.00	
5.2 Costo de operación que sí necesita visto bueno adicional			US \$/trámite	45.10	2011	Encuesta		P					22.55
								P(a)				22.55	22.55
								A			0.00	0.00	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Diseño e implementación SICEX		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Diseño Portal único central de SICEX	Software central	P		1.00	P		822,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	156,000.00	2,183,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	2,183,000.00
Desarrollos en agencias del diseño SICEX	sistemas informáticos	P	3.00	15.00	P		801,039.00
		P(a)	3.00	15.00	P(a)		1,004,270.00
		A	3.00	8.00	A	673,106.00	1,004,270.00
Modulos piloto del portal único SICEX funcionando	Módulos portal	P	1.00	3.00	P		1,232,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	1,677,000.00	3,946,240.00
		A	0.00	1.00	A	3,836,440.00	3,942,240.00
Diseminación y gestión del cambio		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Estrategias de gestión y diseminación elaboradas	Estrategias	P		2.00	P		80,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		80,000.00
		A	0.00	2.00	A	58,300.00	80,000.00
Campañas de difusión realizadas	Campañas	P		3.00	P		30,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		122,930.00
		A	1.00	3.00	A	122,930.00	122,930.00
Funcionarios públicos capacitados	Funcionarios y Empresarios	P		54.00	P		30,000.00
		P(a)		387.00	P(a)	20,000.00	47,900.00
		A	291.00	387.00	A	24,000.00	31,900.00
Apoyo a grupos de técnicos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Consultorías de apoyo a grupos técnicos	consultorías individuales	P		14.00	P		348,478.00
		P(a)		27.00	P(a)	115,000.00	1,239,490.00
		A	0.00	27.00	A	610,012.00	1,207,490.00
Costos indirectos							

Other Cost		2014	Cost
Gestión del Programa	P		\$425,043.00
	P(a)	\$384,000.00	\$1,649,000.00
	A	\$968,385.00	\$1,460,000.00
Evaluaciones	P		\$52,501.00
	P(a)	\$40,000.00	\$141,010.00
	A	\$69,840.00	\$111,010.00
Auditorías	P		\$12,000.00
	P(a)	\$27,000.00	\$100,670.00
	A	\$46,670.00	\$46,670.00
Gastos Financieros	P		\$37,870.00
	P(a)	\$171,000.00	\$661,210.00
	A	\$30,240.00	\$74,210.00
Imprevistos	P		\$0.00
	P(a)		\$0.00
	A		\$0.00

Total Cost		2014	Total Cost
	P		\$3,870,931.00
	P(a)	\$2,590,000.00	\$10,621,720.00
	A	\$6,439,923.00	\$10,263,720.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Producto	Consultorías de apoyo a grupos técnicos	Modify Financial P(a) value	Se han realizado cambios en base al reporte semestral del Organismo Ejecutor.	4/2/2015	4/2/2015
Producto	Funcionarios públicos capacitados	Modify Financial P(a) value	Se han realizado cambios en base al reporte semestral del Organismo Ejecutor.	4/2/2015	4/2/2015
Producto	Campañas de difusión realizadas	Modify Financial P(a) value	Se han realizado cambios en base al reporte semestral del Organismo Ejecutor.	4/2/2015	4/2/2015
Producto	Estrategias de gestión y diseminación elaboradas	Modify Financial P(a) value	Se han realizado cambios en base al reporte semestral del Organismo Ejecutor.	4/2/2015	4/2/2015
Producto	Modulos piloto del portal único SICEX funcionando	Modify Financial P(a) value	Se han realizado cambios en base al reporte semestral del Organismo Ejecutor.	4/2/2015	4/2/2015
Producto	Desarrollos en agencias del diseño SICEX	Modify Financial P(a) value	Se han realizado cambios en base al reporte semestral del Organismo Ejecutor.	4/2/2015	4/2/2015
Producto	Diseño Portal único central de SICEX	Modify Financial P(a) value	Se han realizado cambios en base al reporte semestral del Organismo Ejecutor.	4/2/2015	4/2/2015
Producto	Funcionarios públicos capacitados	Modify Physical P(a) value	Se han realizado cambios en base al reporte semestral del Organismo Ejecutor.	4/2/2015	4/2/2015
Producto	Campañas de difusión realizadas	Modify Physical P(a) value	Se han realizado cambios en base al reporte semestral del Organismo Ejecutor.	4/2/2015	4/2/2015
Producto	Desarrollos en agencias del diseño SICEX	Modify Physical P(a) value	Se han realizado cambios en base al reporte semestral del Organismo Ejecutor.	4/2/2015	4/2/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
