

# PROJECT STATUS REPORT

JULY 2011 - DECEMBER 2011

## SECTION 1: PROJECT SUMMARY

**PROJECT NAME:** Creating Sustainable Recycling Businesses in Bel Air, Port Au Prince

Project Number: HA-M1017 - Operation Number: ATN/ME-11476-HA


**Purpose:** The project's purpose is to promote and create sustainable micro and small enterprises around solid waste management in Bel Air.

Country Administrator	Beneficiary Country	Group	Subgroup
HAITI	HAITI	INF - Infrastructure and Public Services	PPPA - Public-Private Partnerships


**Executing Agency:** VIVA RIO

**Design Team Leader:** Persson, Svante  
**Supervision Team Leader:** Denize, Ralph


### TIMELINE



### FUNDS

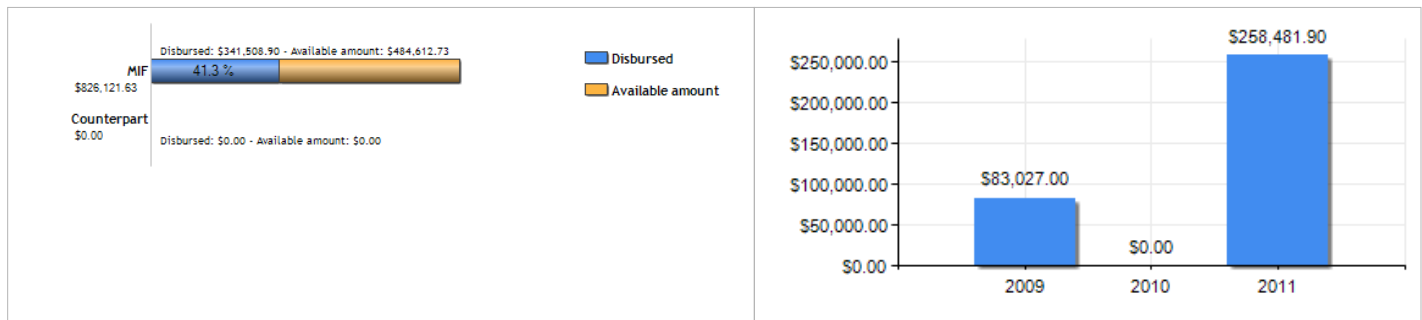


### PERFORMANCE SCORE

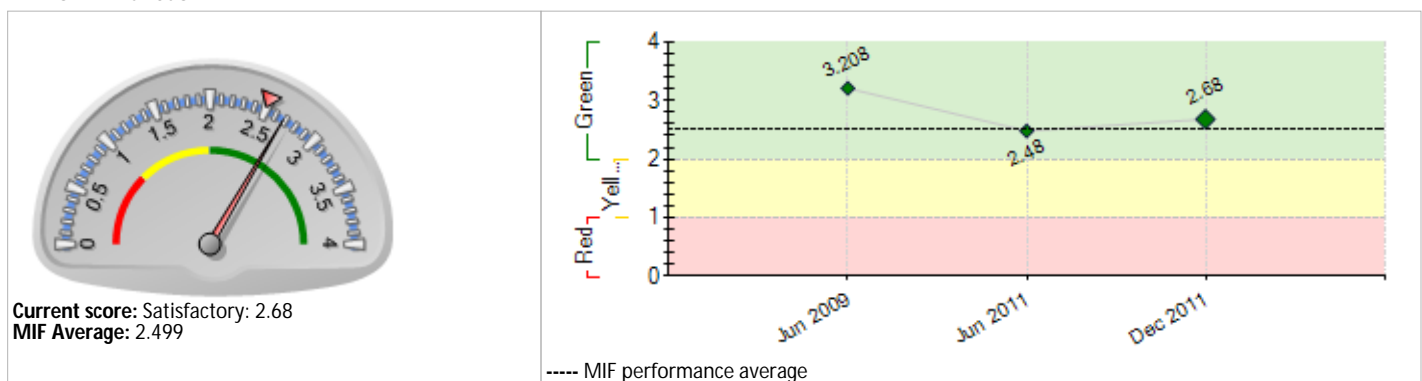

### EXTERNAL RISKS

### INSTITUTIONAL CAPACITY

**Risk**  
**Financial Management:** Low  
**Procurement:** Medium  
**Technical Capacity:** Medium

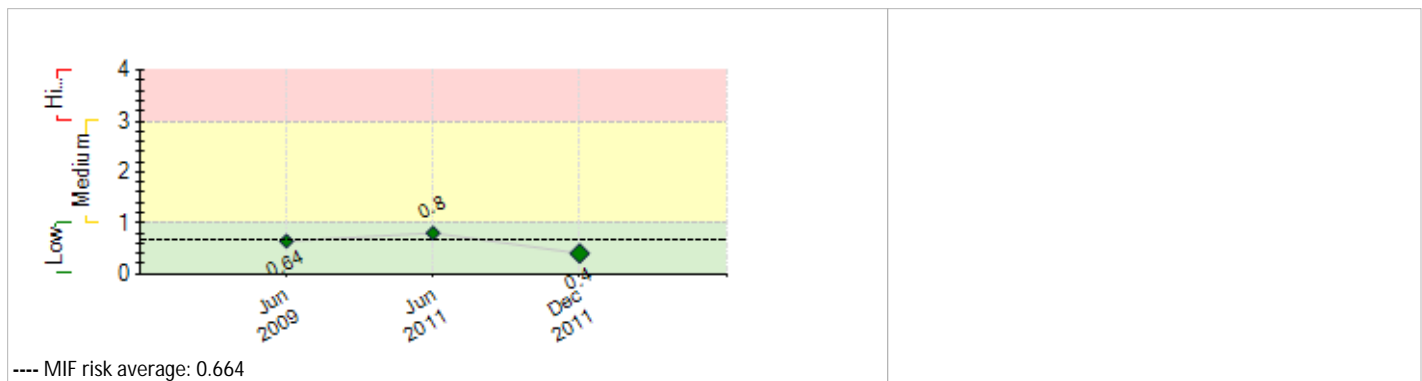

## SECTION 2: PERFORMANCE

### Summary of project performance since inception

Le projet a eu bon démarrage avec tous les documents exigés de base tels que les trois plans de travail et l'étude de base. Nous avons initié un centre d'incubation de création de micro entreprise et réaliser la construction d'un centre de formation professionnelles. Ces réalisations en accord avec notre milestone nous ont permis de former et entrainer plus de cinq cents personnes dont 200 (deux cents) sont déjà engagées dans activités génératrices de revenus et de créer 10 (dix) micro entreprises spécialisées dans la création de système de gestion de déchets solides, en commençant par les excréta humains.

Il importe également de souligner que suite au séisme du 12 janvier qui beaucoup a frappé la ville de Port-au-Prince et particulièrement la zone de grand Bel Air, la direction de Viva Rio, en vue de s'adapter aux nouveaux contexte et besoin, avait soumis au FOMIN un réaménagement du projet en mettant l'accent sur la formation professionnelle dans différentes disciplines en génie civil, en vue de contribuer à une plus grande participation dans la reconstruction du pays.

Le séisme nous a valu période morte d'un peu plus de douze mois au cours de laquelle la priorité a été accordée à l'exécution des projets d'urgence et la récupération de notre capacité de travail plus particulièrement la réhabilitation de notre centre d'opérations sis à Bel Air. Ce retard a affecté substantiellement le délai de réalisation des objectifs clés du projet. Aussi la coordination du projet a-t-elle envisagé l'extension de la durée d'exécution du projet pour une année supplémentaire.

Tenant compte de la nouvelle formulation du projet et des dispositions mises en place, les risques inhérents au projet s'avèrent jusque-là faibles. Par contre, le concept de partenariat public privé inaccoutumé en Haïti peut encore poser quelques difficultés dans sa compréhension et par conséquent influencer son implémentation.

La direction de Viva Rio entend renforcer l'impact du projet en insistant sur la formation en création de micro entreprises et la formation professionnelle. De ce fait elle envisage de :

1. Accélérer le processus d'incubation de création de micro entreprise.
2. Implémenter un nouveau projet « île verte » offrant la possibilité à des personnes entraînées dans le cadre du projet FOMIN de s'organiser pour vendre des produits recyclés.
3. Implémenter un nouveau projet avec le bureau international du travail en vue renforcer la formation professionnelle.

#### Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

Le projet avance et pourra donner des résultats intéressants. Cependant, il y a un risque de déviation du projet par rapport à son objectif. FOMIN doit faire un suivi serré pour empêcher cette déviation.

### Summary of project performance in the last six months

Le vient donc de redémarrer avec la formation de 360 élèves au centre formation professionnelle Kay Nou et la création de 10 micro entreprises. La Direction de Viva Rio obtient une concession de la Mairie de Cité Soleil en vue de réaliser l'expérience du partenariat public privé en attendant que certains éléments théoriques autour du concept soient développés. Ces activités relèvent surtout liées des composantes 2 et 3.

Par ailleurs, le projet dans son ensemble vient d'être réexaminé et toute l'équipe de coordination s'accorde sur le fait que les indicateurs méritent d'être réévalués par rapport réalisations passées mais également par rapport à celles envisagées dans le futur.

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a frappé le projet dans son essence. Le concept même de recyclage de déchets était devenu incommode et la priorité a été donnée au recyclage de débris en vue de débarrasser la ville des encombrements. Il lui a fallu une reformulation en vue de l'adapter aux nouveaux

besoins.

Vu les retards accumulés par la force des choses, la coordination du projet soumettra sous peu une demande d'extension de la durée du projet et par conséquent une readaptation budget et un nouveau plan de travail.

#### Comments from the Supervision Team Leader

Partially Agree with the Executing Agency comments

En 2011, le projet a été révisé ainsi que le budget. Il faudrait éviter des changements fréquents dans les documents, sauf s'il y a une bonne justification. Viva rio doit se fixer.

### SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

Indicators		Baseline	Intermediate 1	Intermediate 2	Intermediate 3	Planned	Achieved	Status
<b>Purpose:</b> The project's purpose is to promote and create sustainable micro and small enterprises around solid waste management in Bel Air.	<b>P.11</b> At least 50 microenterprises have been created.	0				50 May 2012	0 May 2010	
	<b>P.12</b> At least 600 persons engaged in income generating activities directly related to the project.	0	300 May 2011			600 May 2012	0 May 2010	
<b>Component 1:</b> Information campaign and community awareness  <b>Weight:</b> 20% <b>Classification:</b> Satisfactory	<b>C1.11</b> All 3 areas have workplans and methodology developed.	0				3 Oct 2009	3 Dec 2009	Finished
	<b>C1.12</b> TA provided to Viva Rio staff and community leaders.	0				1 Nov 2009	10 Dec 2011	On Course
	<b>C1.13</b> TA provided to Government personnel.	0				1 Dec 2009	100 Dec 2011	Finished
	<b>C1.14</b> Public education campaign implemented.	0				1 May 2012	8 Dec 2011	On Course
<b>Component 2:</b> Promote and support the creation of micro and small businesses  <b>Weight:</b> 40% <b>Classification:</b> Satisfactory	<b>C2.11</b> At least 20 micro enterprises are created and 15 are operational.	0	10 May 2011			20 Nov 2010	1 Dec 2011	Delayed
	<b>C2.12</b> The compost site is producing and selling compost.	0	10 May 2011			1 Feb 2011	1 Dec 2011	On Course
	<b>C2.13</b> At least 48 microenterprises have been created and are operational.	0				48 May 2012	10 Dec 2011	On Course
<b>Component 3:</b> Support public-private partnerships  <b>Weight:</b> 20% <b>Classification:</b> Satisfactory	<b>C3.11</b> A PPP model is developed.	0				1 May 2011		Delayed
	<b>C3.12</b> The PPP model is negotiated with the government.	0				1 May 2012		On Course
<b>Component 4:</b> Communications and dissemination  <b>Weight:</b> 20% <b>Classification:</b> Satisfactory	<b>C4.11</b> A closing event is organized.	0				1 May 2012		

Milestones		Planned	Due Date	Achieved	Date achieved	Status
<b>M0</b>	Conditions prior	5	Nov 2009	5	Jun 2009	Achieved

#### CRITICAL ISSUES THAT HAVE AFFECTED PERFORMANCE

[None reported in this period]

### SECTION 4: RISKS

#### MOST IMPORTANT RISKS AFFECTING FUTURE PERFORMANCE

	Level	Mitigation action	Responsible
1. Deterioration of the security situation could make implementation and supervision more difficult.	Low	Nurturing a close relationship with the local community, creating protective mechanisms and decreasing insecurity.	Project Coordinator
2. Fragile political situation and the precarious economic situation in the country.	Low	The possibility of facilitating a Public-Private Partnership between the Municipality and private garbage collecting enterprises for SWM in Bel Air, to increase financial and institutional sustainability.	Coordinator

**PROJECT RISK LEVEL:** Low **TOTAL NUMBER OF RISKS:** 2 **IN EFFECT RISKS:** 2 **NOT IN EFFECT RISKS:** 0 **MITIGATED RISKS:** 0

### SECTION 5: SUSTAINABILITY

**Likelihood of project sustainability after project completion:** P - Probable

**CRITICAL ISSUES THAT MAY AFFECT PROJECT SUSTAINABILITY**

*[None reported in this period]*

**Actions related to sustainability which will be or have been implemented:**

Ne venons d'achever un cours portant sur plusieurs disciplines de genie civile. 360 personnes formees recevront bientot leur certificat

**SECTION 6: PRACTICAL LESSONS**

*[No lessons learned added yet.]*
