



Operation Number: **PN-L1005**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/31/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/31/2016**
Division Chief validation date: **03/31/2016**
Country Representative validation date: **03/31/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Sustainable Development for Chiriqui Region. Phase I	Loan Number:	1768/OC-PN,2025/OC-PN-1,2025/OC-PN-1-DE
Executing Agency (EA):	Ministerio de la Presidencia ,Consejo Nacional de Desarrollo Sostenibl e,Consejo Nacional de Desarrollo Sostenibl e		
Team Leader:	Grau Benaiges,Javier	Sector/Subsector:	HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PANAMA
Borrower:	REPUBLICA DE PANAMA ,REPUBLICA DE PANAMA ,REPUBLICA DE PANAMA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PN-L1005	\$27,000,000.00	\$50,515,327.67	\$5,300,000.00	\$0.00	\$32,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
	\$50,515,327.67	\$19,844,494.05	39.28%	\$30,670,833.62


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B(R)
Safeguard Performance Rating:	Partially Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	El estado de avance de las medidas socio-ambientales es el siguiente: 13 Satisfactorias, Siete Parcialmente Satisfactorias, Dos Insatisfactorias. En sintesis para todo el programa el estado es Parcialmente Satisfactorio.


Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

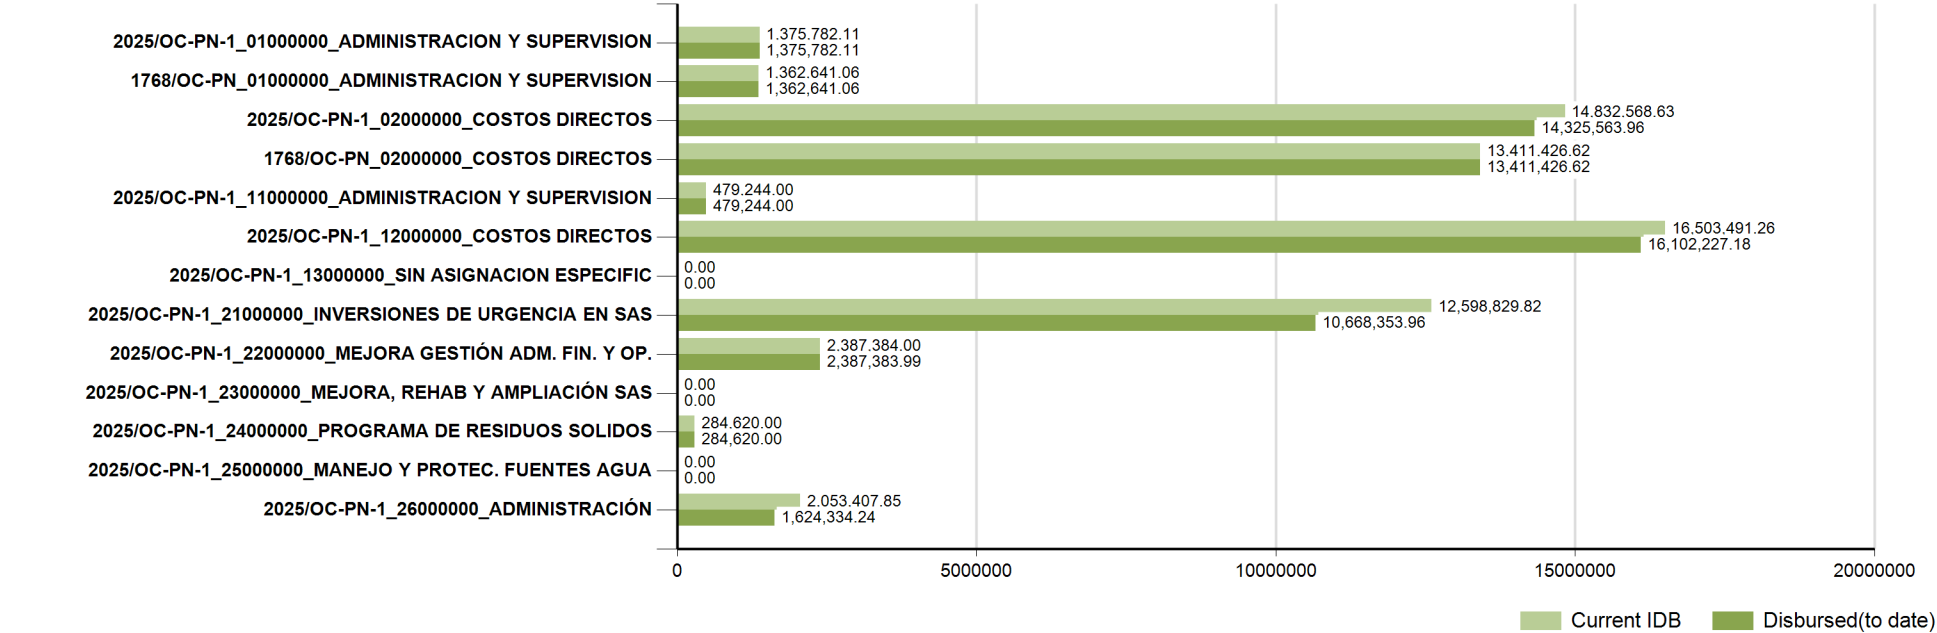

Expense Categories by Operation (cumulative values)

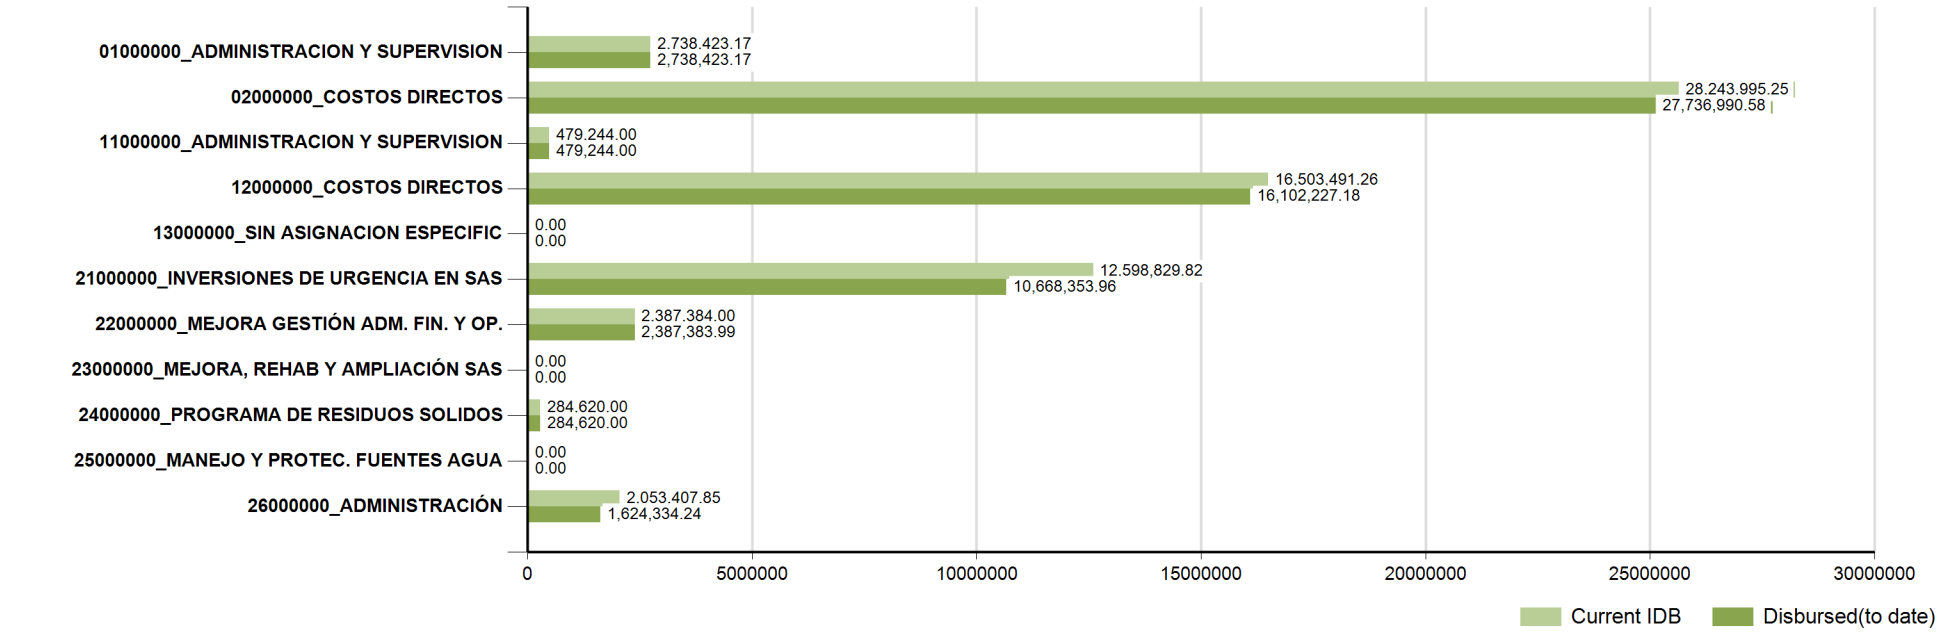

Results Matrix

Impacts									
Impact:	1 Municipios con mejoras financieras								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	EOP
1.1 Ingresos municipales			%	33.00	2005	Informe de Ingresos Municipales.		P	15.00
								P(a)	15.00
								A	15.00
Impact:	2 Hectáreas de producción diversificadas en áreas críticas								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	EOP
2.1 Hectareas cultivadas con productos tradicionales			Hectareas	3,800.00	2005	Informes del sector agropecuario.		P	2,800.00
								P(a)	0.00
								A	2,800.00
Impact:	3 Mejorar la calidad de vida de la poblacion por medio del mejoramiento de los servicios de agua potable								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	EOP
3.1 Población con acceso a agua potable con la continuidad y calidad requerida			Personas	0.00	2005	Evaluación Final del Programa		P	16,648.00
								P(a)	0.00
								A	16,648.00
Impact:	4 Ordenamiento Territorial Ambiental de los municipios								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	EOP
4.1 Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental aprobado por el consejo municipal			Plan	0.00	2005	Acta de aprobación del Consejo Municipal.		P	1.00
								P(a)	0.00
								A	1.00
Impact:	5 Cumplimiento de la normativa ambiental vigente								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	EOP
5.1 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados por ANAM.			Estudio	0.00	2005	Resolución de aprobación de EIA por la ANAM.		P	10.00
								P(a)	0.00
								A	10.00

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Capacidad de gestión de los actores públicos, privados y comunitarios fortalecida.
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2009		2010	2011	EOP
1.1 Municipios con Planes de mejoras financieras implementados.		%	33.00	2005	Informes Anuales de Recaudación de los Municipios.		P	15.00			15.00
							P(a)	15.00			15.00
							A			20.00	
Outcome:	2 Base económica productiva diversificada.										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2009		2010	2011	EOP
2.1 Índice de pobreza en áreas críticas.		%	74.00	2005			P			50.00	50.00
							P(a)			50.00	50.00
							A			50.00	
Outcome:	3 Preservación de la cobertura boscosa de la Provincia de Chiriquí.										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2009		2010	2011	EOP
3.1 Cobertura Boscosa.		%	19.00	2000			P		19.00		19.00
							P(a)		19.00		19.00
							A		19.00		

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento de Gobiernos Locales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Planes de Acción Municipal Elaborados y Aprobados	Plan	P		10.00	P		1,819,243.00
		P(a)		10.00	P(a)		1,819,243.00
		A		10.00	A		1,819,243.00
Mancomunidad de Municipios del Oriente Chiricano creada.	Mancomunidad	P		1.00	P		108,011.00
		P(a)		1.00	P(a)		108,011.00
		A		1.00	A		108,011.00
COOSEMUPAR fortalecida en su gestión y desarrollo institucional	Organización	P		0.00	P		432,233.00
		P(a)		0.00	P(a)		432,233.00
		A		0.00	A		432,233.00
Municipios, Sociedad Civil y Asociaciones Capacitadas	Organización	P		6.00	P		93,234.00
		P(a)		6.00	P(a)		93,234.00
		A		6.00	A		93,234.00
Comités Subregionales conformados.	Comité	P		4.00	P		28,942.00
		P(a)		4.00	P(a)		28,942.00
		A		4.00	A		28,942.00
Capacidades de Gestión de las Oficinas Regionales de las Instituciones Claves de Gobierno Fortalecidas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Junta Técnica Provincial fortalecida.	Junta Técnica Provincial	P		1.00	P		58,888.00
		P(a)		1.00	P(a)		58,888.00
		A		1.00	A		58,888.00
Oficinas regionales fortalecidas mediante planes de acción.	Oficinas	P		4.00	P		31,688.00
		P(a)		4.00	P(a)		31,688.00
		A		4.00	A		31,688.00
Infraestructura y Servicios de Apoyo a la Competitividad ejecutados		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Proyectos de infraestructura básica orientada al sector productivo ejecutados	Proyectos	P		6.00	P		4,205,880.00
		P(a)		6.00	P(a)		4,205,880.00
		A		6.00	A		4,205,880.00
Sistemas de agua potable mejorados	Sistemas	P		9.00	P		2,647,745.00
		P(a)		9.00	P(a)		2,647,745.00
		A		9.00	A		2,647,745.00
Aumento del Empleo en Areas Críticas y Modernización de la base productiva del Sector Primario		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Pescadores artesanales capacitados en nuevas artes de pesca	Pescadores	P		120.00	P		1,196,498.00
		P(a)		280.00	P(a)		1,196,498.00
		A		280.00	A		1,196,498.00
Fincas integrales familiares como alternativa en oriente chiricano y Barú implementadas	Fincas	P		5.00	P		4,472.00
		P(a)		5.00	P(a)		4,472.00
		A		5.00	A		4,472.00
Mejoramiento genetico del ganado vacuno implementado en fincas seleccionadas	Fincas	P		34.00	P		575,400.00
		P(a)		34.00	P(a)		575,400.00
		A		34.00	A		575,400.00

Proyectos Productivos sustitutivos del Banano en áreas críticas ejecutados.	Proyectos	P		3.00	P		669,601.00
		P(a)		3.00	P(a)		669,601.00
		A		3.00	A		669,601.00
Proyectos productivos sustitutivos de productos no tradicionales en sectores claves implementados	Proyectos	P		3.00	P		494,844.00
		P(a)		3.00	P(a)		494,844.00
		A		3.00	A		494,844.00
Estudios de factibilidad y diseño de proyectos de modernización del sector primario realizados	Estudios	P		3.00	P		110,485.00
		P(a)		3.00	P(a)		110,485.00
		A		3.00	A		110,485.00
Instrumentos de Gestión para la Mitigación y Prevención del Deterioro Ambiental Implementado		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Plan de Ordenamiento territorial y ambiental de Boquete aprobado	Plan	P		1.00	P		353,946.00
		P(a)		1.00	P(a)		353,946.00
		A		1.00	A		353,946.00
Sistema de Monitoreo Ambiental y de Calidad del Agua implementado	Sistema	P		0.00	P		201,081.00
		P(a)		1.00	P(a)		201,081.00
		A		1.00	A		201,081.00
Proyectos demostrativos de Mitigación de la contaminación ejecutados	Proyectos	P		2.00	P		79,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		79,000.00
		A		2.00	A		79,000.00
Areas protegidas con planes de manejo elaborados	Areas protegidas	P		1.00	P		98,077.00
		P(a)		1.00	P(a)		98,077.00
		A		1.00	A		98,077.00
Proyectos de comanejo e impulso del turismo ecológico en áreas protegidas realizados	Proyectos	P		2.00	P		525,402.00
		P(a)		3.00	P(a)		1,099,384.00
		A		3.00	A		1,099,384.00
Proyectos de Saneamiento Ambiental realizados	Proyectos	P		5.00	P		503,680.00
		P(a)		5.00	P(a)		503,680.00
		A		5.00	A		503,680.00
Administracion y Supervisión							

Other Cost		2015	Cost
Equipo Técnico de Proyecto	P		\$1,014,131.00
	P(a)		\$1,014,131.00
	A		\$1,014,131.00
Auditorias y Evaluación	P		\$116,471.00
	P(a)		\$116,471.00
	A		\$116,471.00
Seguimiento y Evaluación	P		\$34,785.00
	P(a)		\$34,785.00
	A		\$34,785.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P		\$15,403,737.00
	P(a)		\$15,977,719.00
	A		\$15,977,719.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
