

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18

Tarea


División

Hito

Resumen


Resumen del proyecto












Tarea inactiva

Hito inactivo


Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración











Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo

solo fin


Tareas externas












Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual










Id	<div><div>i</div></div>	Modo de tarea	Nombre de tarea																		
				2019		2019				2020				2021				2022			
				T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
105		<div></div>	Si le nombre de candidats éligibles excède le nombre de places disponibles, tirage au sort public des bénéficiaires parmi les candidats éligibles																		
106		<div></div>	Liste finale des bénéficiaires																		
107		<div></div>	Validation de la liste finale des bénéficiaires																		
108		<div></div>	Communication des resultats du procesus de selection																		
109		<div></div>	ETAPES 8 et 9: Phase de formation (6 mois en centres de formation et 3 mois en entreprises)																		
110		<div></div>	ACHAC (capacité annuelle: 2 groupes de 40 étudiants)																		
111		<div></div>	Groupe 1																		
112		<div></div>	Rapport 1 d’avancée de la phase de formation dans les centres																		
113		<div></div>	Rapport 2 d’avancée de la phase de formation dans les centres																		
114		<div></div>	Rapport final de la phase de formation dans les centres																		
115		<div></div>	Période de stage (60j) et d’accompagnement vers l’emploi (30j)																		
116		<div></div>	Rapport d’avancée de la phase de stage																		
117		<div></div>	Rapport final de la phase de stage																		
118		<div></div>	Groupe 2																		
119		<div></div>	Rapport 1 d’avancée de la phase de formation dans les centres																		
120		<div></div>	Rapport 2 d’avancée de la phase de formation dans les centres																		
121		<div></div>	Rapport final de la phase de formation dans les centres																		
122		<div></div>	Période de stage (60j) et d’accompagnement vers l’emploi (30j)																		
123		<div></div>	Rapport d’avancée de la phase de stage																		
124		<div></div>	Rapport final de la phase de stage																		
125		<div></div>	Centre Polyvalent (capacité annuelle: 1 groupe de 200 étudiants)																		

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137 Fecha: jue 8/30/18	Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>		

Página 6

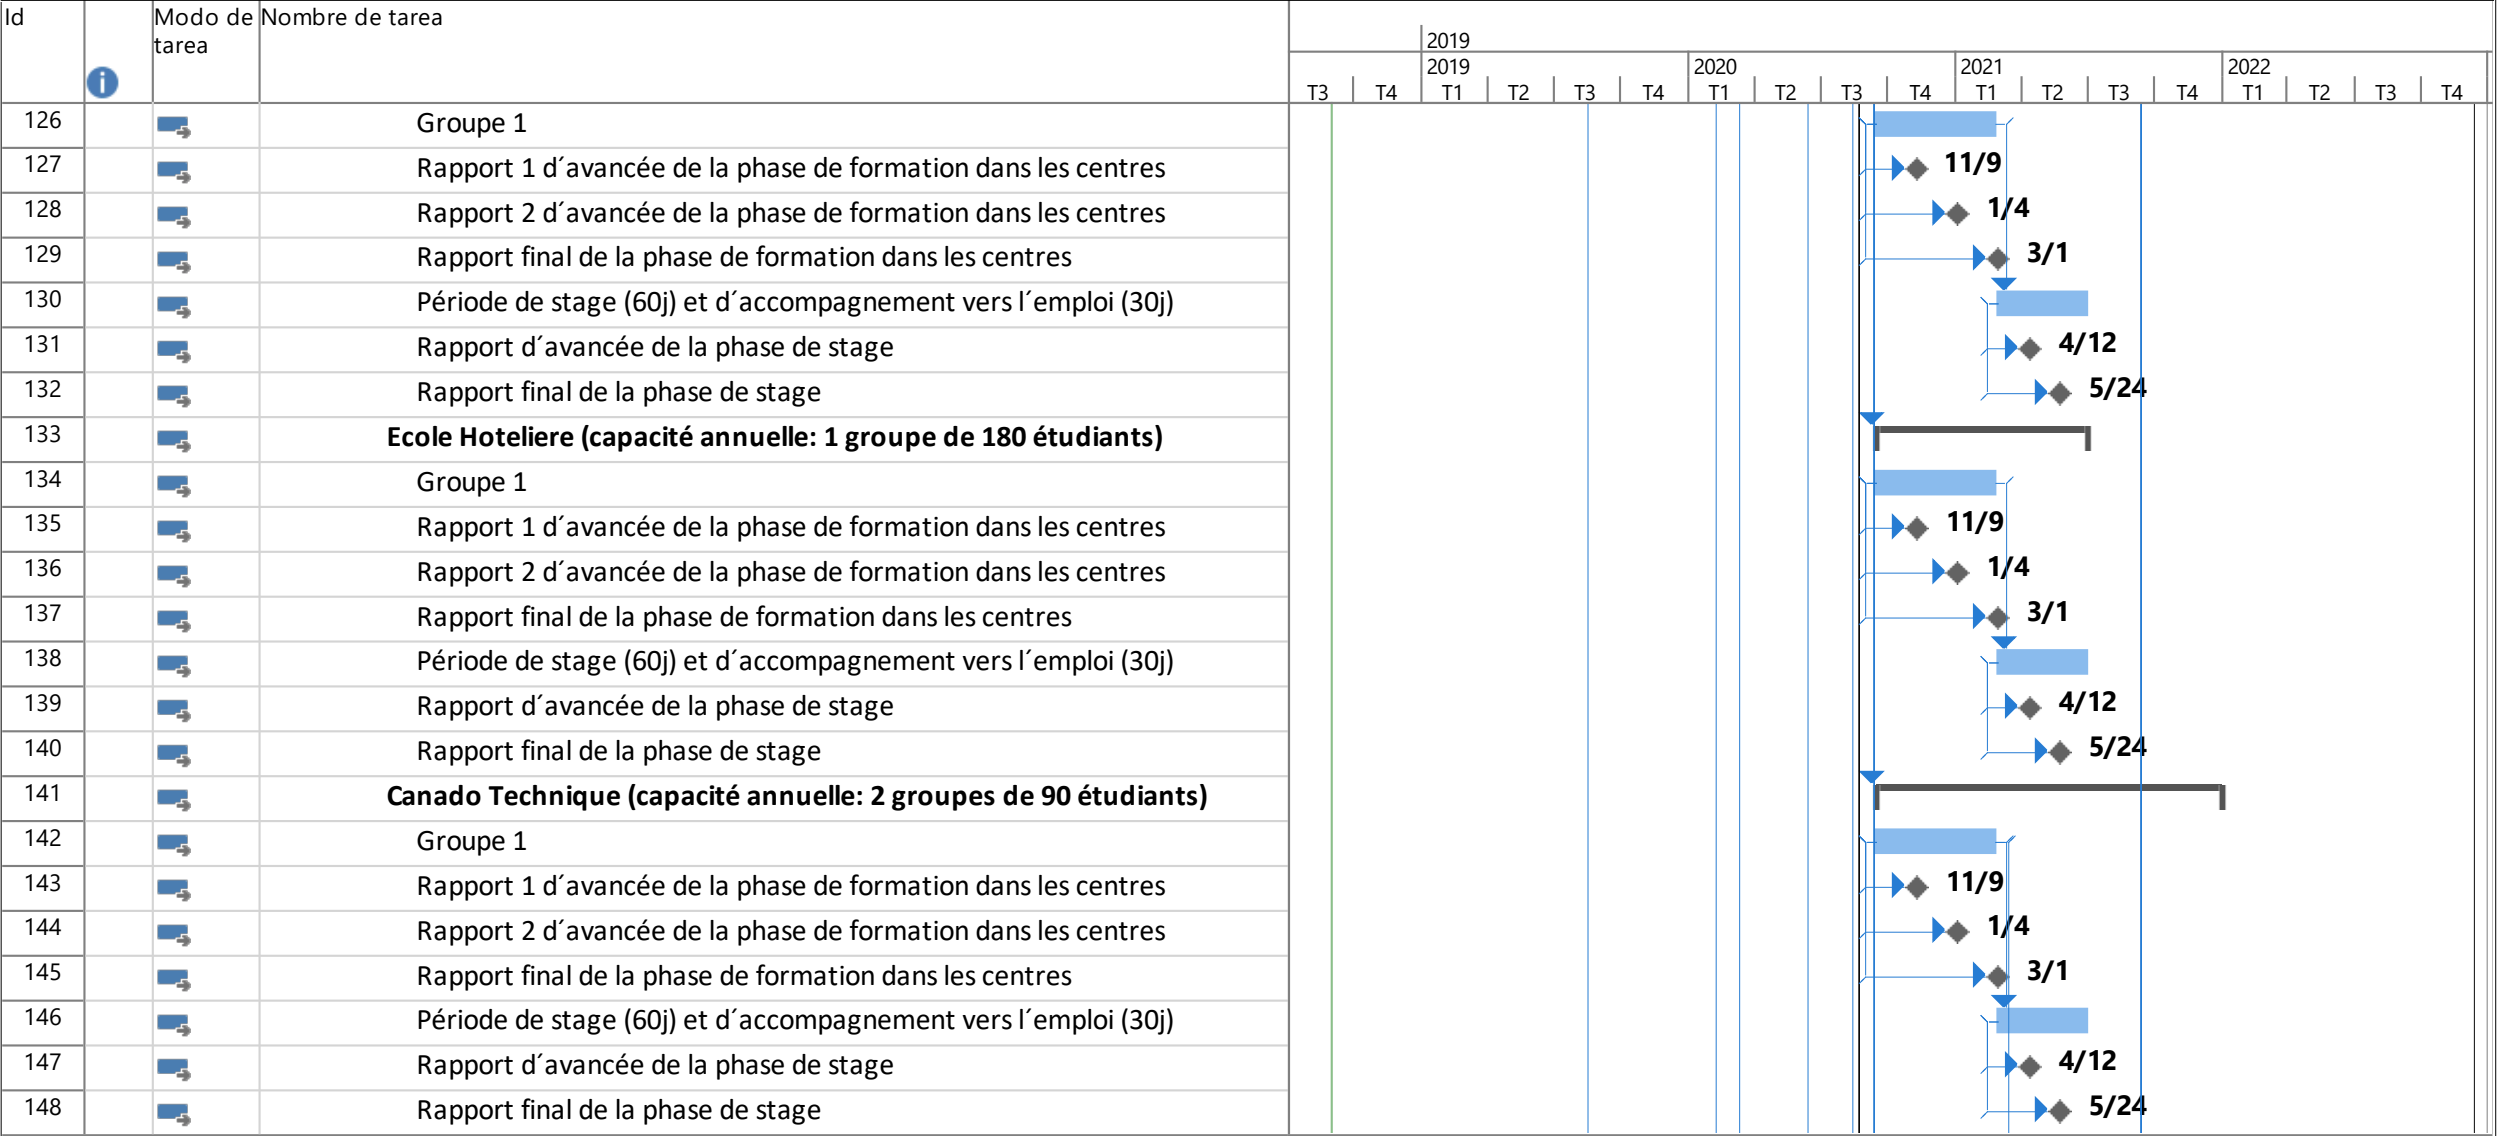

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

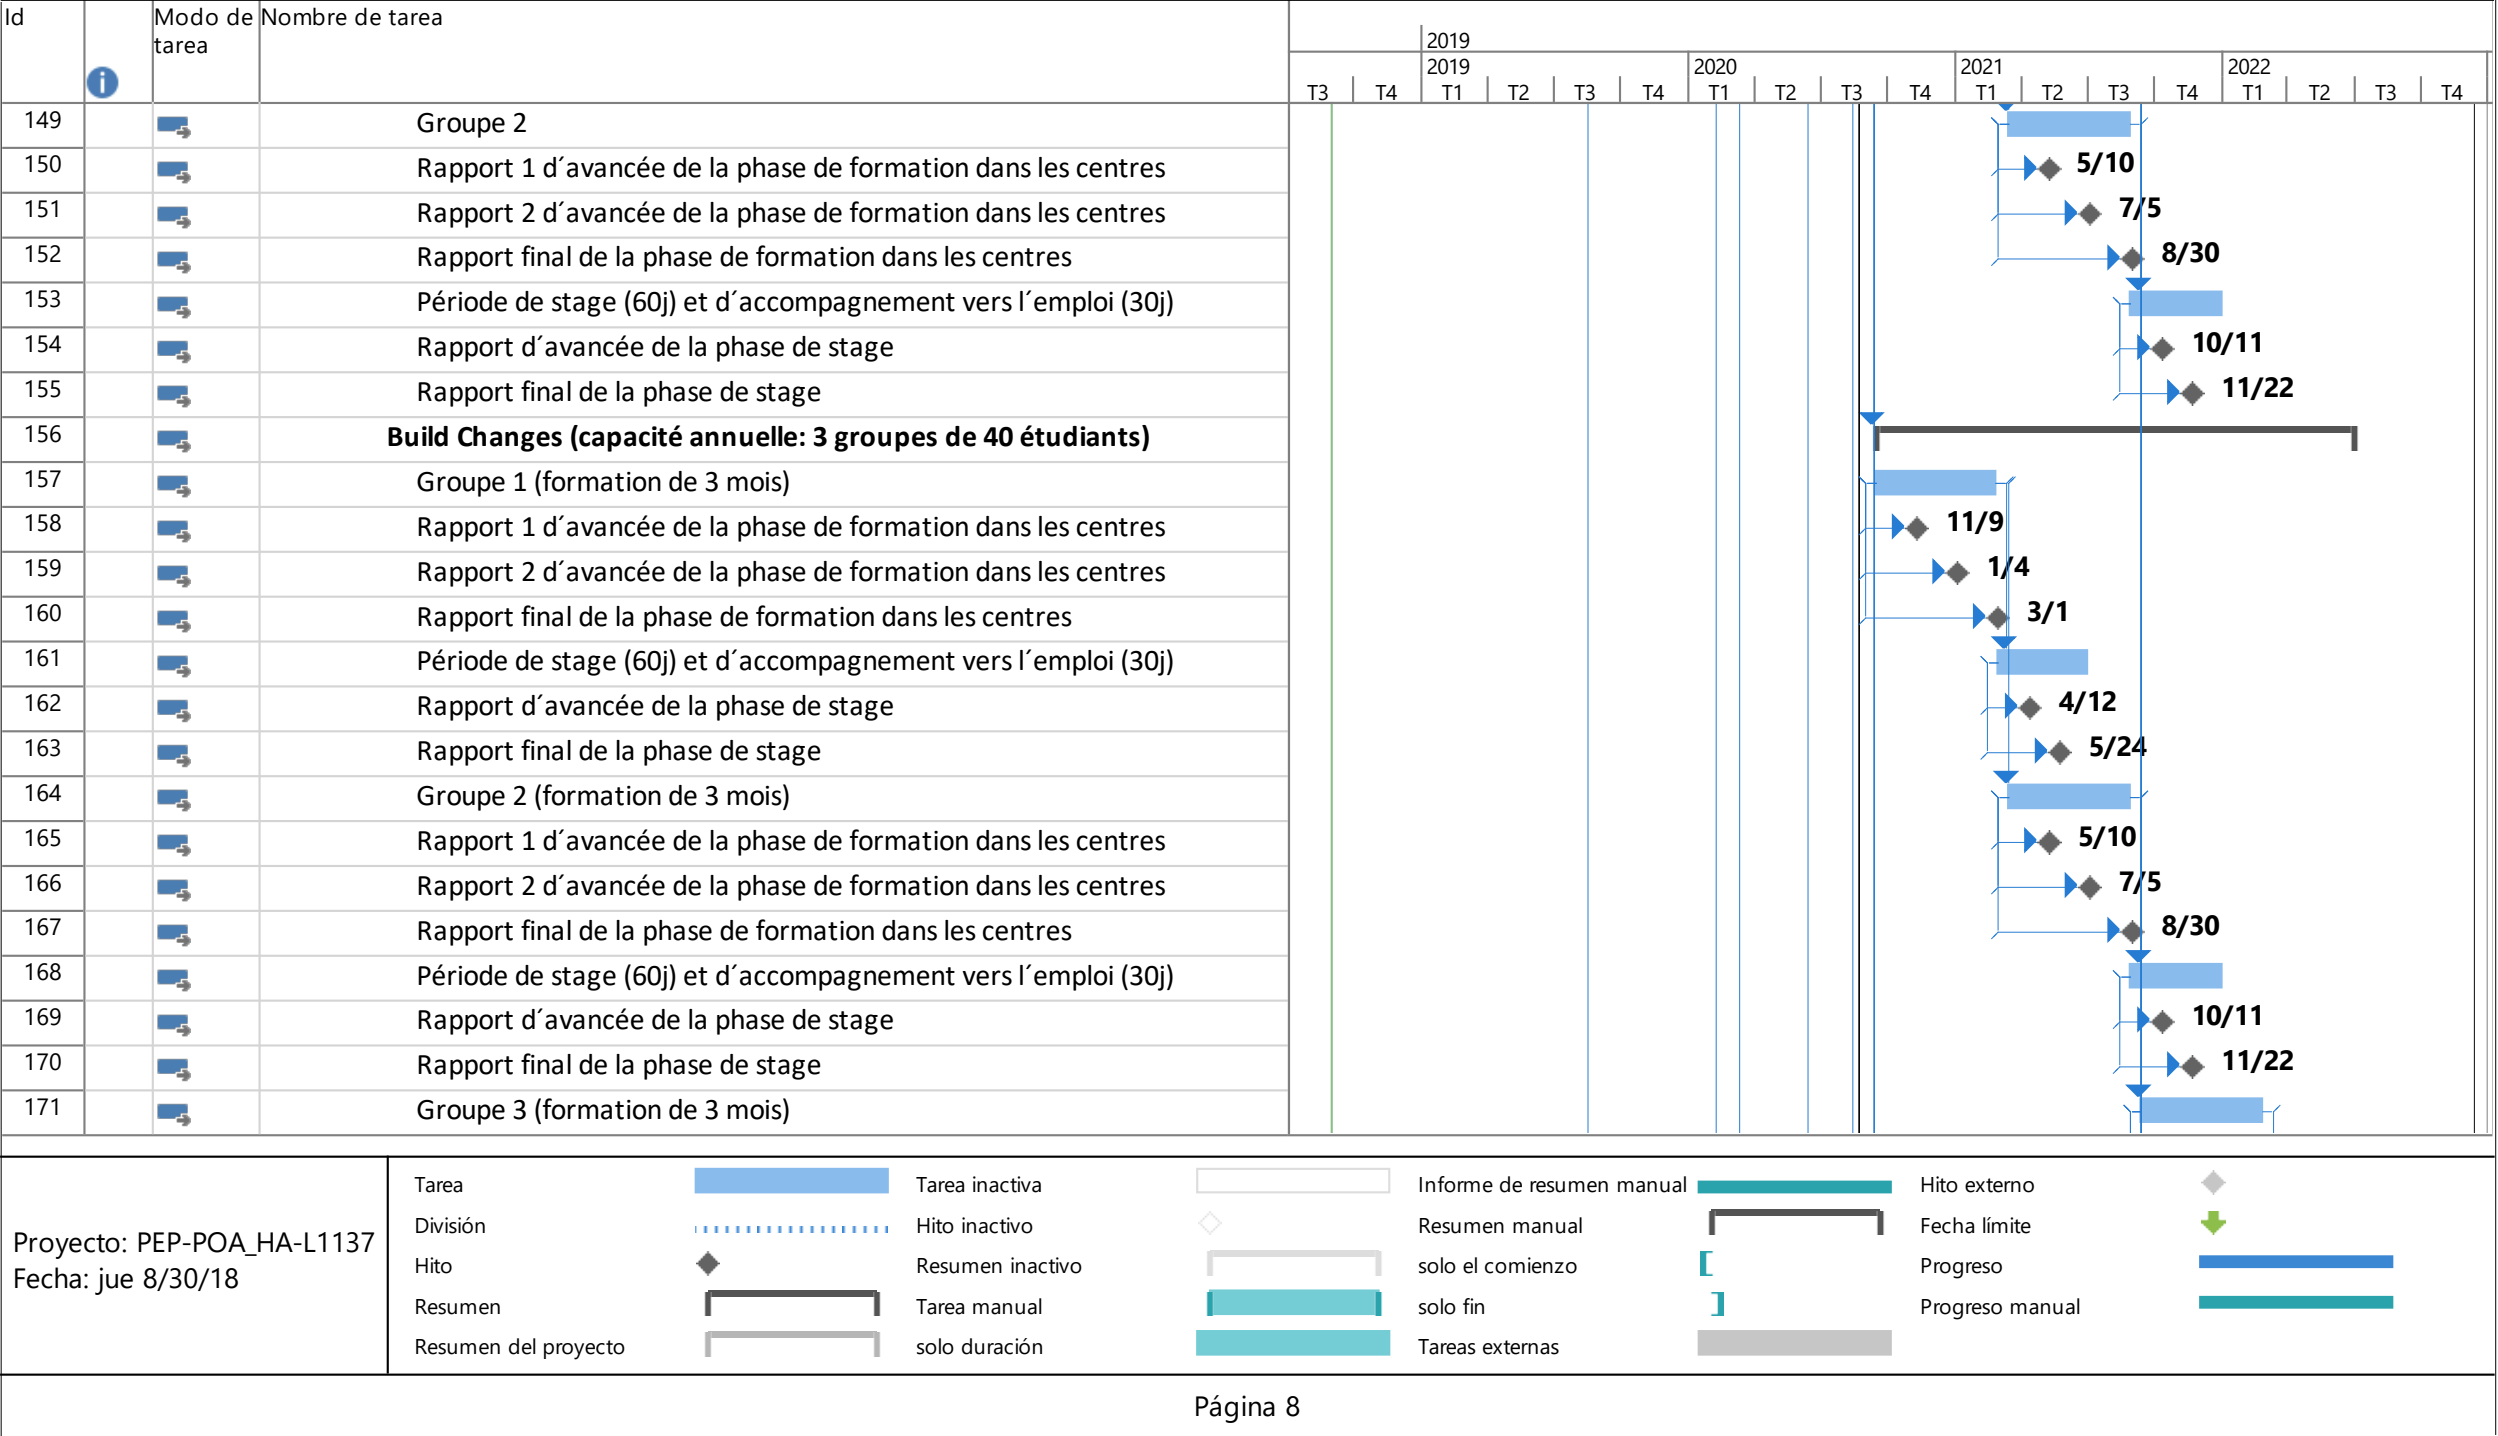

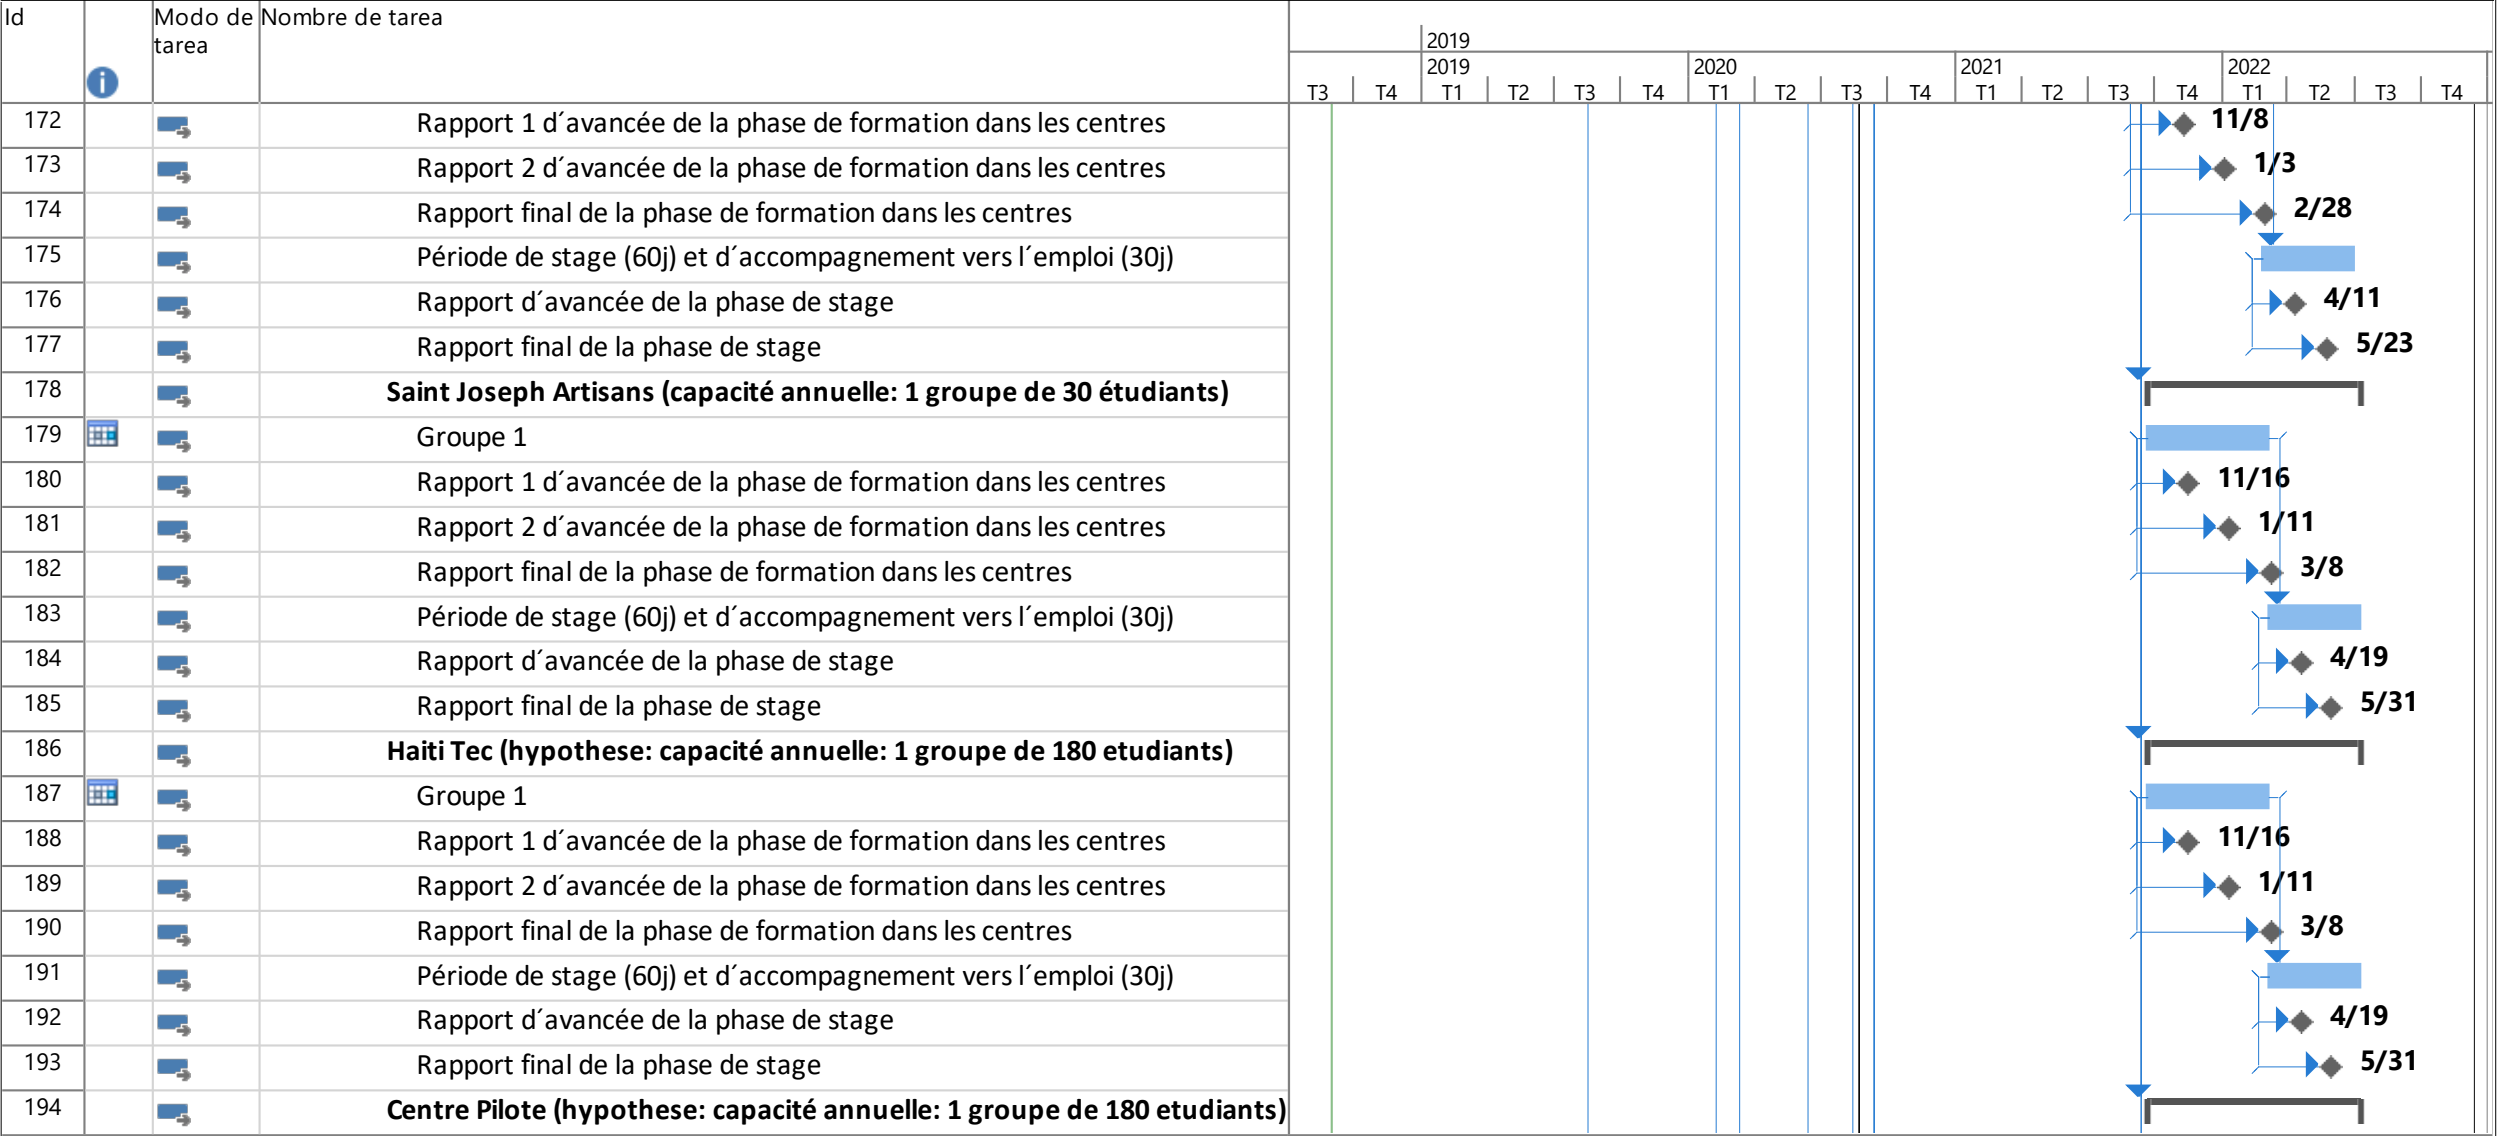

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

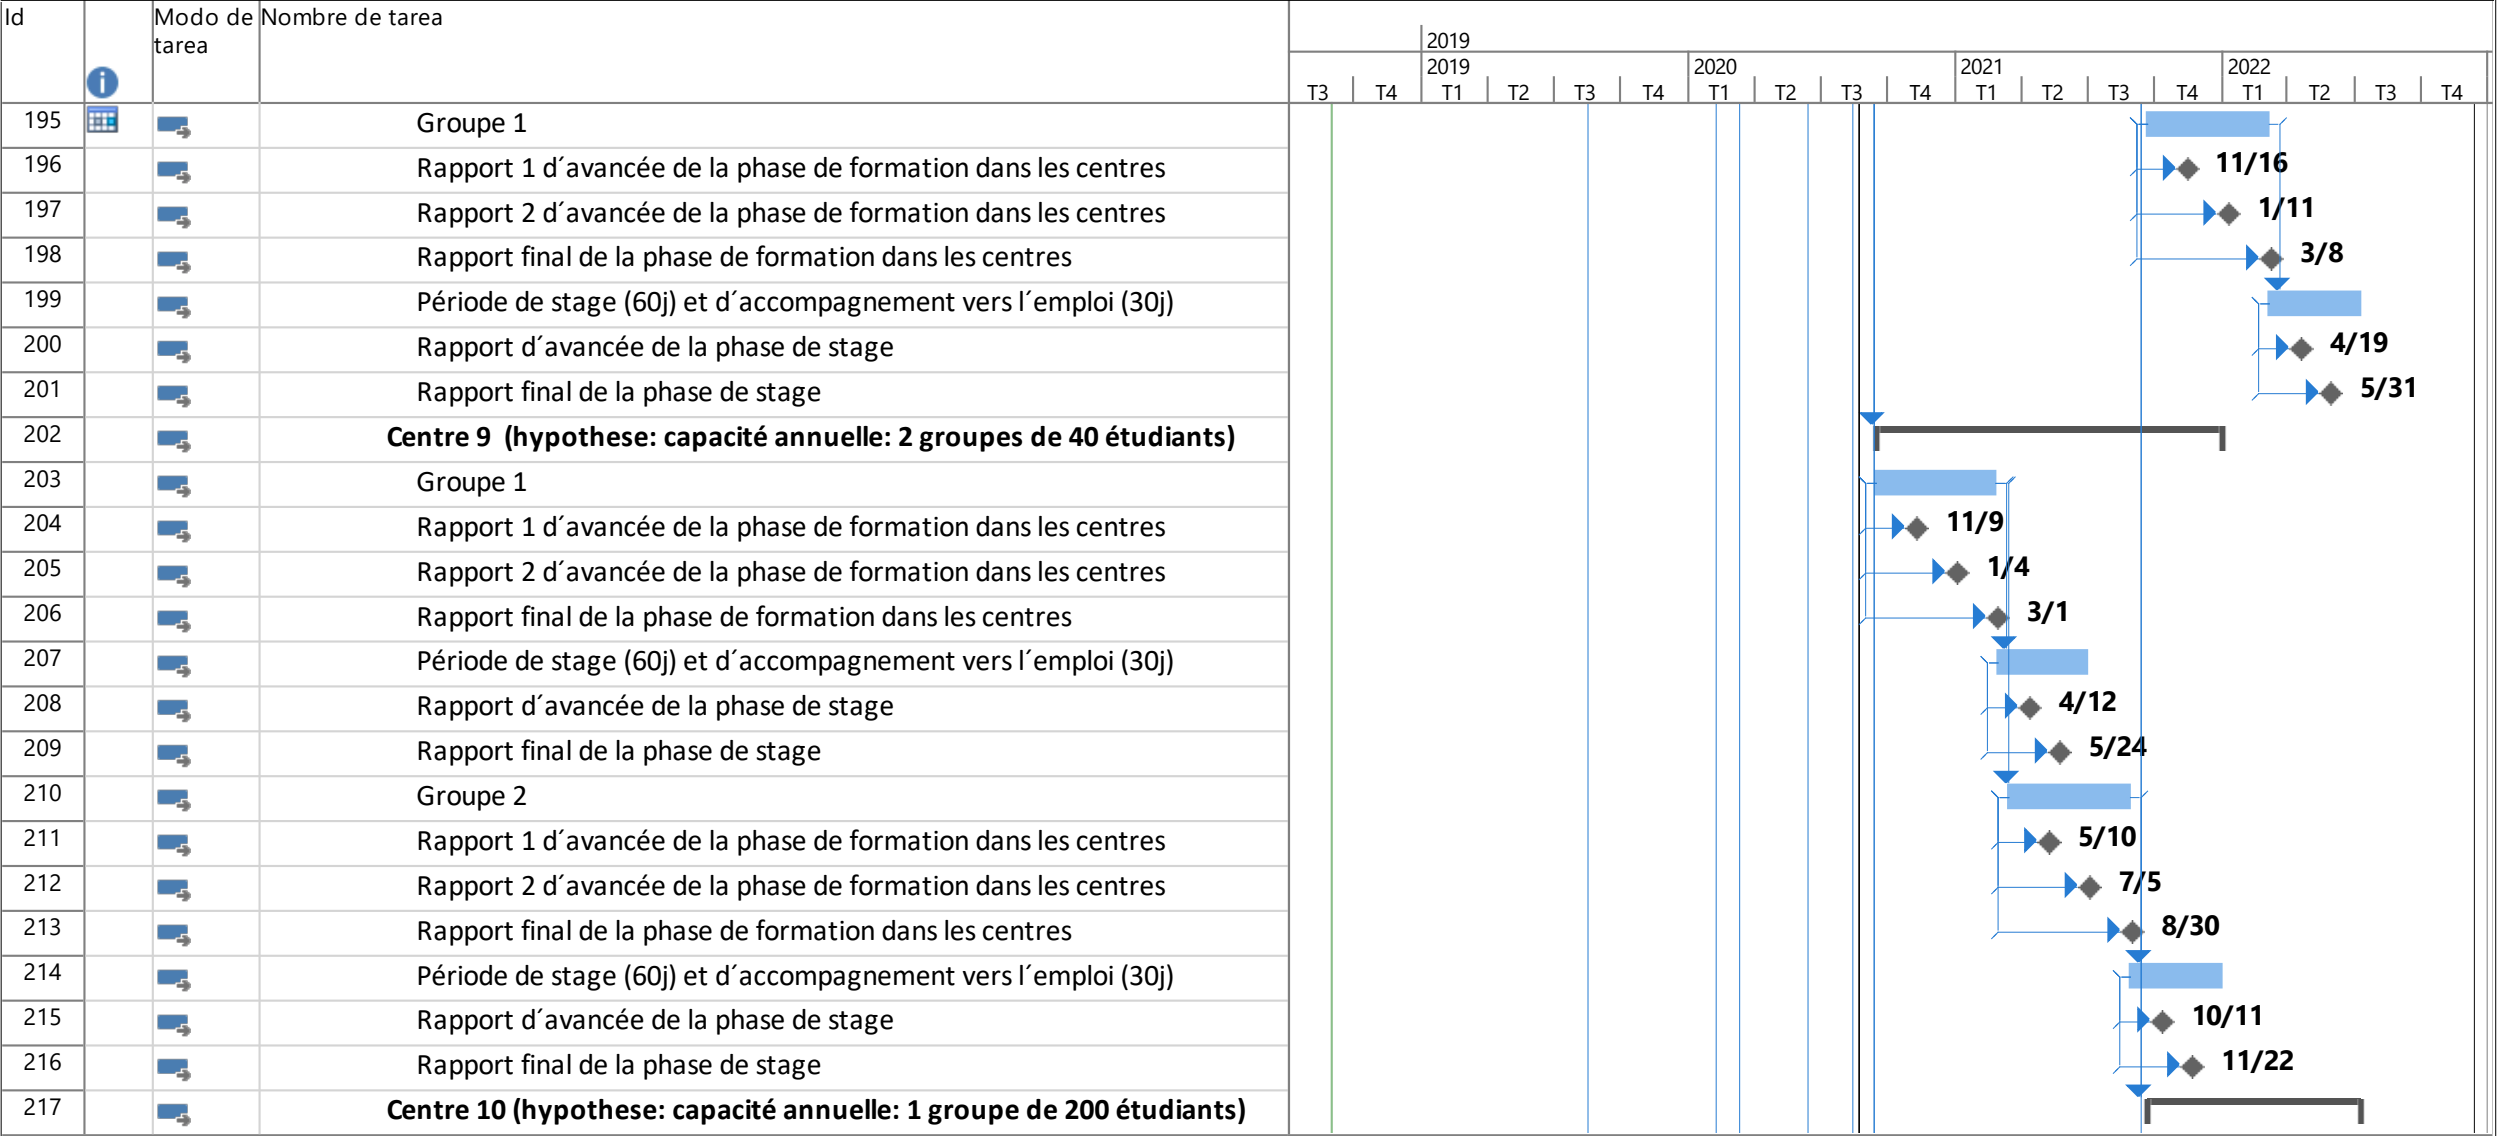

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

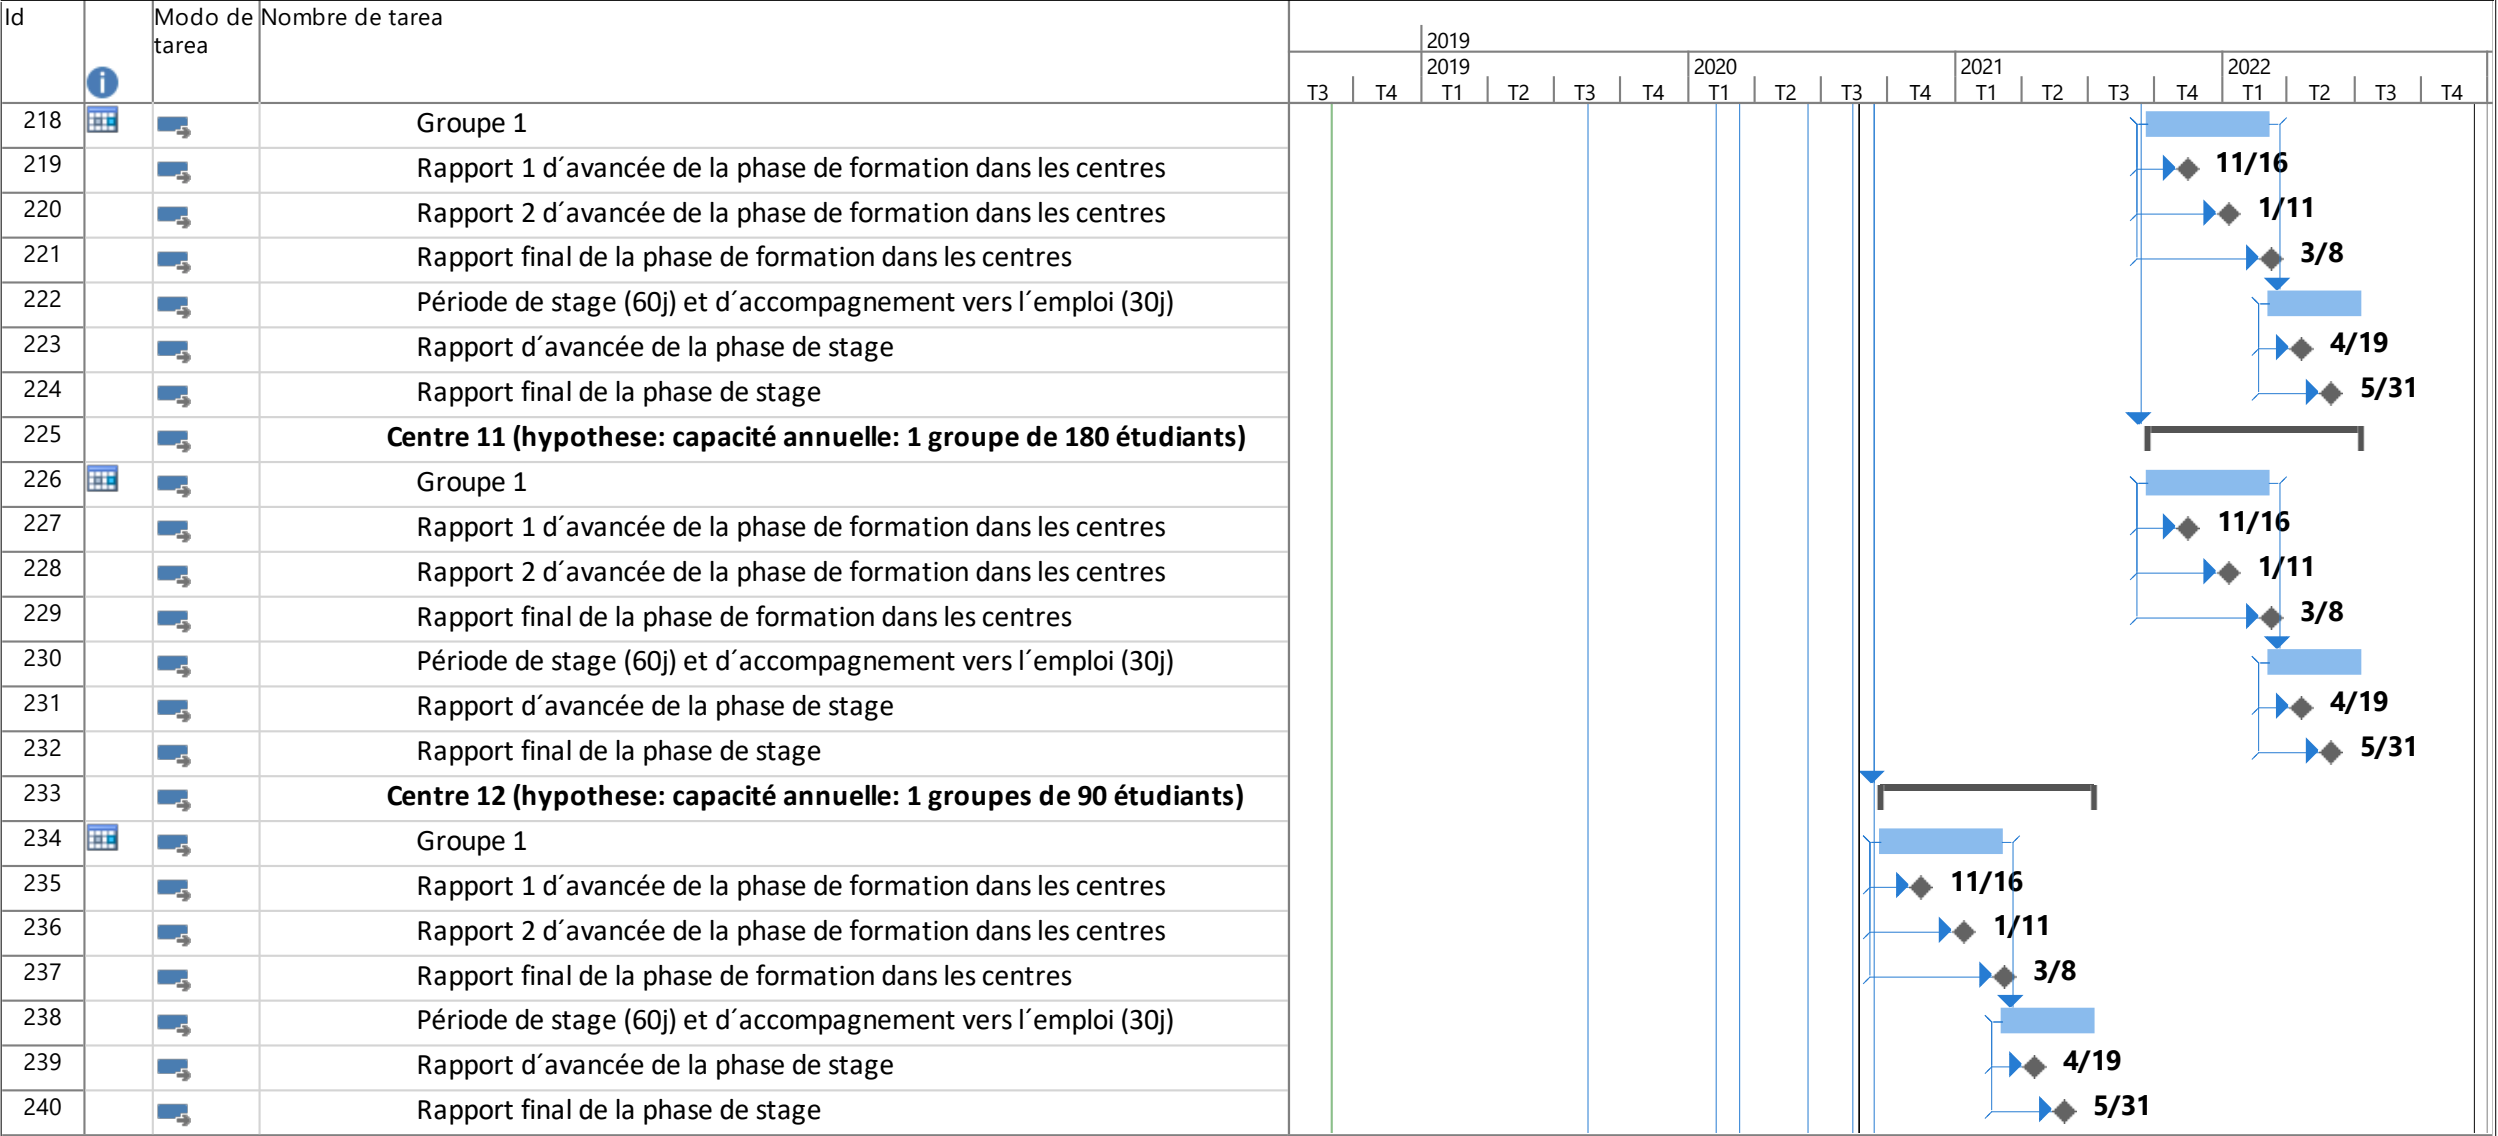

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

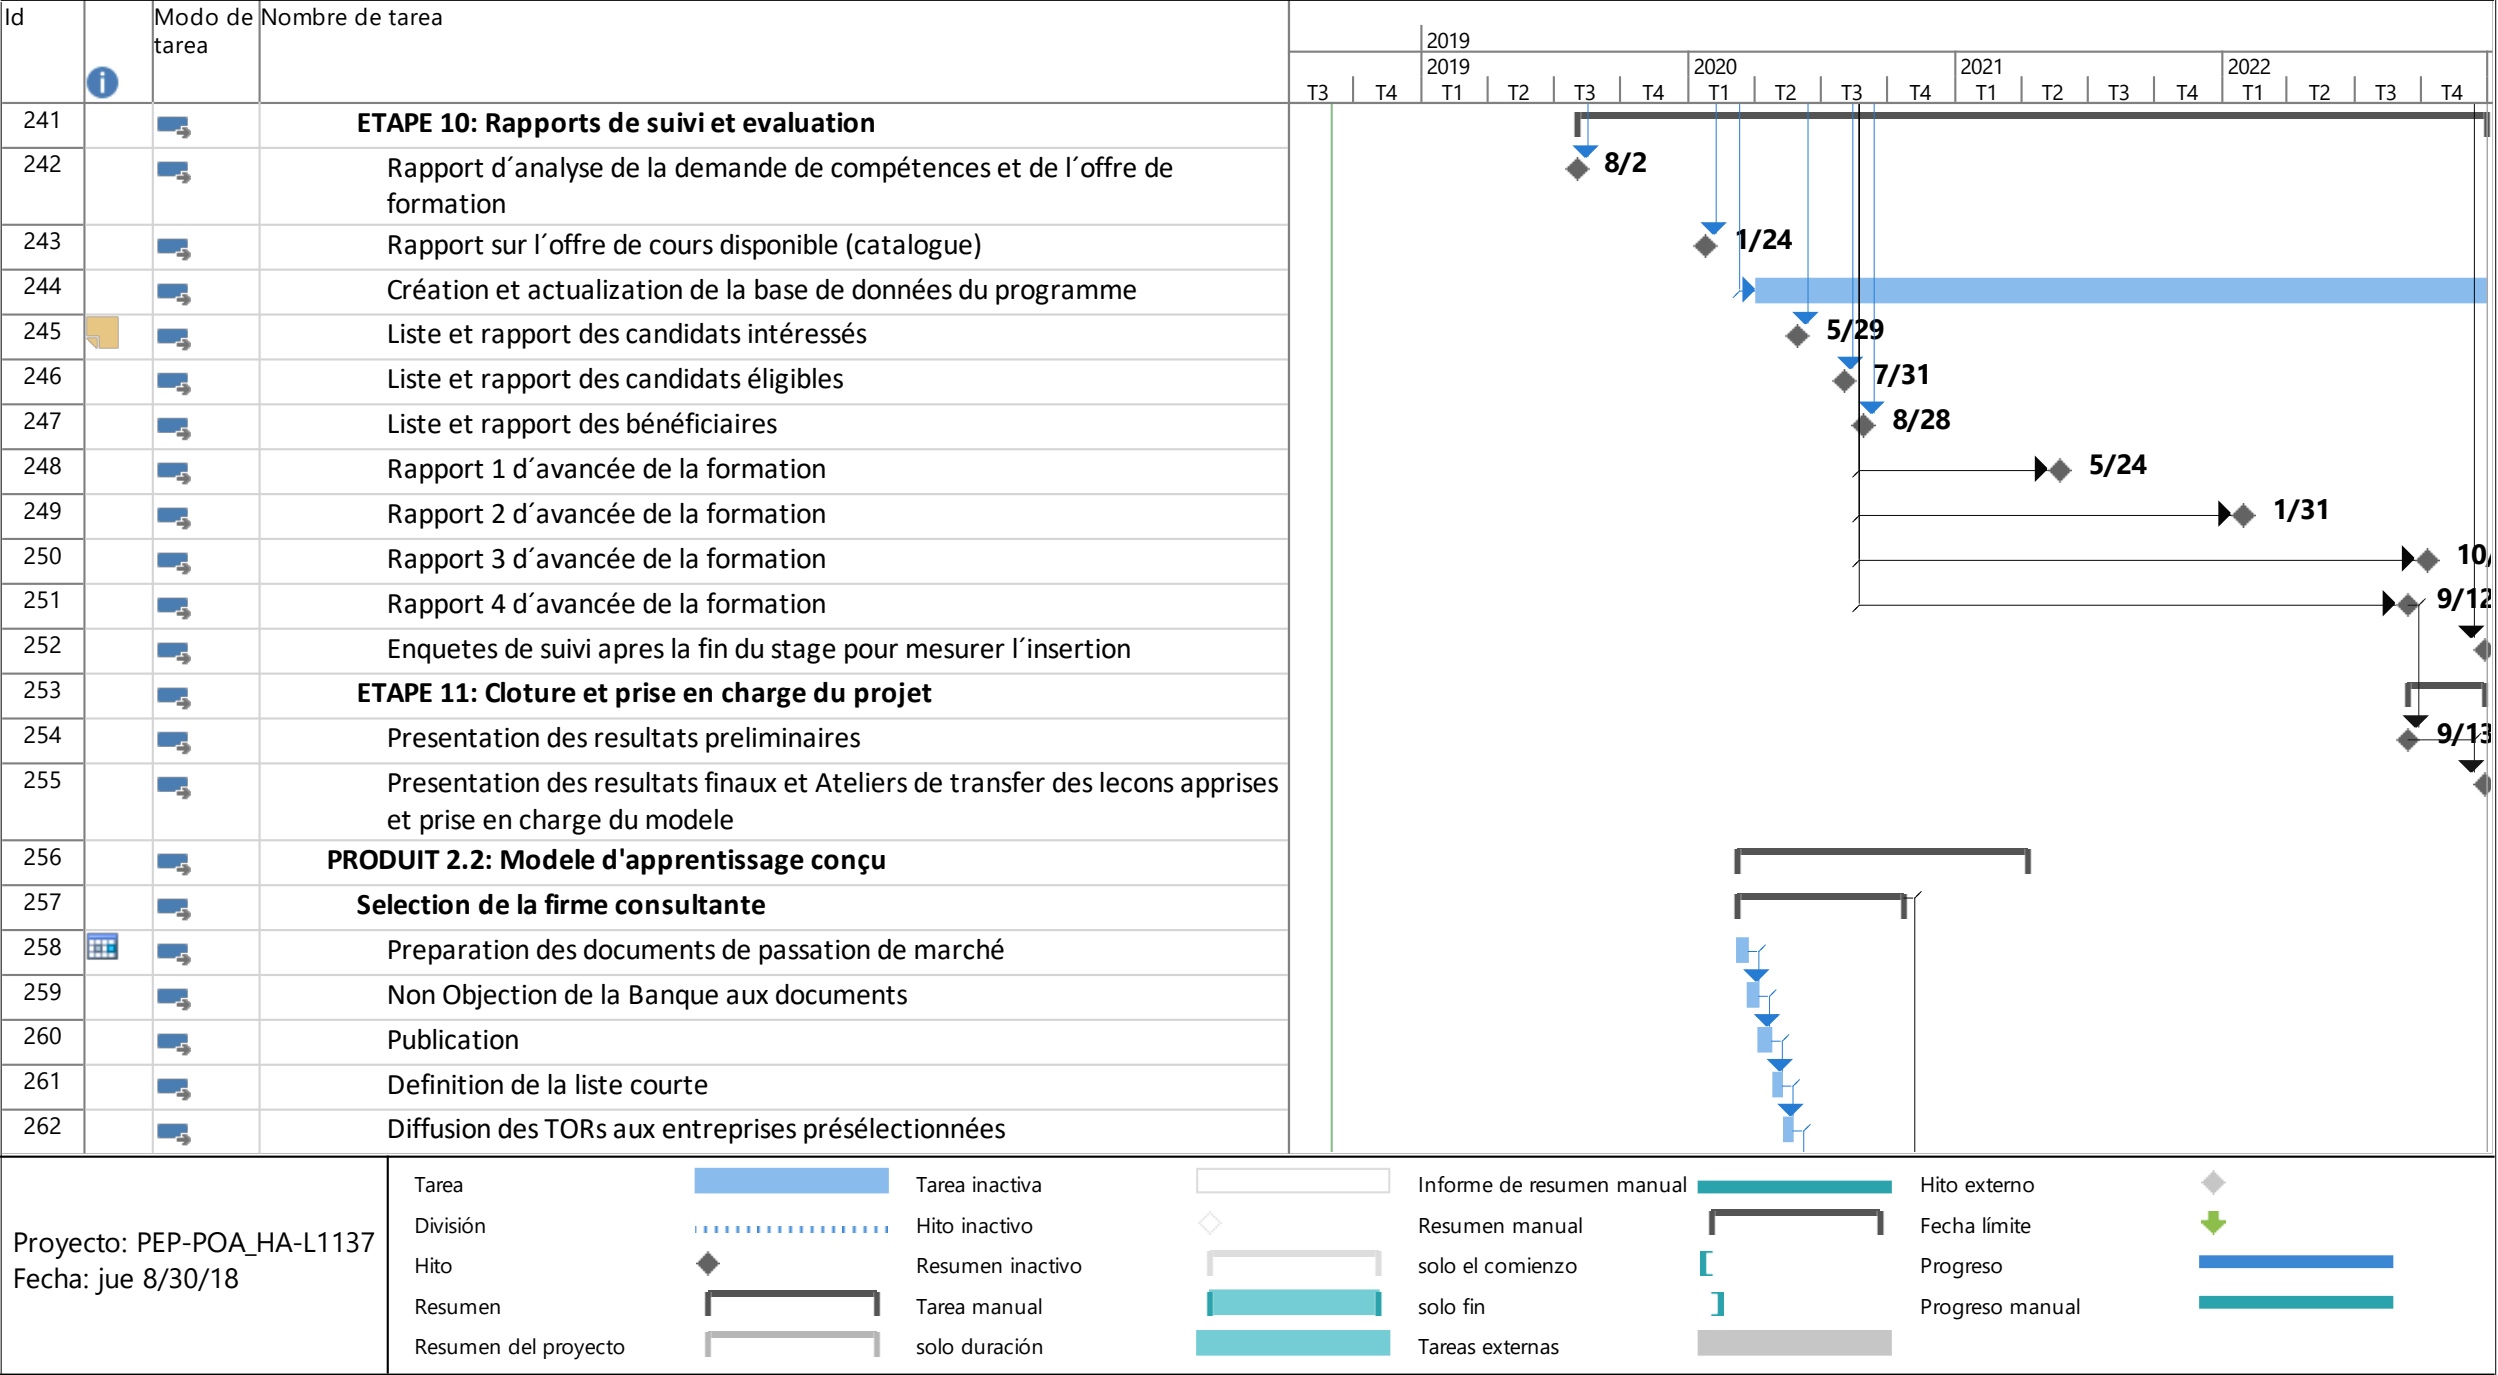

Página 12

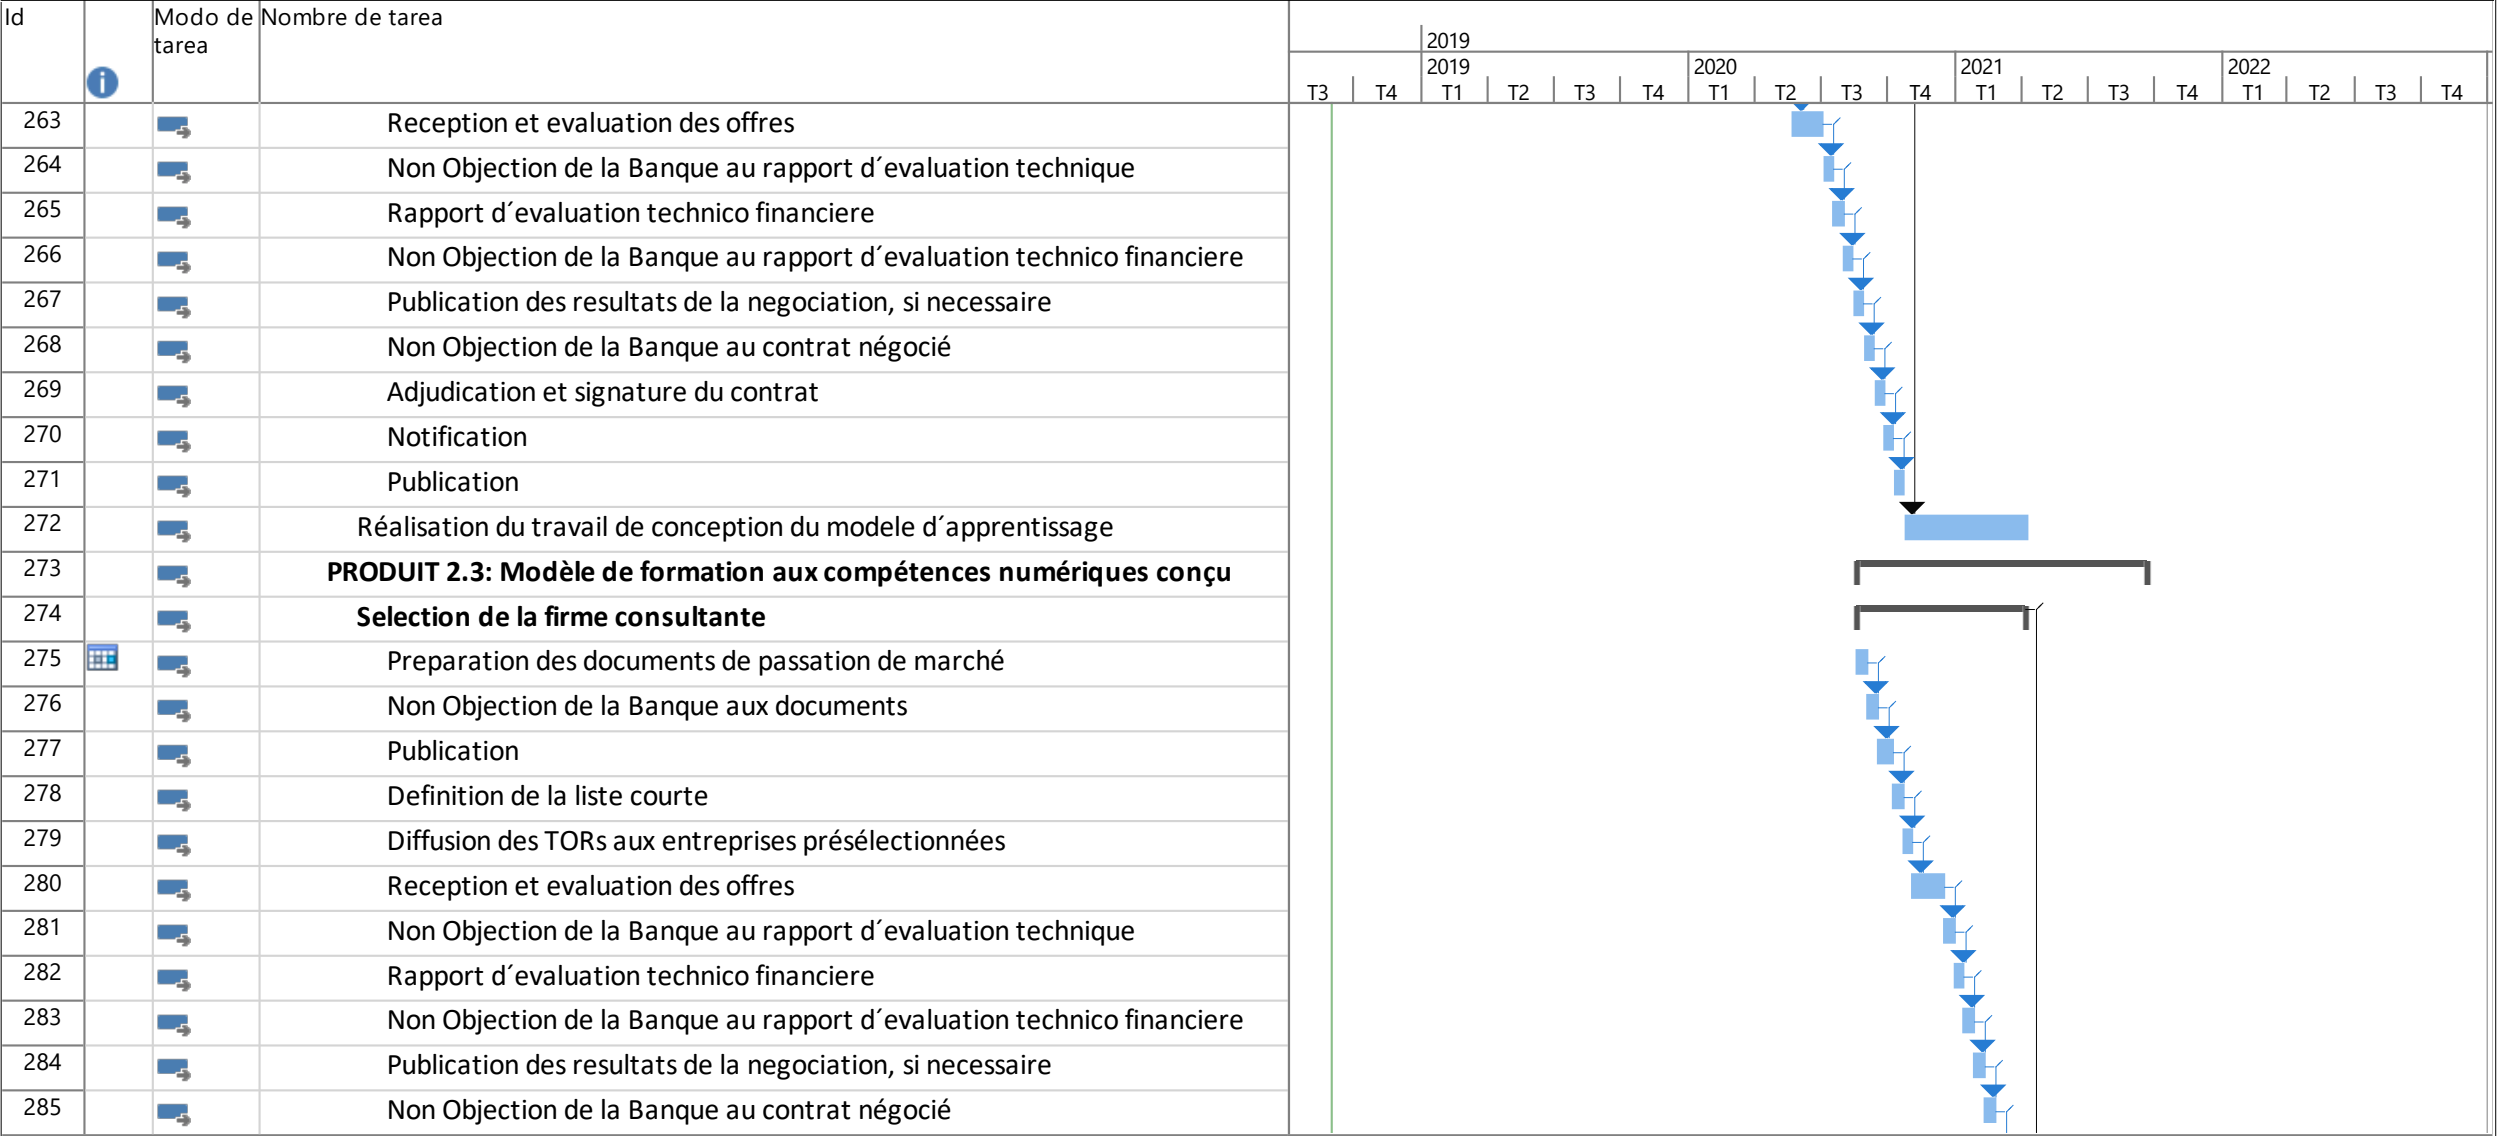

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

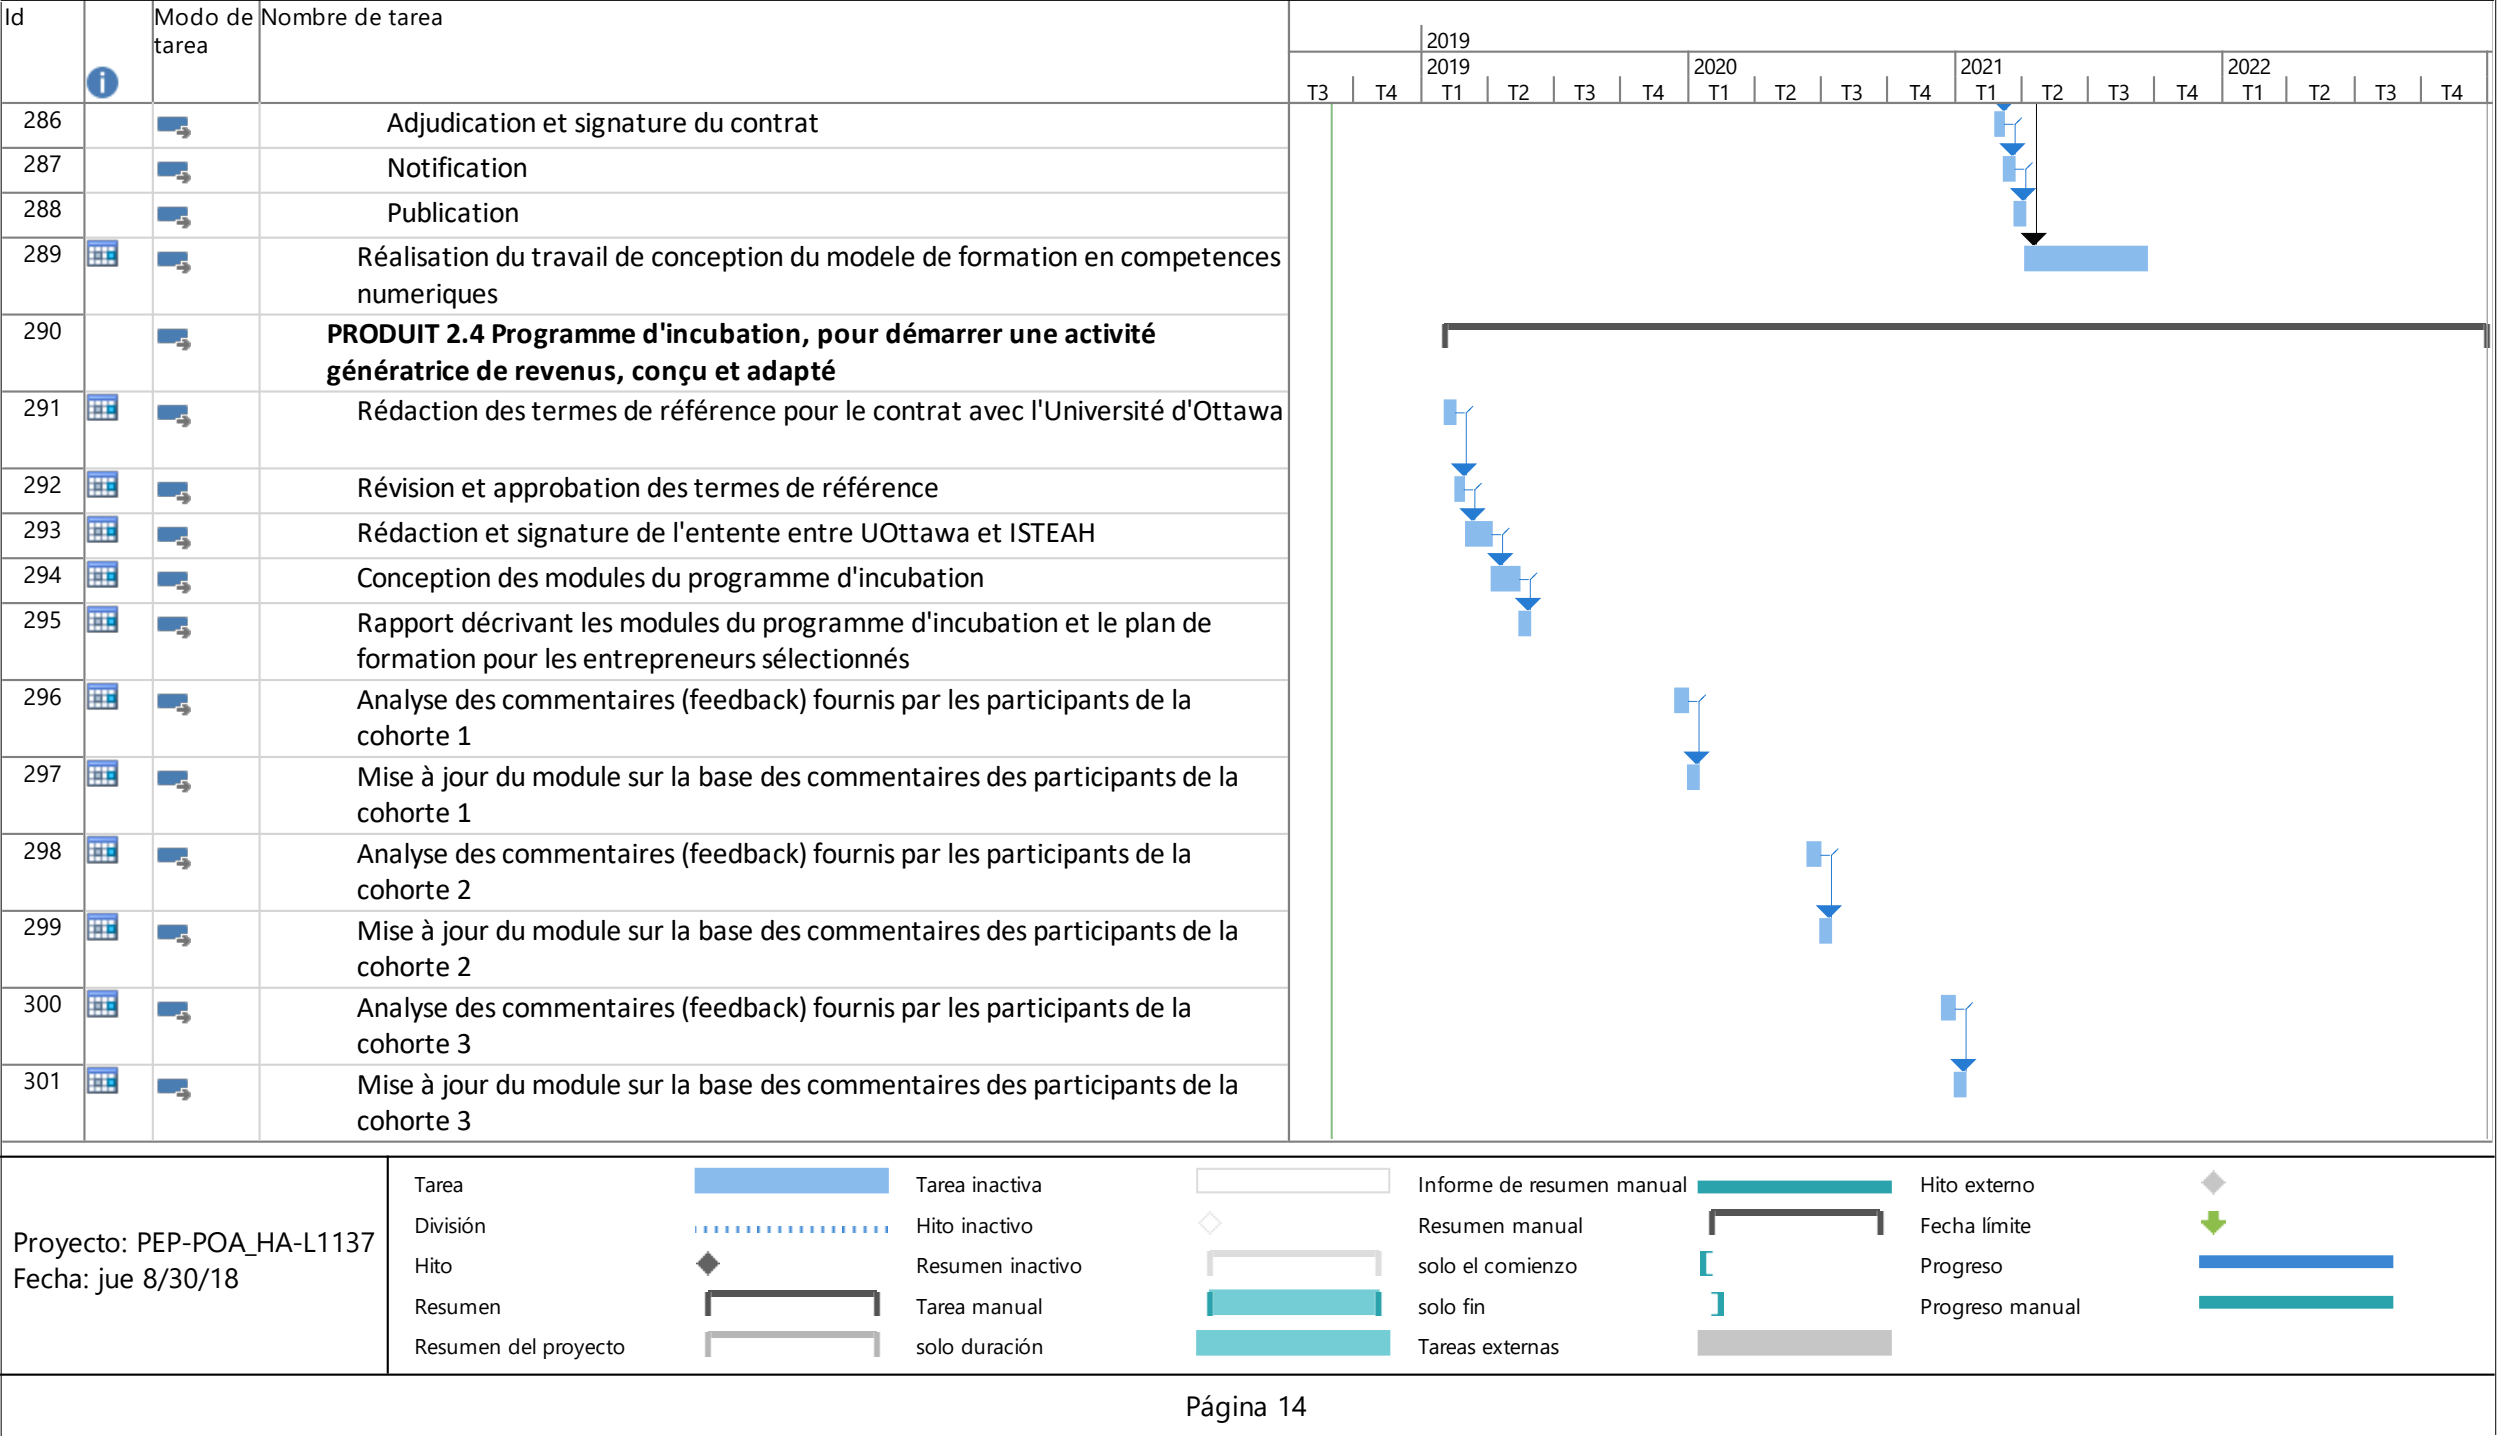

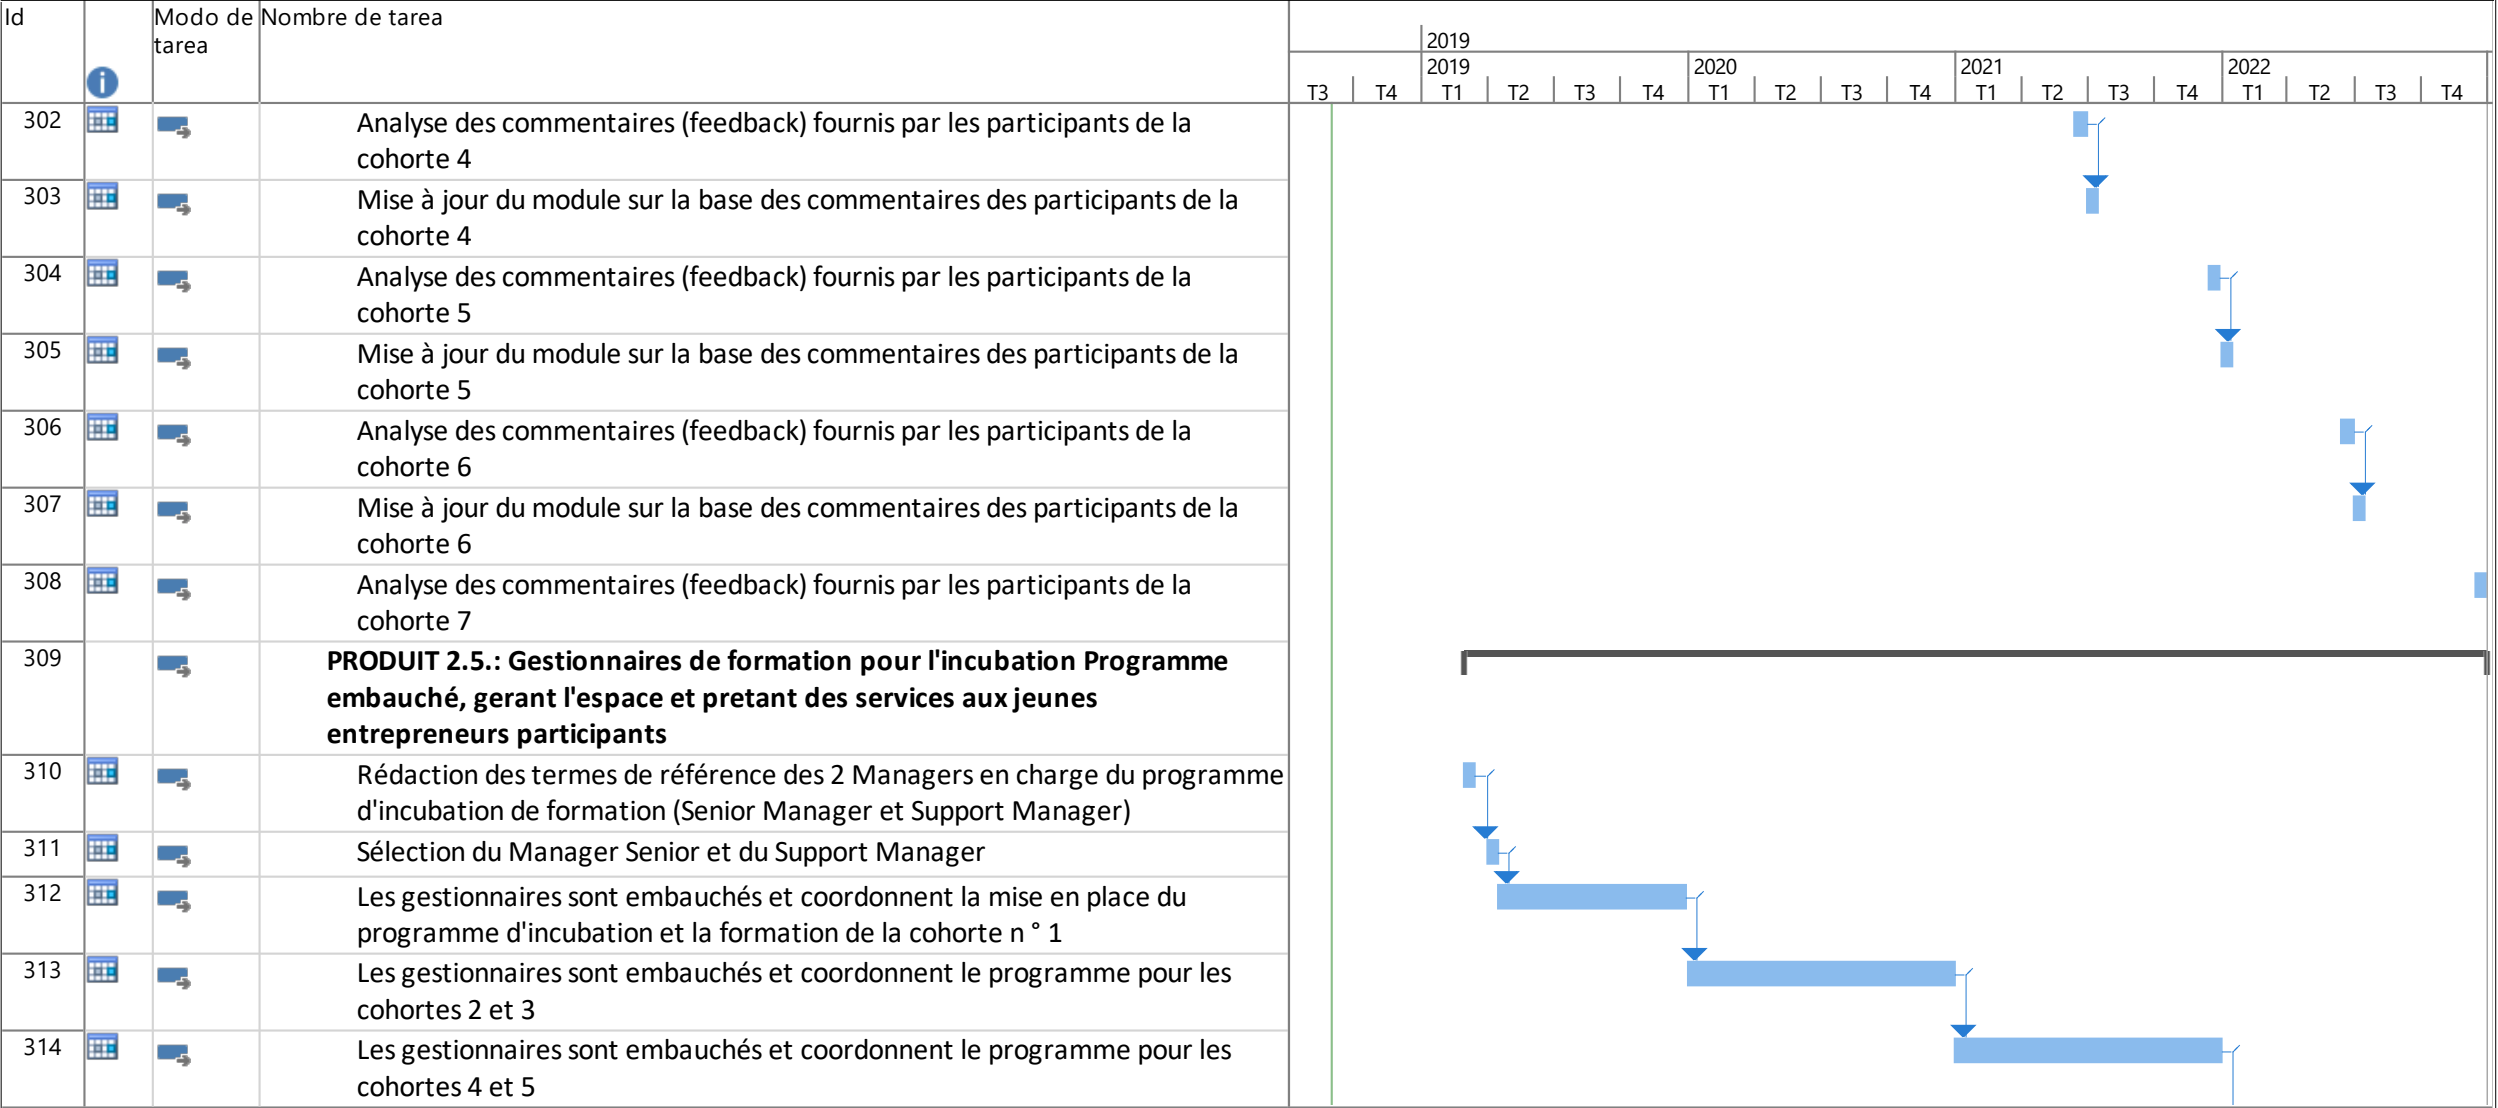

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18


Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto











Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración











Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo


solo fin

Tareas externas












Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual












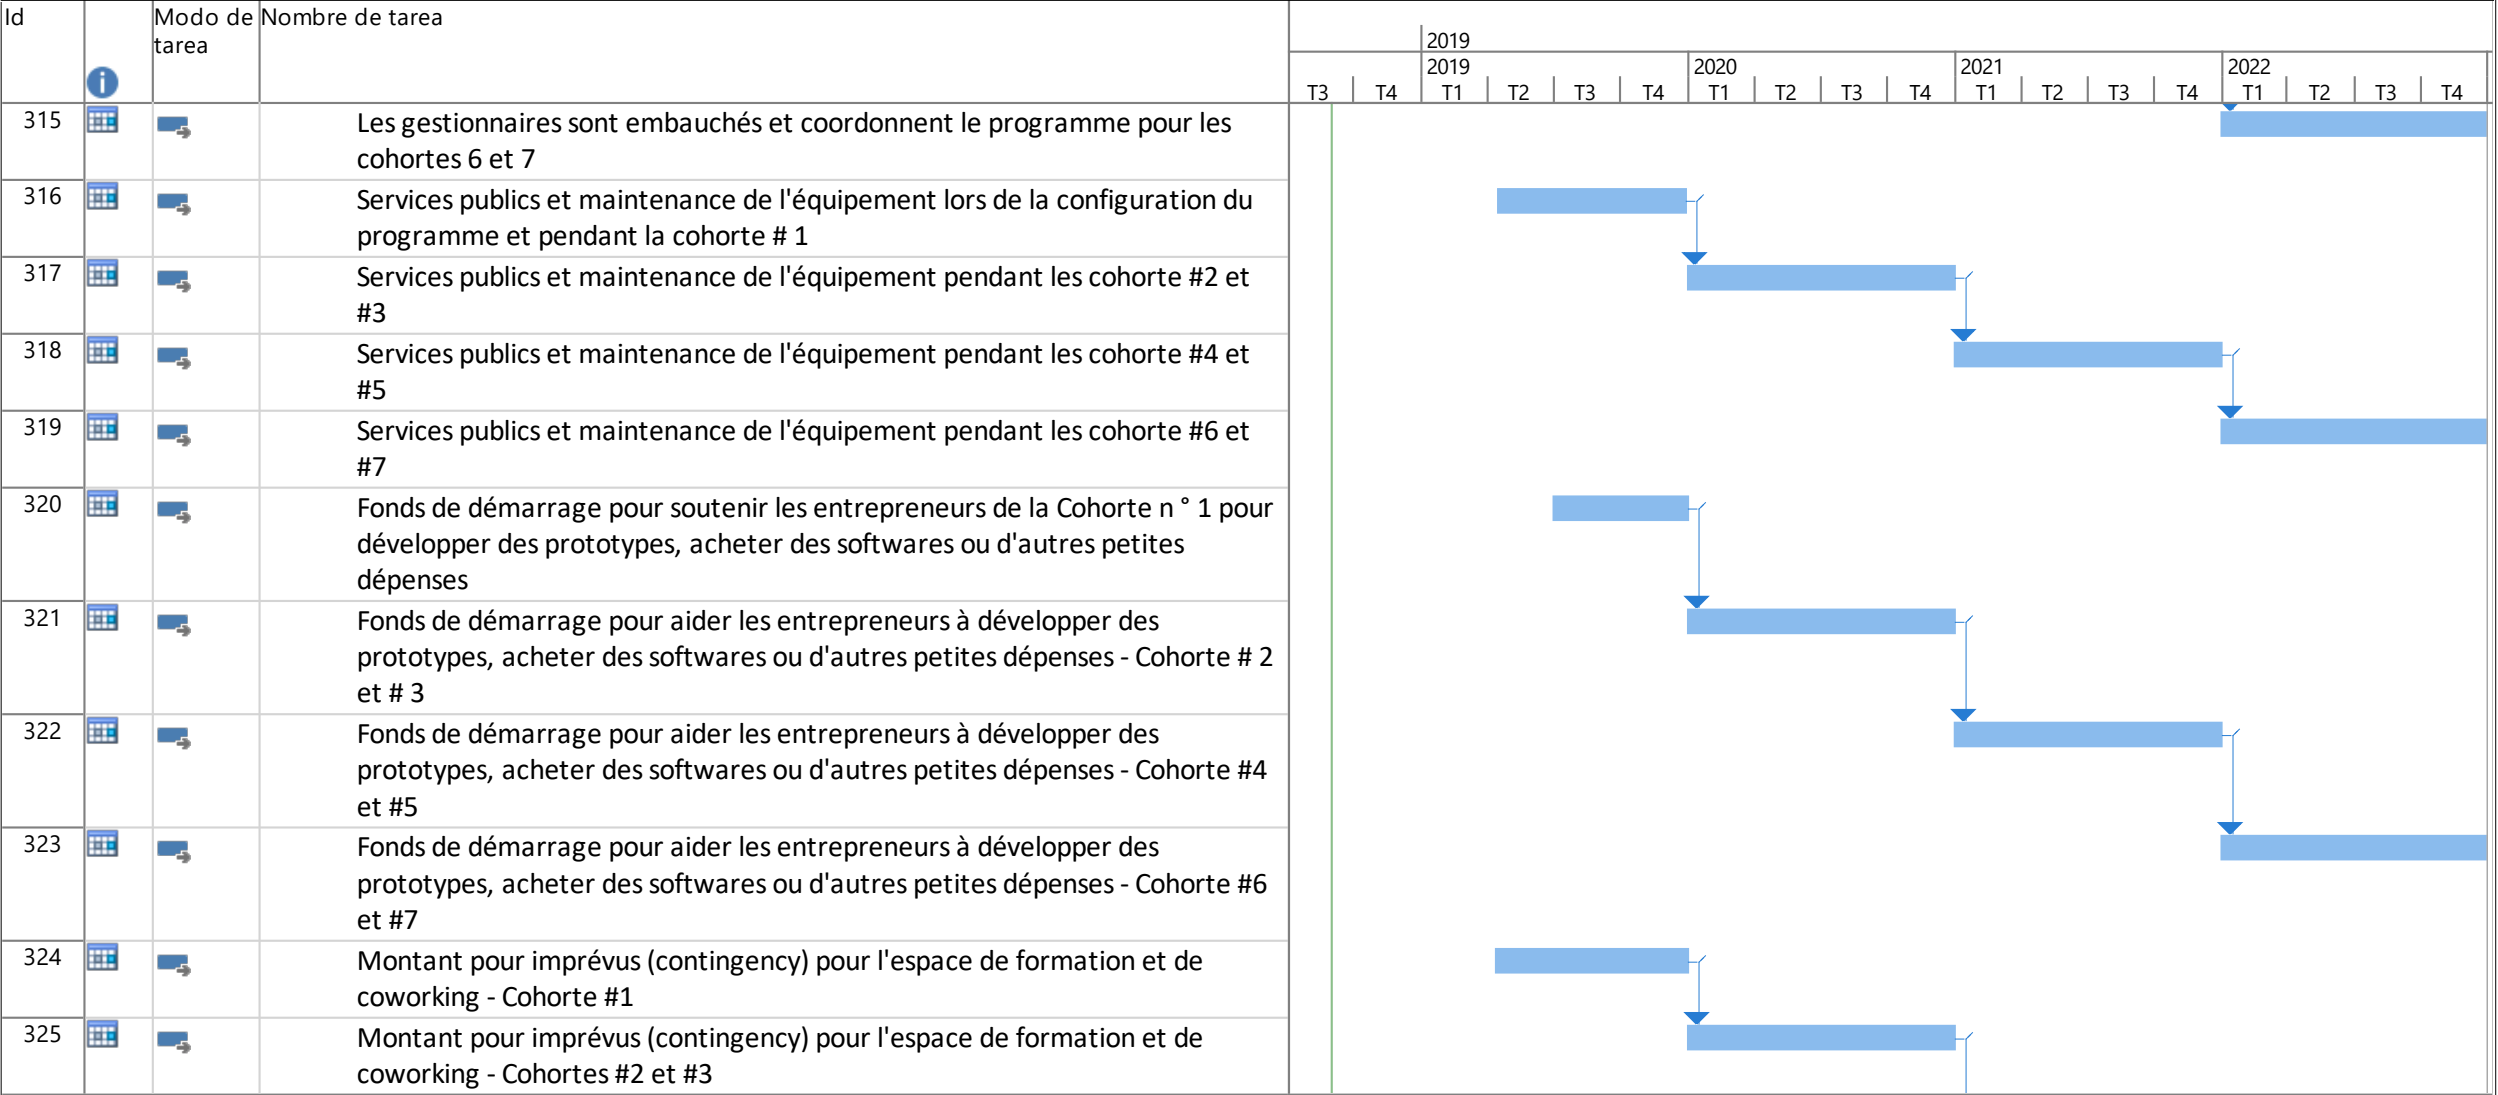

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18


Tarea

División

Hito


Resumen


Resumen del proyecto











Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración











Informe de resumen manual

Resumen manual


solo el comienzo

solo fin


Tareas externas











Hito externo

Fecha límite

Progreso


Progreso manual









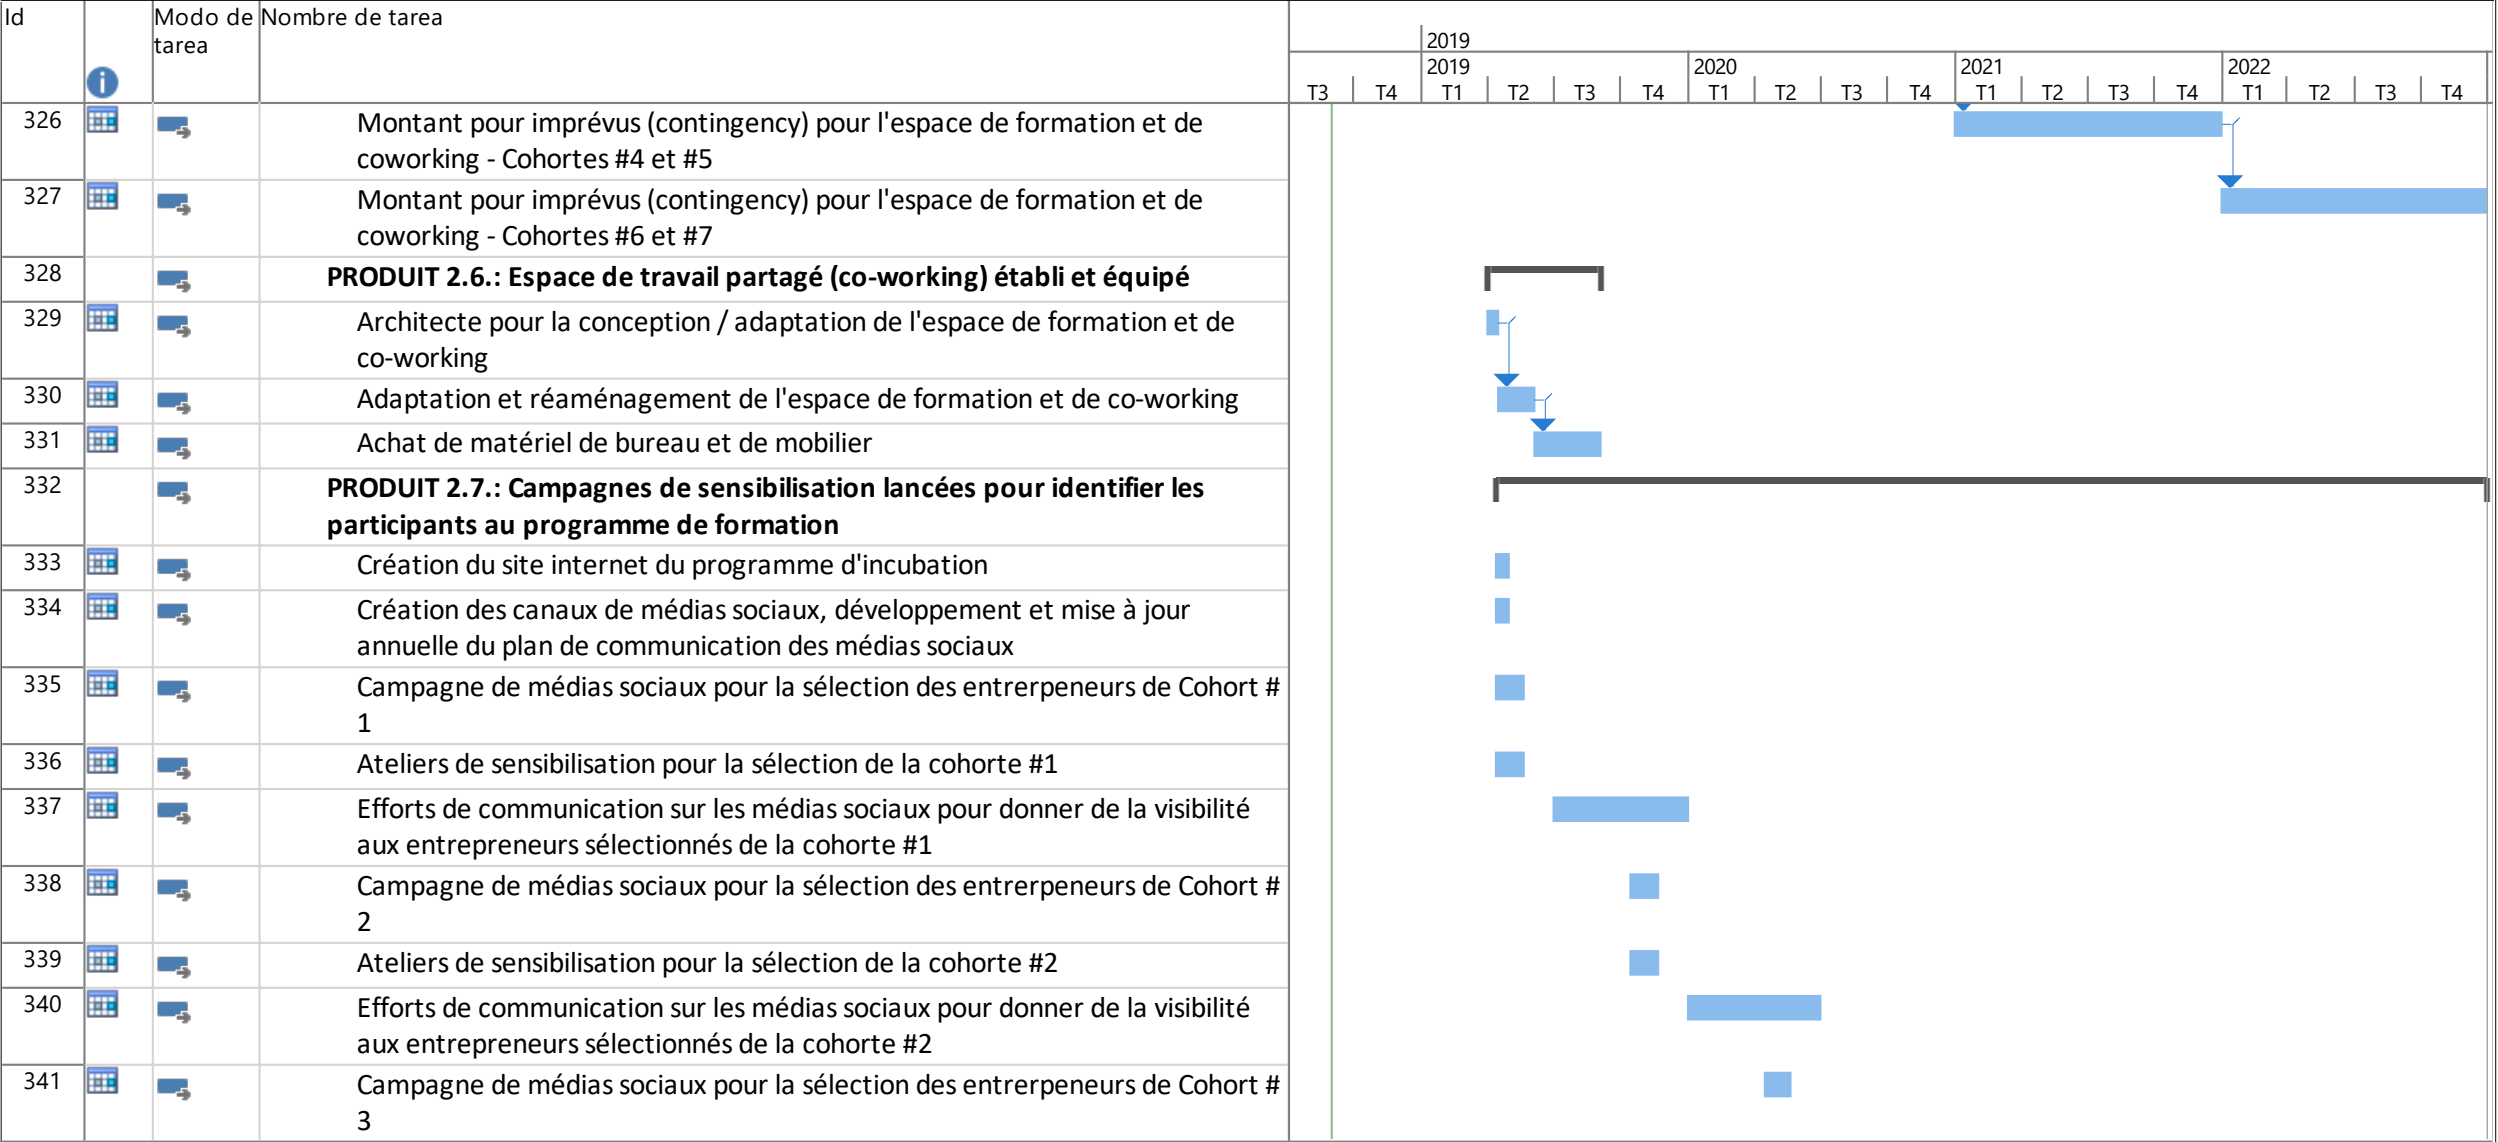

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18

Tarea


División


Hito

Resumen

Resumen del proyecto












Tarea inactiva


Hito inactivo

Resumen inactivo


Tarea manual

solo duración












Informe de resumen manual


Resumen manual


solo el comienzo


solo fin


Tareas externas












Hito externo


Fecha límite


Progreso

Progreso manual











Id		Modo de tarea	Nombre de tarea																		
				2019				2020				2021				2022					
				T3	T4	2019 T1	T2	T3	T4	2020 T1	T2	T3	T4	2021 T1	T2	T3	T4	2022 T1	T2	T3	T4
342			Ateliers de sensibilisation pour la sélection de la cohorte #3																		
343			Efforts de communication sur les médias sociaux pour donner de la visibilité aux entrepreneurs sélectionnés de la cohorte #3																		
344			Campagne de médias sociaux pour la sélection des entrepreneurs de Cohort # 4																		
345			Ateliers de sensibilisation pour la sélection de la cohorte #4																		
346			Efforts de communication sur les médias sociaux pour donner de la visibilité aux entrepreneurs sélectionnés de la cohorte #4																		
347			Campagne de médias sociaux pour la sélection des entrepreneurs de Cohort # 5																		
348			Ateliers de sensibilisation pour la sélection de la cohorte #5																		
349			Efforts de communication sur les médias sociaux pour donner de la visibilité aux entrepreneurs sélectionnés de la cohorte #5																		
350			Campagne de médias sociaux pour la sélection des entrepreneurs de Cohort # 6																		
351			Ateliers de sensibilisation pour la sélection de la cohorte #6																		
352			Efforts de communication sur les médias sociaux pour donner de la visibilité aux entrepreneurs sélectionnés de la cohorte #6																		
353			Campagne de médias sociaux pour la sélection des entrepreneurs de Cohort # 7																		
354			Ateliers de sensibilisation pour la sélection de la cohorte #7																		
355			Efforts de communication sur les médias sociaux pour donner de la visibilité aux entrepreneurs sélectionnés de la cohorte #7																		
356			PRODUIT 2.8 Nombre de formateurs engagés pour enseigner les cours et les modules spécialisés aux participants																		

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137 Fecha: jue 8/30/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

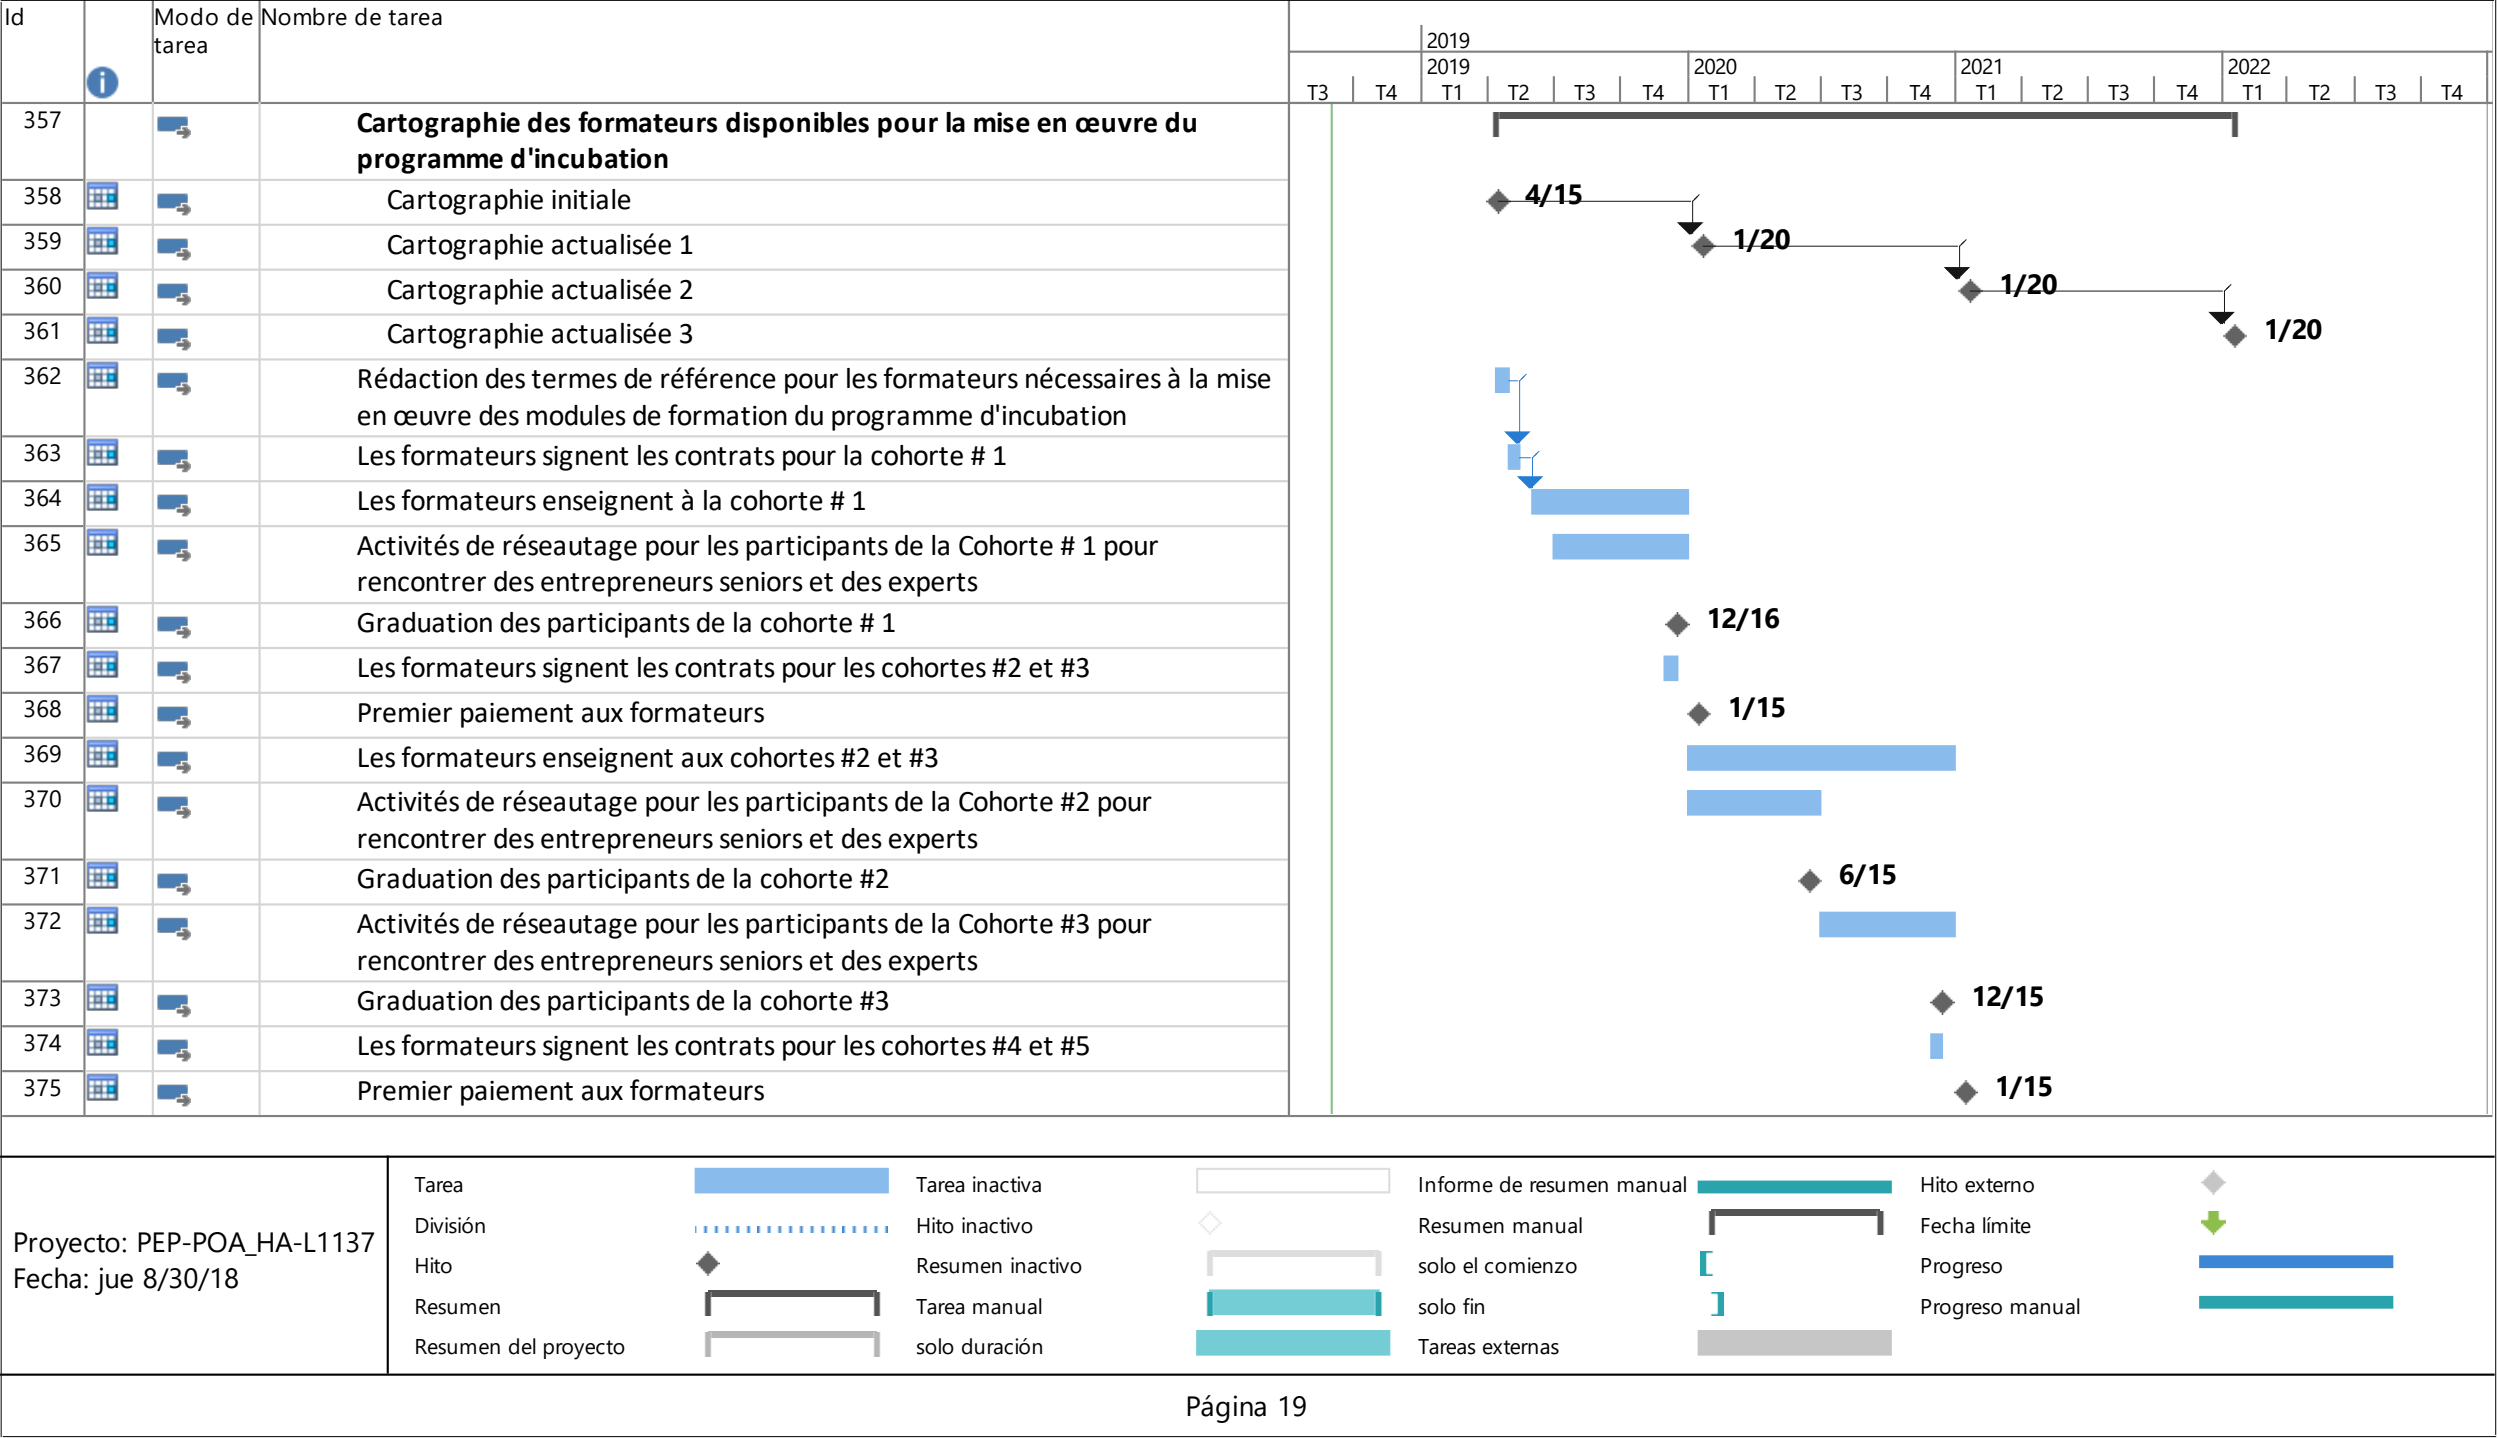

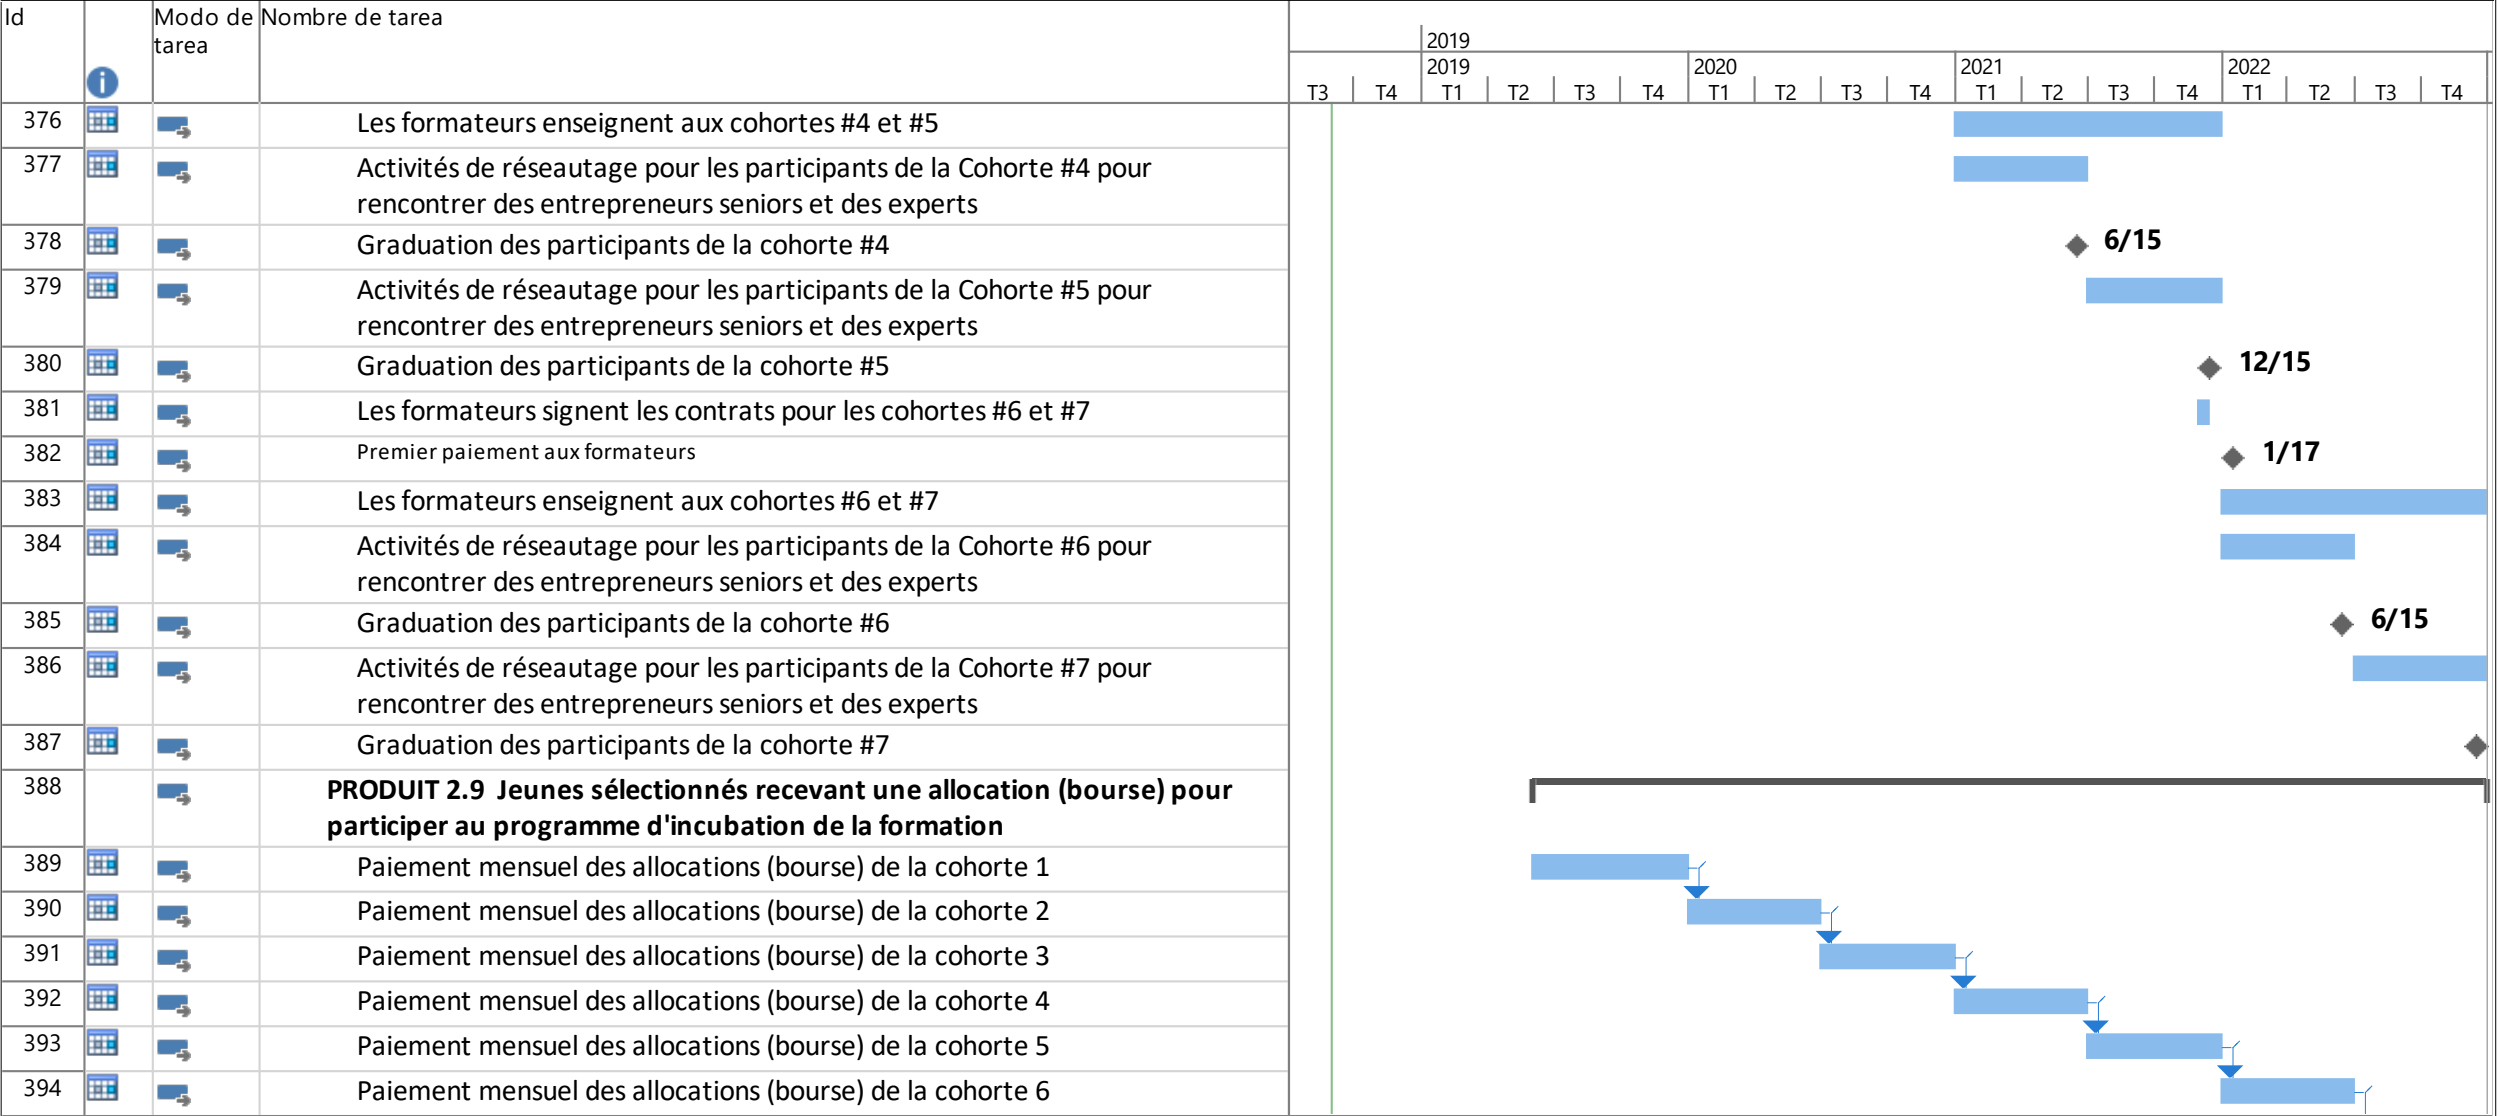

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


























































Tareas externas




















Hito externo

Fecha límite


Progreso


Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea																				
				2019		2019				2020				2021				2022					
				T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4		
395			Paiement mensuel des allocations (bourse) de la cohorte 7																				
396			Montant pour imprévus (contingency) pour les bourses de la cohorte 1																				
397			Montant pour imprévus (contingency) pour les bourses de la cohorte 2																				
398			Montant pour imprévus (contingency) pour les bourses de la cohorte 3																				
399			Montant pour imprévus (contingency) pour les bourses de la cohorte 4																				
400			Montant pour imprévus (contingency) pour les bourses de la cohorte 5																				
401			Montant pour imprévus (contingency) pour les bourses de la cohorte 6																				
402			Montant pour imprévus (contingency) pour les bourses de la cohorte 7																				
403			COMPOSANTE 3: RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL																				
404			Renforcement institutionnel du FAES																				
405			PRODUIT 3.1. Actualisation du Manuel des Operations du FAES																				
406			Elaboration des TDRs																				
407			Contrat preliminaire																				
408			No objection de la Banque aux TDRs																				
409			Reception des offres																				
410			Evaluation des offres																				
411			Negociation du contrat																				
412			Non Objection de la Banque																				
413			Signature du contrat																				
414			Envoi de la copie du contrat																				
415			Primer Pago																				
416			Segundo Pago																				
417			PRODUIT 3.2.: Niveau centraux et bureaux régionaux du FAES équipés																				

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137 Fecha: jue 8/30/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea																		
				2019																	
				T3	T4	2019 T1	T2	T3	T4	2020 T1	T2	T3	T4	2021 T1	T2	T3	T4	2022 T1	T2	T3	T4
418			Achat de vehicule (achat et installation)																		
419			Equipement IT pour FAES (central et regional)																		
420			Equipement de bureau pour FAES (central et regional)																		
421			Provision de bureau pour FAES (central et regional)																		
422			Kit de supervision																		
423			Reconditionnement des espaces																		
424			Service d'impression et photocopie																		
425			PRODUIT 3.3.: Cours de formation effectués																		
426			Cours de project management																		
427			Fase 1																		
428			Fase 2																		
429			Fase 3																		
430			Cours de gestion des ressources humaines																		
431			Cours de passation de marché																		
432			Fase 1																		
433			Fase 2																		
434			Cours de gestion des données																		
435			Cours d'ingenierie social																		
436			PRODUIT 3.4.: Systeme de gestion de projet et de contrat intégré au système de comptabilité																		
437			Interconnexion entre SIIGPP et TOMPRO																		
438			PRODUIT 3.5.: Systeme d'archivage papier et electronique de passation de marché conçu																		
439			Systematisation d'un système de gestion d'information et d'archivage																		
Proyecto: PEP-POA_HA-L1137 Fecha: jue 8/30/18			Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo												
			División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite												
			Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso												
			Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual												
			Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas														

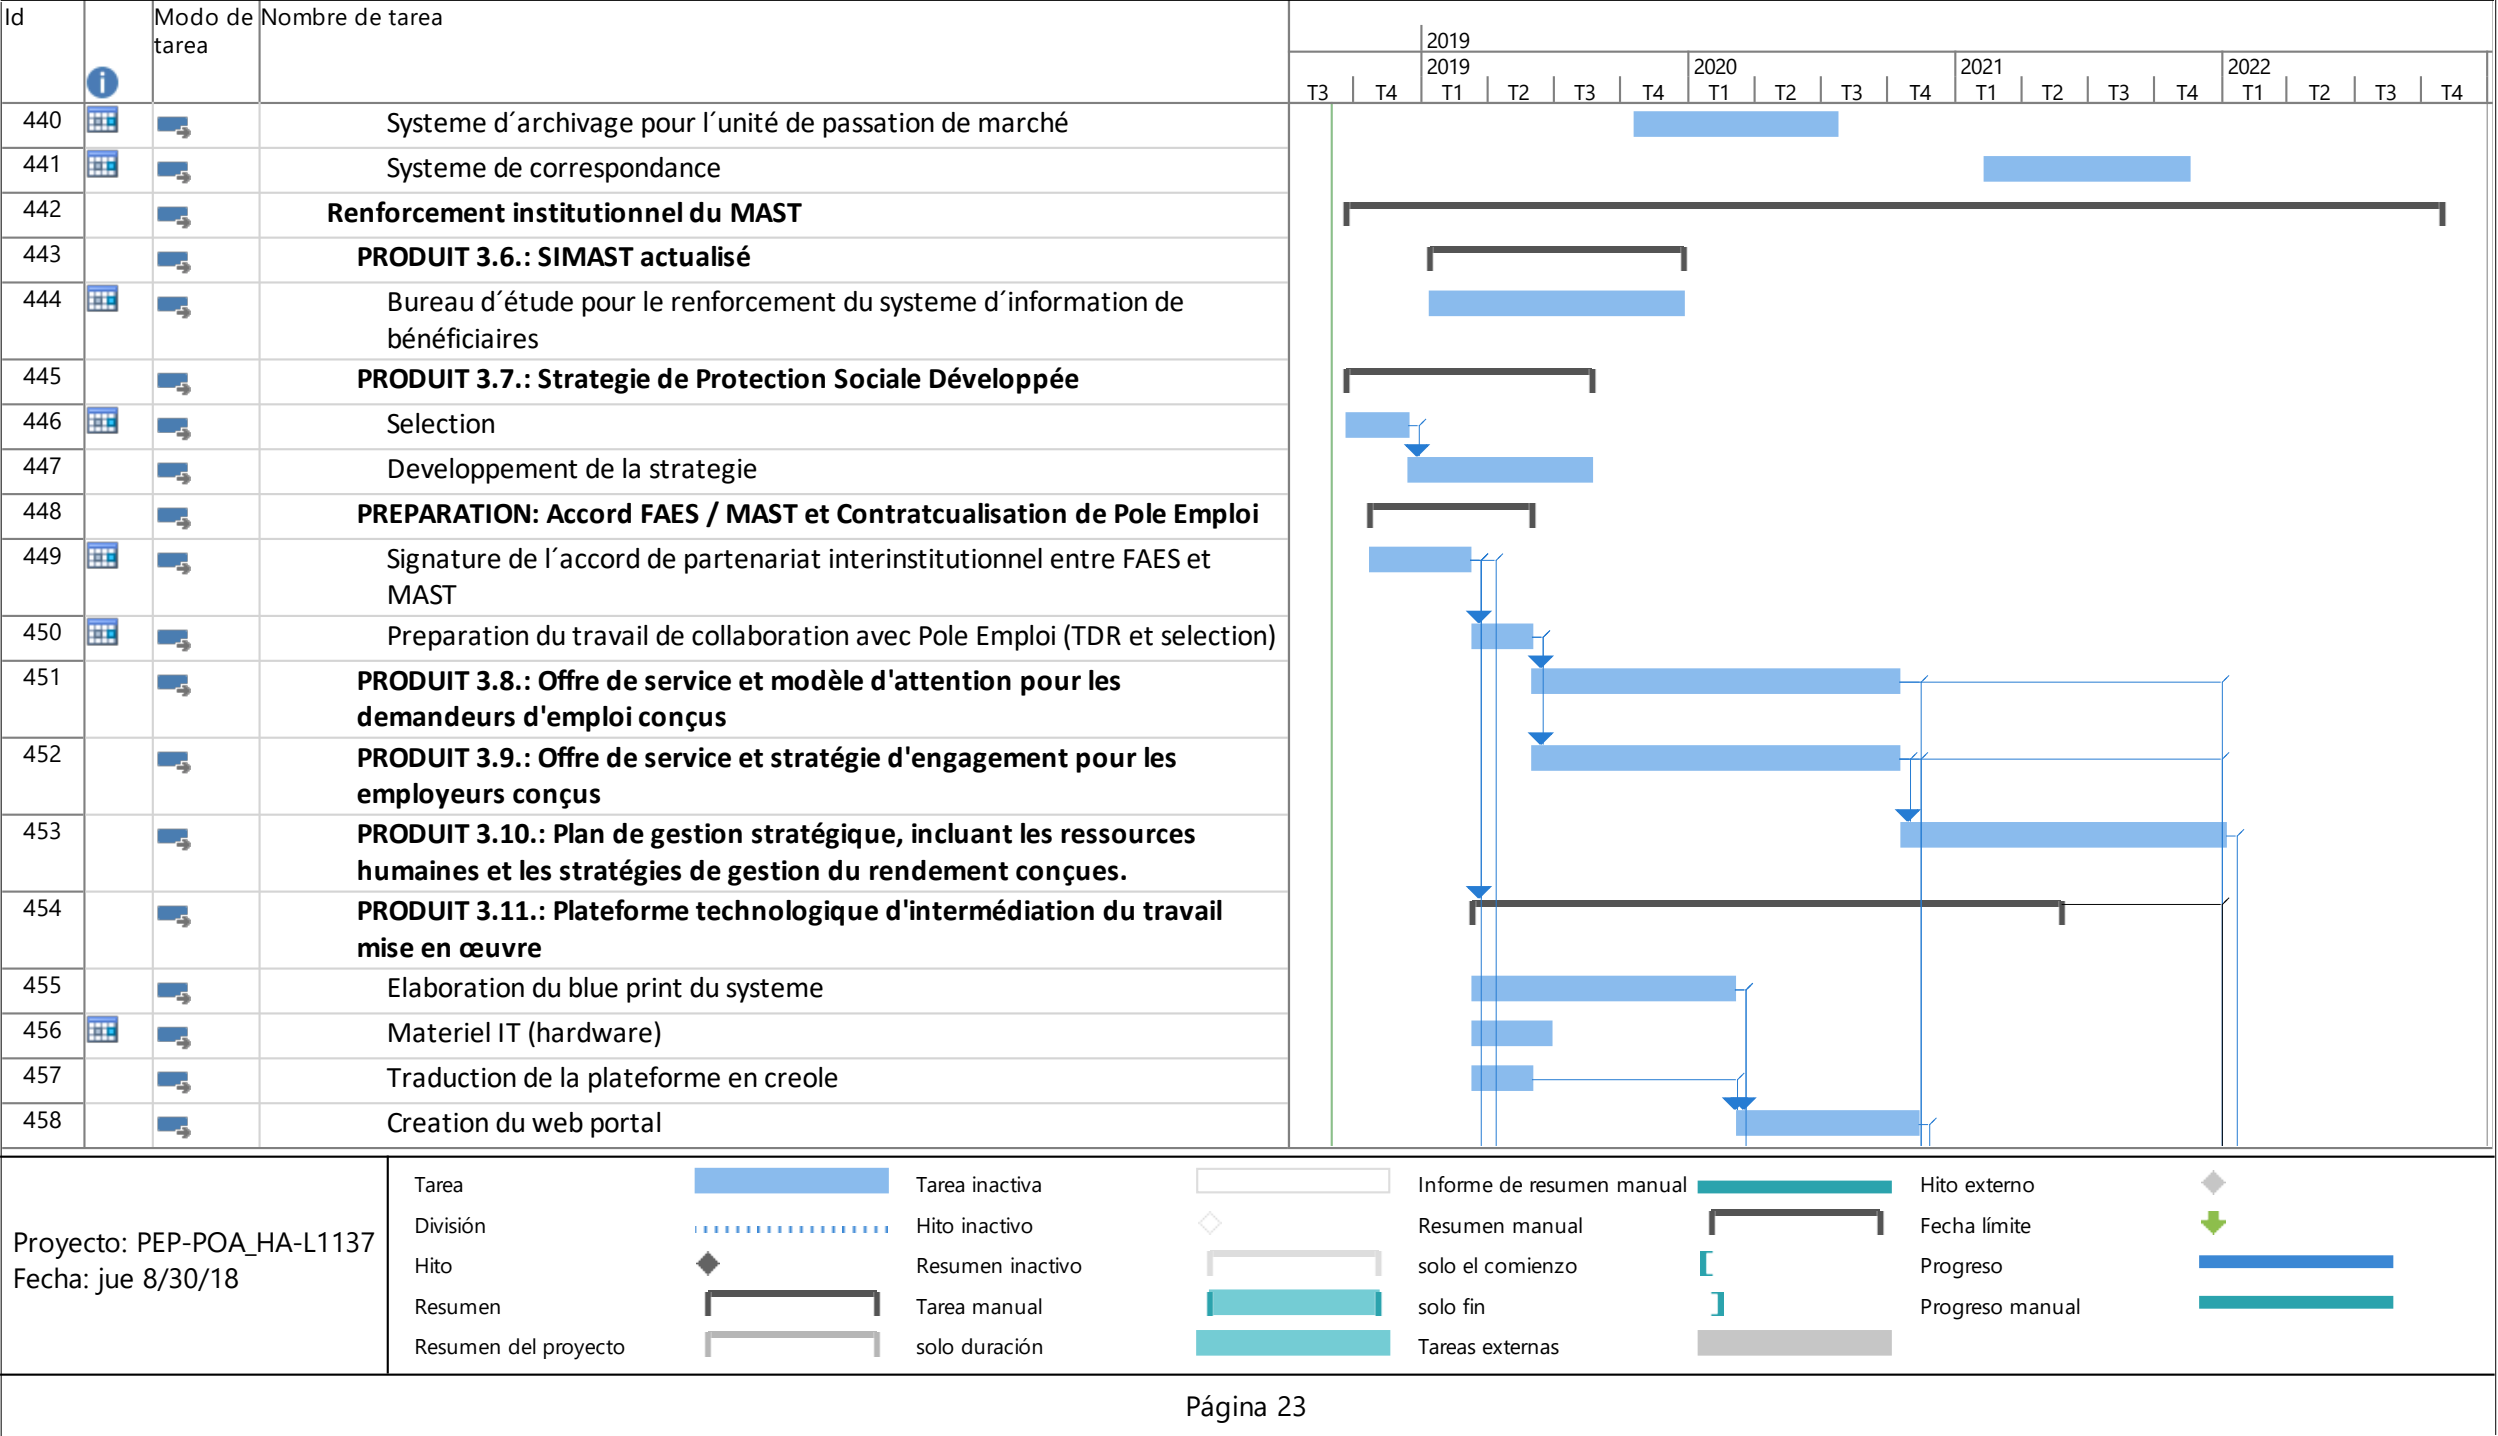

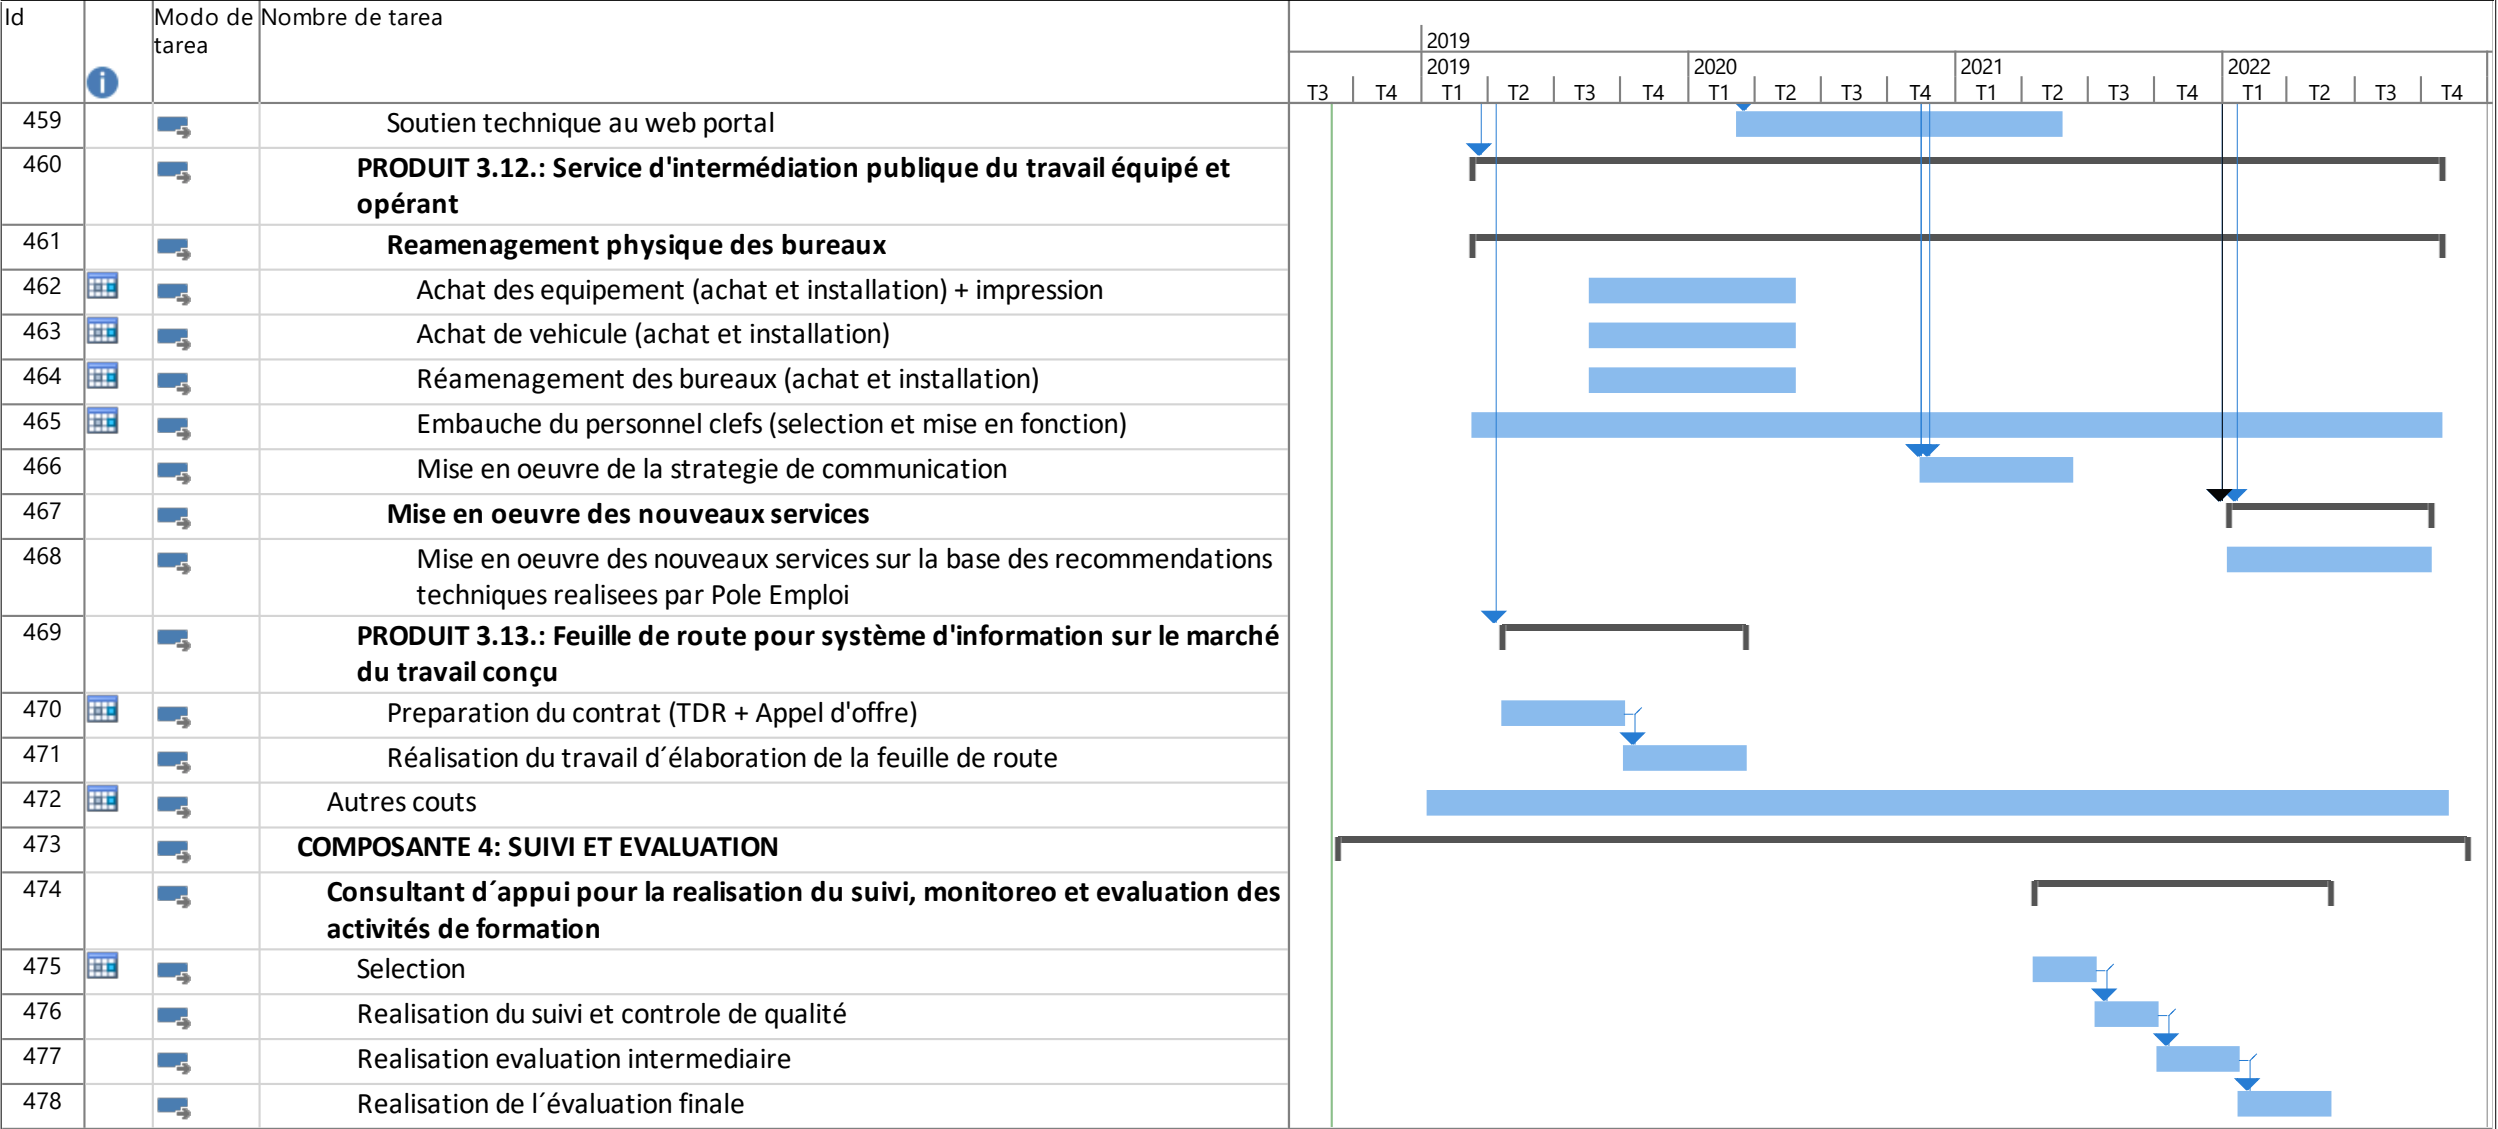

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

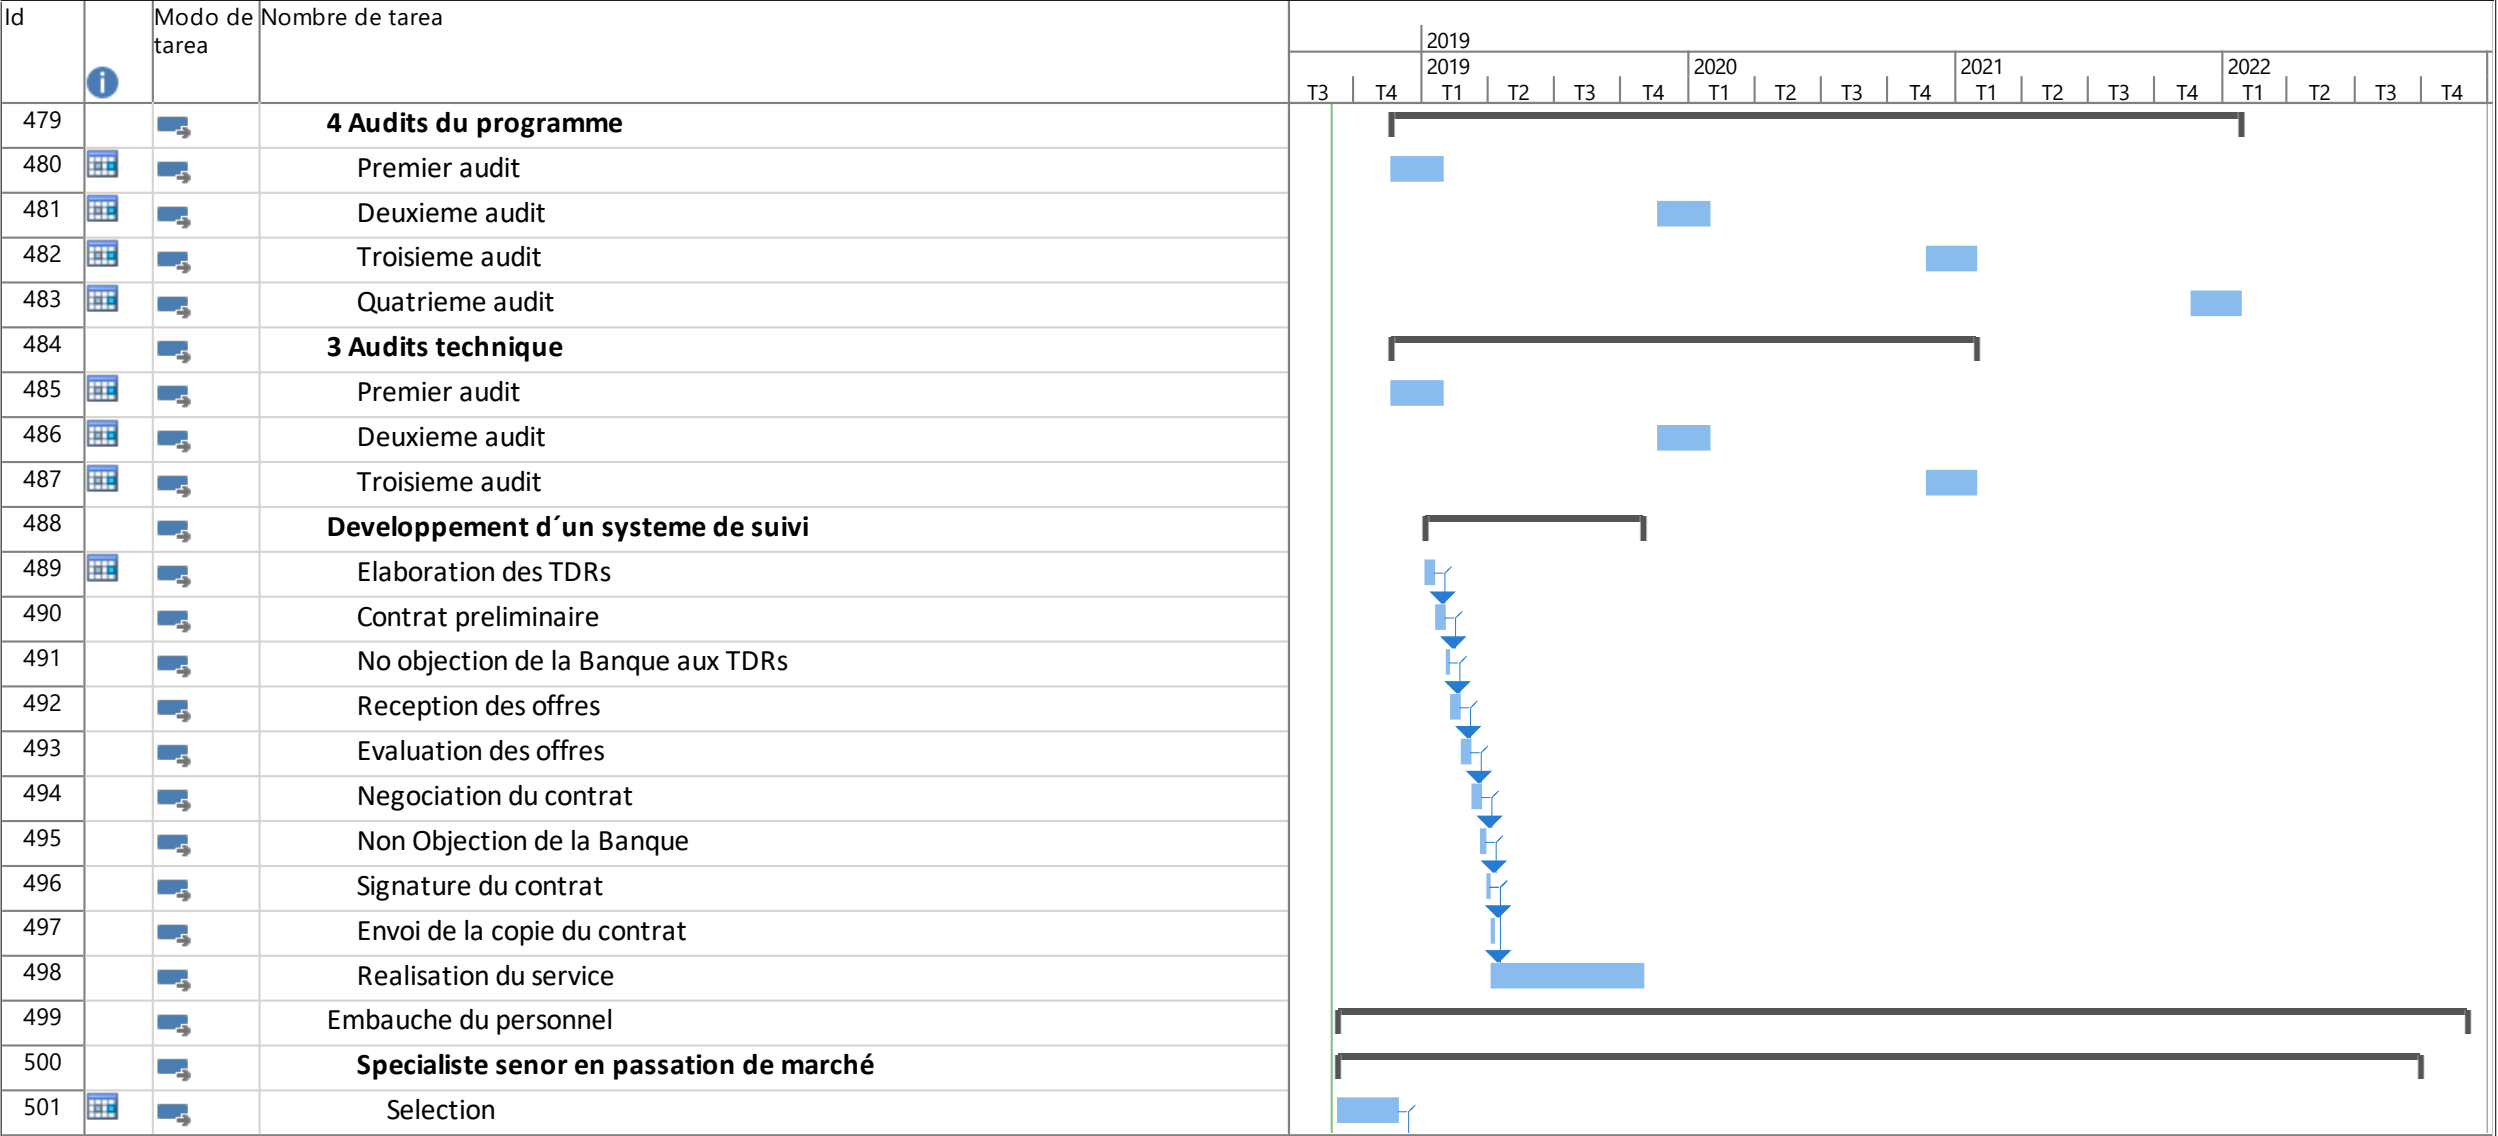

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137
Fecha: jue 8/30/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas































Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 25

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea																		
				2019				2020				2021				2022					
				T3	T4	2019 T1	T2	T3	T4	2020 T1	T2	T3	T4	2021 T1	T2	T3	T4	2022 T1	T2	T3	T4
502			Service																		
503			Specialiste en passation de marché																		
504			Selection																		
505			Service																		
506			Specialiste en planification des ressources et administration																		
507			Selection																		
508			Service																		
509			Specialiste financier																		
510			Selection																		
511			Service																		
512			Comptable																		
513			Selection																		
514			Service																		
515			Specialistes en suivi et evaluation (x3)																		
516			Selection																		
517			Service																		
518			Consultant spécialiste en sciences sociales pour l’accompagnement communautaire (x2)																		
519			Selection																		
520			Service																		
521			Consultant technique social niveau regional - Centre																		
522			Selection																		
523			Service																		

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137

Fecha: jue 8/30/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin



Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				T3	T4	2019	T1	T2	T3	T4	2020	T1	T2	T3	T4	2021	T1	T2	T3	T4	2022	T1	T2	T3	T4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
524			Consultant technique social niveau regional - Nord Est																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Proyecto: PEP-POA_HA-L1137

Fecha: jue 8/30/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
