



Operation Number: **AR-L1142**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/29/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/01/2016**
Division Chief validation date: **04/01/2016**
Country Representative validation date: **04/28/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Multiphase Primary Health Care Program for Managing Chronic Non-communicable Dis	Loan Number:	2788/OC-AR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD		
Team Leader:	Sanchez,Mario Alberto	Sector/Subsector:	HEALTH SERVICES
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1142	\$150,000,000.00	\$150,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$200,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1142	\$150,000,000.00	\$127,377,766.19	84.92%	\$22,622,233.81


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

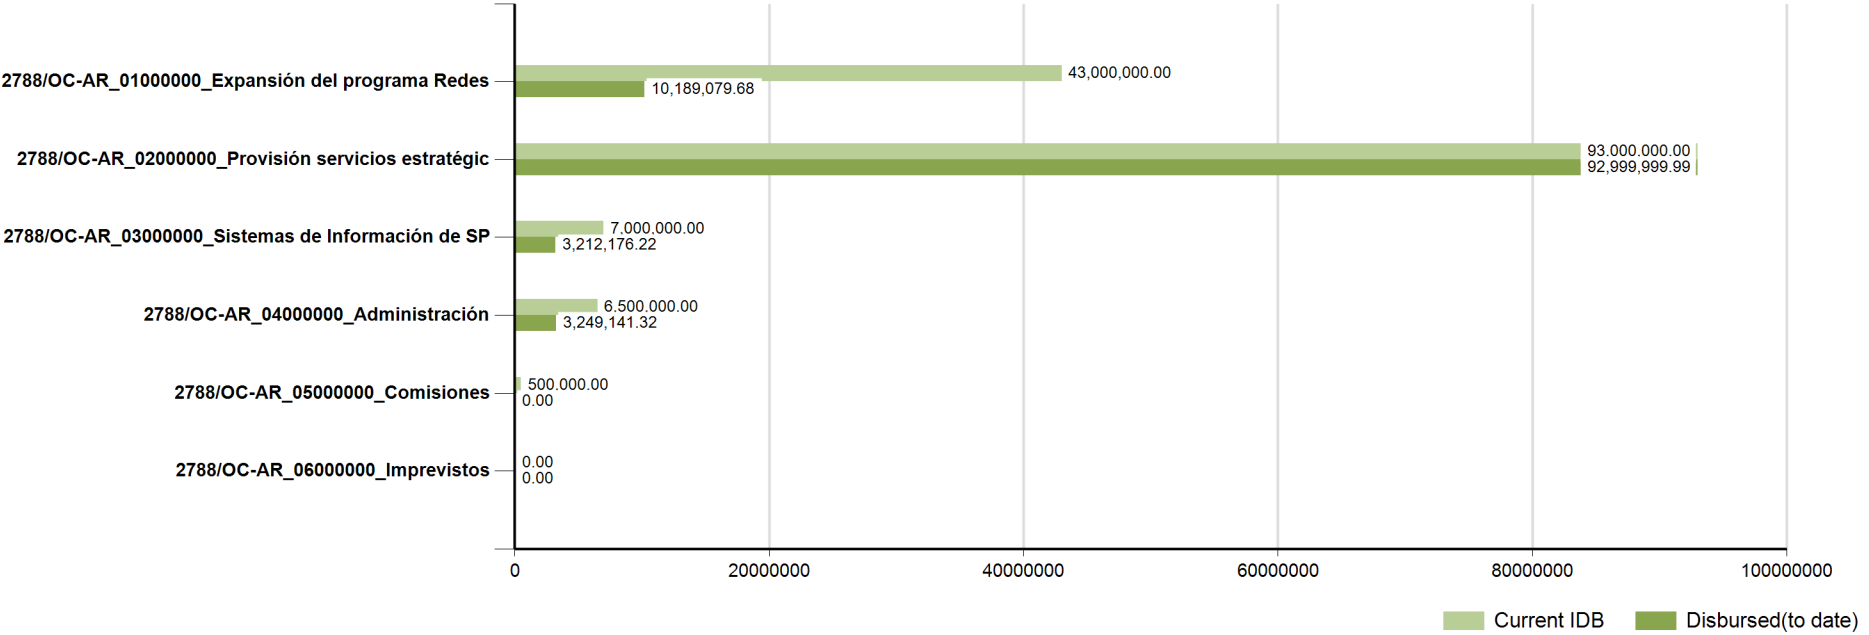


Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Personas clasificadas por Riesgo Cardiovascular Global										
Observation:	La línea de base es el valor esperado del indicador para el programa AR-L1020										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2016	2017	EOP
1.1 Personas de 40 a 64 años de edad, con cobertura pública exclusiva, clasificadas por Riesgo Cardiovascular Global	 RF	Individuals	295,660.00	2014	Auditorías médicas externas		P		490,236.00		490,236.00
							P(a)		47,987.00	0.00	418,485.00
							A	74,838.00			370,498.00
1.2 Hombres de 40 a 64, con cobertura pública exclusiva, que son clasificados por Riesgo Cardiovascular Global		Personas	100,806.00	2014	Auditoría médica externa		P		244,157.00		244,157.00
							P(a)		38,250.00		162,662.00
							A	23,606.00			124,412.00
Outcome:	2 Personas con riesgo cardiovascular alto bien seguidas										
Observation:	La línea de base corresponde al valor esperado para el indicador de AR-L1020										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2016	2017	EOP
2.1 Personas clasificadas con riesgo cardiovascular global mayor a 10% que alguna vez realizaron una consulta de seguimiento posterior a su clasificación.		Personas	52,689.00	2014	Auditoría médica externa	Este indicador será modificado a principios de 2014 para reflejar que el cuidado de pacientes es un proceso continuo. El indicador pasará de ser un stock a un flujo anual.	P		91,656.00		91,656.00
							P(a)		38,250.00		162,662.00
							A	39,173.00			124,412.00

Outcome:	3 Población con cobertura pública exclusiva empadronada										
Observation:	La línea de base corresponde al valor esperado del indicador para AR-L1020.										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2016	2017	EOP
							P		3,750,000.00		3,750,000.00
3.1 Población pública exclusiva mayor a 6 años empadronada		Personas	2,734,158.00	2014	Auditoría Médica externa		P(a)		0.00		3,750,000.00
							A	597,360.00			3,331,518.00
Outcome:	4 Consultantes a los que les prescribieron medicamentos que los reciben de REMEDIAR										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2016	2017	EOP
							P		95.00		95.00
4.1 Porcentaje de consultantes en centros de atención primaria con cobertura pública exclusiva que les prescribieron medicamentos que los recibieron de REMEDIAR		Porcentaje	87.00	2014	Encuesta de consultantes a CAPS		P(a)		90.00		90.00
							A				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Servicios de Salud		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Proyectos jurisdiccionales bajo la modalidad "Redes 2" aprobados.	Provincias	P	10.00	15.00	P	1,000,000.00	2,000,000.00
		P(a)	16.00	24.00	P(a)	2,502,548.00	4,046,988.00
		A	15.00	22.00	A	2,124,820.00	2,705,473.00
Provincias ejecutando proyectos provinciales "Redes 2" por año.	Provincias	P	10.00	15.00	P	26,500,000.00	37,500,000.00
		P(a)	23.00	84.00	P(a)	11,541,599.00	36,253,044.00
		A	33.00	40.00	A	9,672,117.00	10,097,233.00
Personal sanitario capacitado.	Personal sanitario	P		3,000.00	P		1,000,000.00
		P(a)	1,495.00	7,352.00	P(a)	943,394.00	1,596,647.00
		A	2,835.00	3,947.00	A	762,652.00	1,121,394.00
Informe de evaluación del piloto de cáncer colorrectal finalizado.	Informe	P		1.00	P		2,100,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	898,293.00	2,000,000.00
		A	1.00	1.00	A	369,703.00	1,034,573.00
Evaluación cuali-cuantitativa de los factores condicionantes a la aplicación yadherencia a las normas de evaluación de Riesgo Cardiovascular Global en efectores del Primer Nivel de Atención finalizada.	Informe	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)		2.00	P(a)	59,250.00	0.00
		A	1.00	2.00	A	0.00	0.00
Estudios de caso de estrategias innovadoras provincales evaluadas.	Estudios	P	7.00	10.00	P	200,000.00	300,000.00
		P(a)	5.00	10.00	P(a)	254,060.00	299,999.00
		A	0.00	0.00	A	78,073.00	118,717.00
Provisión de servicios estratégicos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Tratamientos con medicamentos escenciales distribuidos.	Tratamientos	P	31,000,000.00	92,877,880.00	P	42,180,000.00	126,540,000.00
		P(a)	38,500,000.00	154,648,401.00	P(a)	24,937,562.00	134,851,370.00
		A	43,111,571.00	111,885,799.00	A	29,720,317.00	134,851,370.00
Unidades de dispensa de medicamentos equipadas para la mejora en la gestión clínica.	Unidades de dispensa de medicamentos	P	816.00	1,360.00	P	4,800,000.00	8,000,000.00
		P(a)	1,241.00	1,784.00	P(a)	6,109,746.00	1,276,597.00
		A	1,054.00	1,141.00	A	1,150,586.00	1,276,597.00
Nuevos tratamientos (estatinas y amlodipina) distribuidos.	Tratamientos	P	67,500.00	101,250.00	P	3,500,000.00	5,000,000.00
		P(a)	0.00	513,149.00	P(a)	0.00	0.00
		A	406,303.00	513,149.00	A	0.00	0.00
Informe de identificación de procesos críticos para conseguir la certificación de procesos de Remediar aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación.	Informe	P		1.00	P		100,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	42,324.00	52,310.00
		A	0.00	1.00	A	41,360.00	52,310.00
Personal sanitario capacitado en uso racional de medicamentos.	Personal sanitario	P	2,700.00	4,000.00	P	700,000.00	1,050,000.00
		P(a)	5,209.00	10,917.00	P(a)	1,033,489.00	1,659,311.00
		A	3,200.00	6,804.00	A	958,907.00	1,549,311.00
Estudios y evaluaciones para el Programa Remediar finalizados.	Estudios	P	3.00	5.00	P	210,000.00	220,000.00
		P(a)	4.00	12.00	P(a)		18,451.00
		A	5.00	6.00	A	8,570.00	8,570.00
Consolidación de sistemas de información de salud pública		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP

Informe sobre Sistemas de Informacion a nivel de Centros de Atencion Primaria de la Salud.	Informe	P		1.00	P		3,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
Centros de atención primaria de la salud informatizados.	Centros de atención primaria de la salud	P	600.00	1,000.00	P	1,200,000.00	2,000,000.00
		P(a)	1,241.00	1,512.00	P(a)	967,998.00	2,407,997.00
		A	807.00	894.00	A	1,113,877.00	1,456,490.00
Hospitales que reportan al Registro Integral de Tumores de la Argentina.	Hospitales	P		10.00	P		1,000,000.00
		P(a)	16.00	24.00	P(a)	650,284.00	1,999,999.00
		A	10.00	24.00	A	480,866.00	746,897.00
Provincias cuyos hospitales han sido incorporados al Sistema de Información de Tamizaje.	Hospitales	P		7.00	P		1,000,000.00
		P(a)		12.00	P(a)	1,228,953.00	2,790,760.00
		A	0.00	12.00	A	1,081,968.00	1,606,295.00

Comisiones y administración
Imprevistos

Other Cost		2015	Cost
Comisiones	P	\$250,000.00	\$500,000.00
	P(a)	\$0.00	\$500,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Imprevistos	P	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00
	P(a)	\$0.00	\$0.00
	A	\$0.00	\$0.00
Administración	P	\$3,400,000.00	\$6,500,000.00
	P(a)	\$3,498,891.00	\$10,246,039.00
	A	\$5,981,026.00	\$8,009,309.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$84,940,000.00	\$199,910,000.00
	P(a)	\$54,668,391.00	\$199,999,512.00
	A	\$53,544,842.00	\$164,634,539.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
