



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO JULIO 2017 - DICIEMBRE 2017

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Ganadería Sostenible en Nicaragua

Nro. Proyecto: NI-T1237 - Proyecto No.: ATN/ME-16165-NI

Propósito: Contribuir a desarrollar las bases para el funcionamiento del SSPB y generar el conocimiento y experiencia que demuestren su viabilidad operativa y económica que permitan su replicabilidad.

País Administrador

NICARAGUA

País Beneficiario

NICARAGUA

Agencia Ejecutora:

COMISIÓN NACIONAL GANADERA DE NICARAGUA


Líder equipo de diseño:

GRISelda SOTO BRAVO


Líder equipo de supervisión:

GRISelda SOTO BRAVO


CICLO DEL PROYECTO



RECURSOS

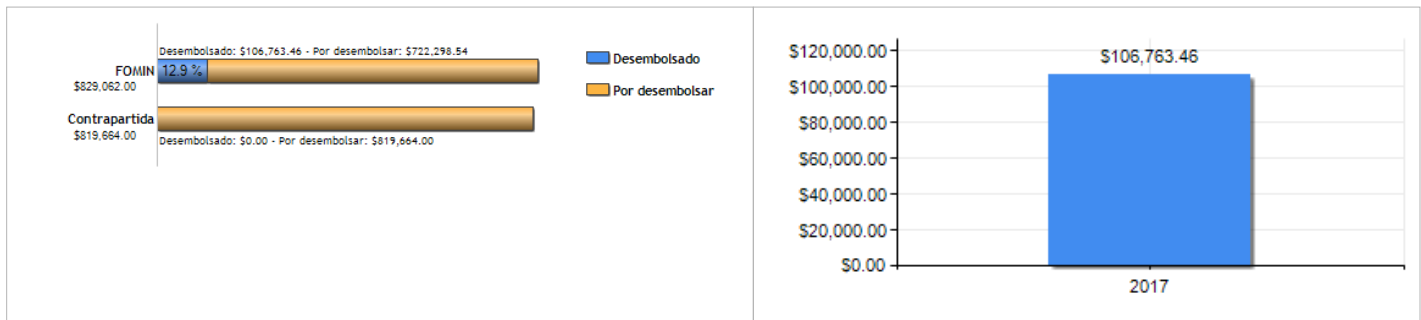

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

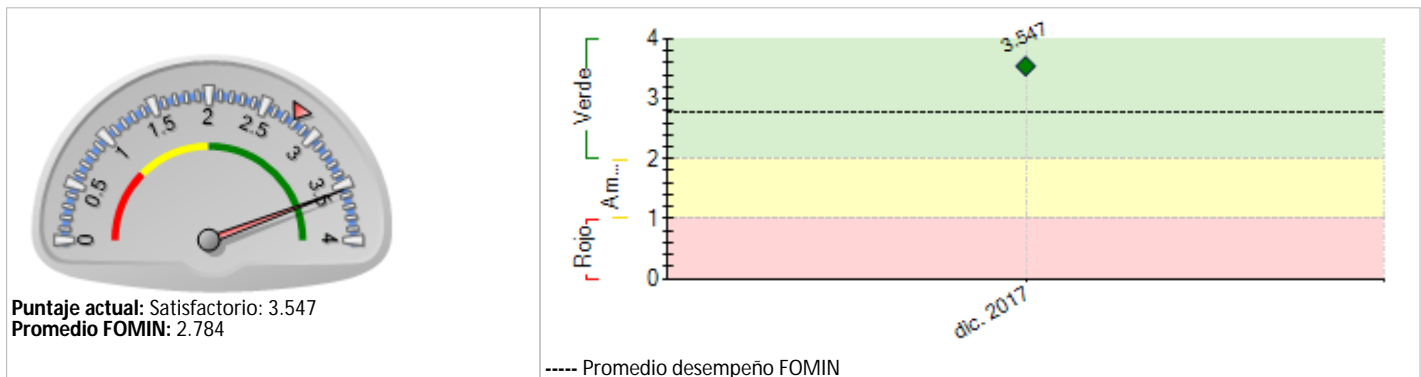

RIESGOS EXTERNOS


CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: Media

Adquisiciones: Alto

Capacidad Técnica: Media

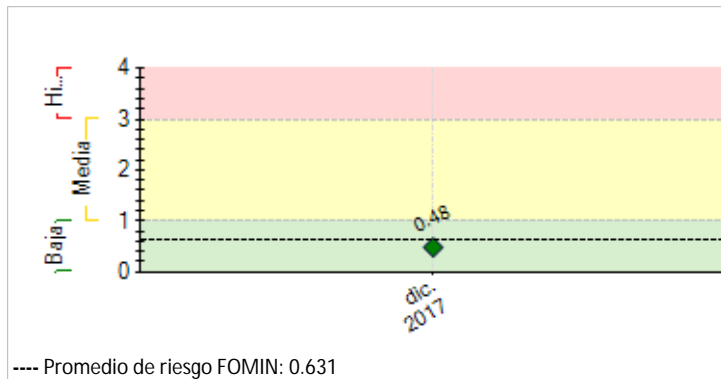

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

T

El período que se informa es del 12 de julio al 31 de diciembre del 2017. Las principales actividades estuvieron enfocadas en el cumplimiento de condiciones previas y las siguientes actividades: 1) Contratación y acreditación del equipo técnico del proyecto en el SSPB y SNTB, (Primer Hito cumplido); 2) Constitución del Consejo consultivo del proyecto; 3) Realización de 6 eventos de sensibilización a productores con una participación de 234 productores, 78% de la meta prevista, 11.97% mujeres; 4) Contratación de consultoría para el diseño de estrategia de comunicación del proyecto necesaria para identificar los mecanismos apropiados de comunicación y transmisión de información a productores y otros actores del sector dado lo novedoso del SSPB; 5) Contratación de consultoría para adecuación de guías de capacitación a productores en temas del SSPB.

Entre las principales limitantes, la disposición de los productores de participar del proyecto por lo novedoso del SSPB y la falta de información al respecto en el ambiente del sector ganadero. No obstante, Conagan ha trabajado en la estrategia de comunicación y los talleres de sensibilización con lo que se ha logrado el acercamiento de más de 300 productores.

En el próximo semestre se estará trabajando en finalizar de la estrategia de comunicación del proyecto, talleres de capacitación a productores sobre los temas establecidos en el SSPB así como inicio del proceso de diagnóstico de fincas con el IPSA, línea de base, entre otros.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Este corresponde al primer PSR del Proyecto. El Sistema PSR en el período de reporte generó algunos inconvenientes, por lo que se da cumplimiento al PSR, en el próximo período se dará seguimiento a que el organismo socio, adjunte las evidencias de cumplimiento de los indicadores reportados, e incorpore las lecciones aprendidas conforme la guía facilitada.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Desarrollar un piloto de modelo segregado de producción bovina escalable, que permita a medianos productores mejorar su competitividad e incrementar sus ingresos por relaciones más estables de venta en la cadena y al sector ganadero nicaragüense acceder a mercados internacionales de mayor valor y sostenibilidad ambiental.	I.1	Incremento porcentual del promedio anual de ingresos por venta en fincas certificadas bajo el SSPB.	0			20	0	
			Jul. 2017			Jul. 2021		
	I.2	Incremento porcentual del promedio anual de producción en Kg de carne por Hectárea en las fincas certificadas.	0			25	0	
			Jul. 2017			Jul. 2021		
	I.3	Incremento porcentual del promedio anual de producción de leche por cabeza (litros)	3.5			20	0	
			Jul. 2017			Jul. 2021		
	I.4	Toneladas de dióxido de carbono (CO ₂ e) removidas /almacenadas. Indicador proxi.	0			10000	0	
			Jul. 2017			Jul. 2021		
	I.5	Fincas certificadas son propiedad y/o administradas por mujeres.	0			10	0	
			Jul. 2017			Jul. 2021		
Propósito: Contribuir a desarrollar las bases para el funcionamiento del SSPB y generar el conocimiento y experiencia que demuestren su viabilidad operativa y económica que permitan su replicabilidad.	R.1	Incremento porcentual del promedio anual de ingresos por venta en fincas certificadas bajo el SSPB.	0			20	0	
			Jul. 2017			Jul. 2021		
Componente 1: Sensibilización, divulgación y coordinación institucional del proyecto Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Estrategia de comunicación y divulgación del proyecto diseñada y aprobada por la Gerencia de CONAGAN.	0			1	0.5	En curso
			Jul. 2017			Jul. 2018	Dic. 2017	
	C1.12	Productores de las áreas geográficas de influencia del proyecto sensibilizados acerca de los beneficios del SSPB.	0			300	234	En curso
			Jul. 2017			Jul. 2018	Dic. 2017	
	C1.13	Sistematización metodológica de la implementación piloto del SSPB.	0			1		
			Jul. 2017			Jul. 2021		
	C1.14	Estudios de caso elaborados y aprobados.	0	1		2		
			Jul. 2017	Jul. 2020		Jul. 2021		
	C1.15	Plan de Sostenibilidad y Escala de la implementación piloto del SSPB.	0			1		
			Jul. 2017			Jul. 2021		
	C2.11	Personal técnico del proyecto habilitados como operadores	0			15	15	Finalizado

Componente 2: Desarrollo de capacidades e implementación del modelo piloto del SSPB. Peso: 40% Clasificación: Satisfactorio		del Sistema de Trazabilidad Bovina (STB) y veterinarios del Sistema Segregado de Producción Bovina. (SSPB)	Jul. 2017				Jul. 2018	Oct. 2017	
	C2.12	Guías de capacitación adaptadas a los productores en los requisitos establecidos en el SSPB.	0				6	6	En curso
			Jul. 2017				Jul. 2018	Dic. 2017	
	C2.13	Productores capacitados en las condiciones establecidas en el SSPB para alcanzar la certificación de finca segregada. Acumulativo	0	105	210	315	350		
			Jul. 2017	Jul. 2018	Jul. 2019	Jul. 2020	Jul. 2021		
	C2.14	Número de Fincas que obtienen certificación del SSPB. Acumulativo	0	100	200		300		
			Jul. 2019	Nov. 2019	Jul. 2020		Jul. 2021		
	C2.15	Número de terneros nacidos en fincas segregadas identificados mediante arete electrónico y registrados en el STB.	0	1200	2400		3600		
			Jul. 2017	Jul. 2019	Jul. 2020		Jul. 2021		
	C2.16	Transportistas capacitados sobre normas de bienestar animal y transportación del SSPB. Acumulativo.	0	30	60		60		
			Jul. 2017	Jul. 2018	Jul. 2020		Jul. 2021		
	C2.17	Número de productores con fincas certificadas que implementan al menos 2 de tecnologías climáticamente inteligentes	0	50	150		300		
				Nov. 2019	Nov. 2020		Jul. 2021		
	C2.18	Incremento del promedio anual de producción de leche por cabeza (litros)	3.5	3.67	3.86		4.25		
			Jul. 2017	Jul. 2019	Jul. 2020		Jul. 2021		
Componente 3: Formalización de la comercialización del SSPB Peso: 50% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Número de contratos de compra-venta formalizados entre las fincas certificadas y los mataderos. Acumulativo	0	100	200		300		
			Jul. 2017	Jul. 2019	Jul. 2020		Jul. 2021		
	C3.12	Propuesta de norma de calidad de la carne bovina Nicaragüense diseñada y sometida a consideración de la autoridad competente	0				1		
			Jul. 2017				Jul. 2021		
	C3.13	Inversiones realizadas en fincas segregadas financiadas por el sistema financiero (Monto en dólares).	0	100000	500000		1000000		
			Jul. 2017	Jul. 2019	Jul. 2020		Jul. 2021		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	1	Ene. 2018	10	Ago. 2017	Logrado
H1 Productores capacitados en temas establecidos en el SSPB para certificación de Fincas segregadas	105	Jul. 2018			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Riesgo de mercado. Existe incertidumbre por parte de los ganaderos en obtener mejores precios que compensen su esfuerzo en certificar su finca y producir una carne de mejor calidad.	Baja	Se desarrollará un proceso de sensibilización en los productores y mataderos (mercado que exporta) sobre la importancia de contar con finca certificada dentro del SSPB, pero ante todo que cumpla con la calidad.	Invitado Proyecto
2. El productor no pueda adoptar las nuevas tecnologías por falta de acceso a financiamiento.	Baja	entidades financieras como Fundación Fundeser y Financiera FDL estarán participando en el proyecto facilitando líneas de crédito a los productores	Invitado Proyecto
3. Riesgo de la rentabilidad del modelo. Dado que se probará una normativa recién impulsada por el gobierno, aún se carece de resultados concretos que permitan demostrar con objetividad la rentabilidad del modelo.	Baja	El proyecto ha logrado integrar en la cadena de valor a los procesadores industriales, quienes tienen gran interés en que se logre adoptar el modelo en el país, lo que asegurará de alguna manera mejor mercado al producto que se genere en el marco de la operación. Por otro lado, los productores primarios están conscientes que el modelo tradicional de producción debe cambiar y por ello el proyecto prevé trabajar con aquellos que están dispuestos y presentan mejores condiciones para probar y afinar el modelo. Puede que la rentabilidad se logre más allá del período de ejecución del proyecto, dependiendo de las inversiones que deban realizarse. No obstante, se prevén que los resultados al corto plazo en calidad y productividad serán de gran estímulo.	Invitado Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En el período que se informa, julio-diciembre 2017, se ha trabajado en la identificación de productores progresistas y con visión empresarial recomendados por sus organizaciones, de tal manera que nos faciliten la implementación de acciones contempladas en el SSPB en sus fincas y que los resultados generados puedan ser divulgados por ellos mismos. El primer paso será desarrollar un proceso de transferencia de tecnología encaminado al mejoramiento de la productividad en finca, para luego facilitar el acercamiento a los mercados de la industria nacional con quienes podrán negociar precios, los resultados de estos encuentros serán divulgados por los diferentes medios de tal manera que nos permita generar suficiente información que facilite el acercamiento de otros productores y proyectar la escalabilidad y sostenibilidad del proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]
