

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

External Tasks

Split

External Milestone

Milestone

Inactive Task

Summary

Inactive Milestone

Project Summary

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary


Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

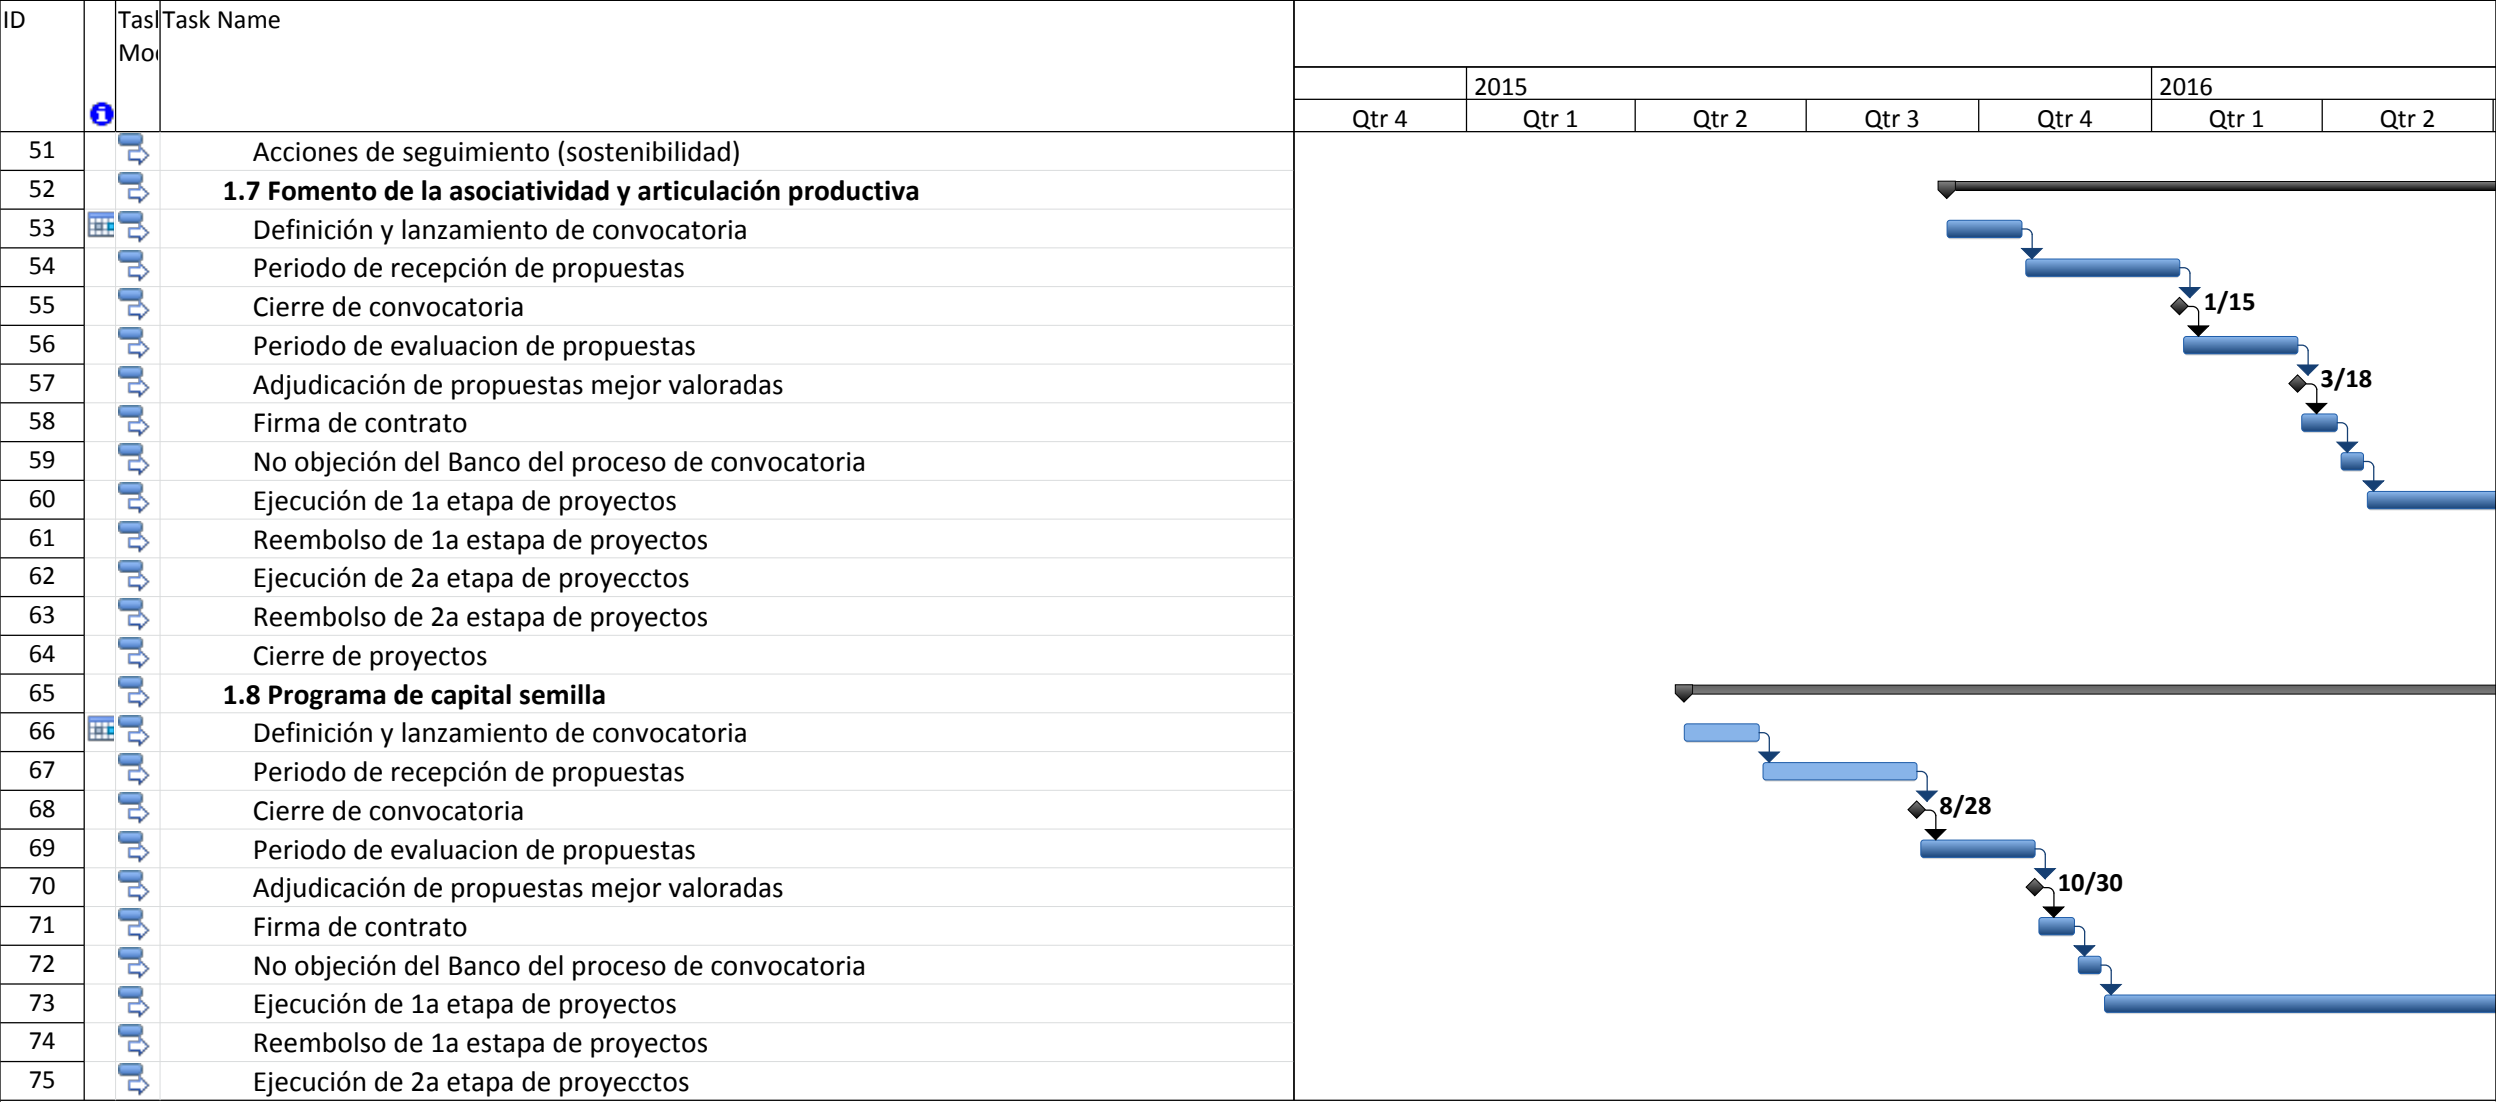

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

External Tasks

Split

External Milestone

Milestone

Inactive Task

Summary

Inactive Milestone

Project Summary

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
76		Reembolso de 2a estapa de proyectos							
77		Cierre de proyectos							
78		1.9 Programa de apoyo a la formalidad							
79		Definición y lanzamiento de convocatoria de ventanilla abierta de asistencia técnica							
80		Evaluacion de propuestas							
81		No objeción del Banco del proceso de selección							
82		Ejecución de Asistencia Técnica para la formalización							
83		Registro de identificación tributaria							
84		Registros adicionales e inscripciones exigidas por la ley							
85		Seguimiento y evaluación							
86		1.10 Programa FONDEPRO Territorial							
87		Definición y lanzamiento de convocatoria							
88		Periodo de recepción de propuestas							
89		Cierre de convocatoria							
90		Periodo de evaluacion de propuestas							
91		Adjudicación de propuestas mejor valoradas							
92		Firma de contrato							
93		No objeción del Banco del proceso de convocatoria							
94		Ejecución de 1a etapa de proyectos							
95		Reembolso de 1a estapa de proyectos							
96		Ejecución de 2a etapa de proyecctos							
97		Reembolso de 2a estapa de proyectos							
98		Cierre de proyectos							
99		Componente II-Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad							
100		2.1 Camino UNI08S-Corasín a Las Playitas							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m

Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary


External Tasks
 External Milestone
 Inactive Task
 Inactive Milestone
 Inactive Summary

Manual Task
 Duration-only
 Manual Summary Rollup
 Manual Summary
 Start-only

Finish-only
 Deadline
 Progress

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
101		Proceso de contratación de obra: (LPI - Exante)							
102		Actividad: Requerimientos internos							
103		Presentación de solicitud de contratación a la UACI							
104		Validación de contratación							
105		Solicitud de confirmación de fondos a la UFI							
106		Confirmación de fondos							
107		Actividad: Preparación de bases de licitación y/o especificaciones técnicas							
108		Elaboración de bases de licitación							
109		Revisión de bases por el comité (Modificacion UACI: No debe ser menor de ocho c							
110		Solicitud de no objeción al Banco							
111		No objeción del Banco a las bases							
112		Actividad: Proceso de licitación pública internacional							
113		Convocatoria pública a participar							
114		Presentación de ofertas (45 días calendario)							
115		Recepción de ofertas y apertura de sobres							
116		Evaluación de ofertas							
117		Solicitud de no objeción al BID							
118		No objeción del BID							
119		Elaboración de la resolución de adjudicación							
120		Notificación a oferentes							
121		Plazo para presentación de recurso							
122		Actividad: Proceso de suscripción de contrato							
123		Suscripción del contrato							
124		Constitución de garantía de cumplimiento de contrato							
125		Envío de contrato firmado al BID							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m Date: Thu 9/5/13	Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
	Split		External Milestone		Duration-only		Deadline	
	Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Progress	
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary			
	Project Summary		Inactive Summary		Start-only			

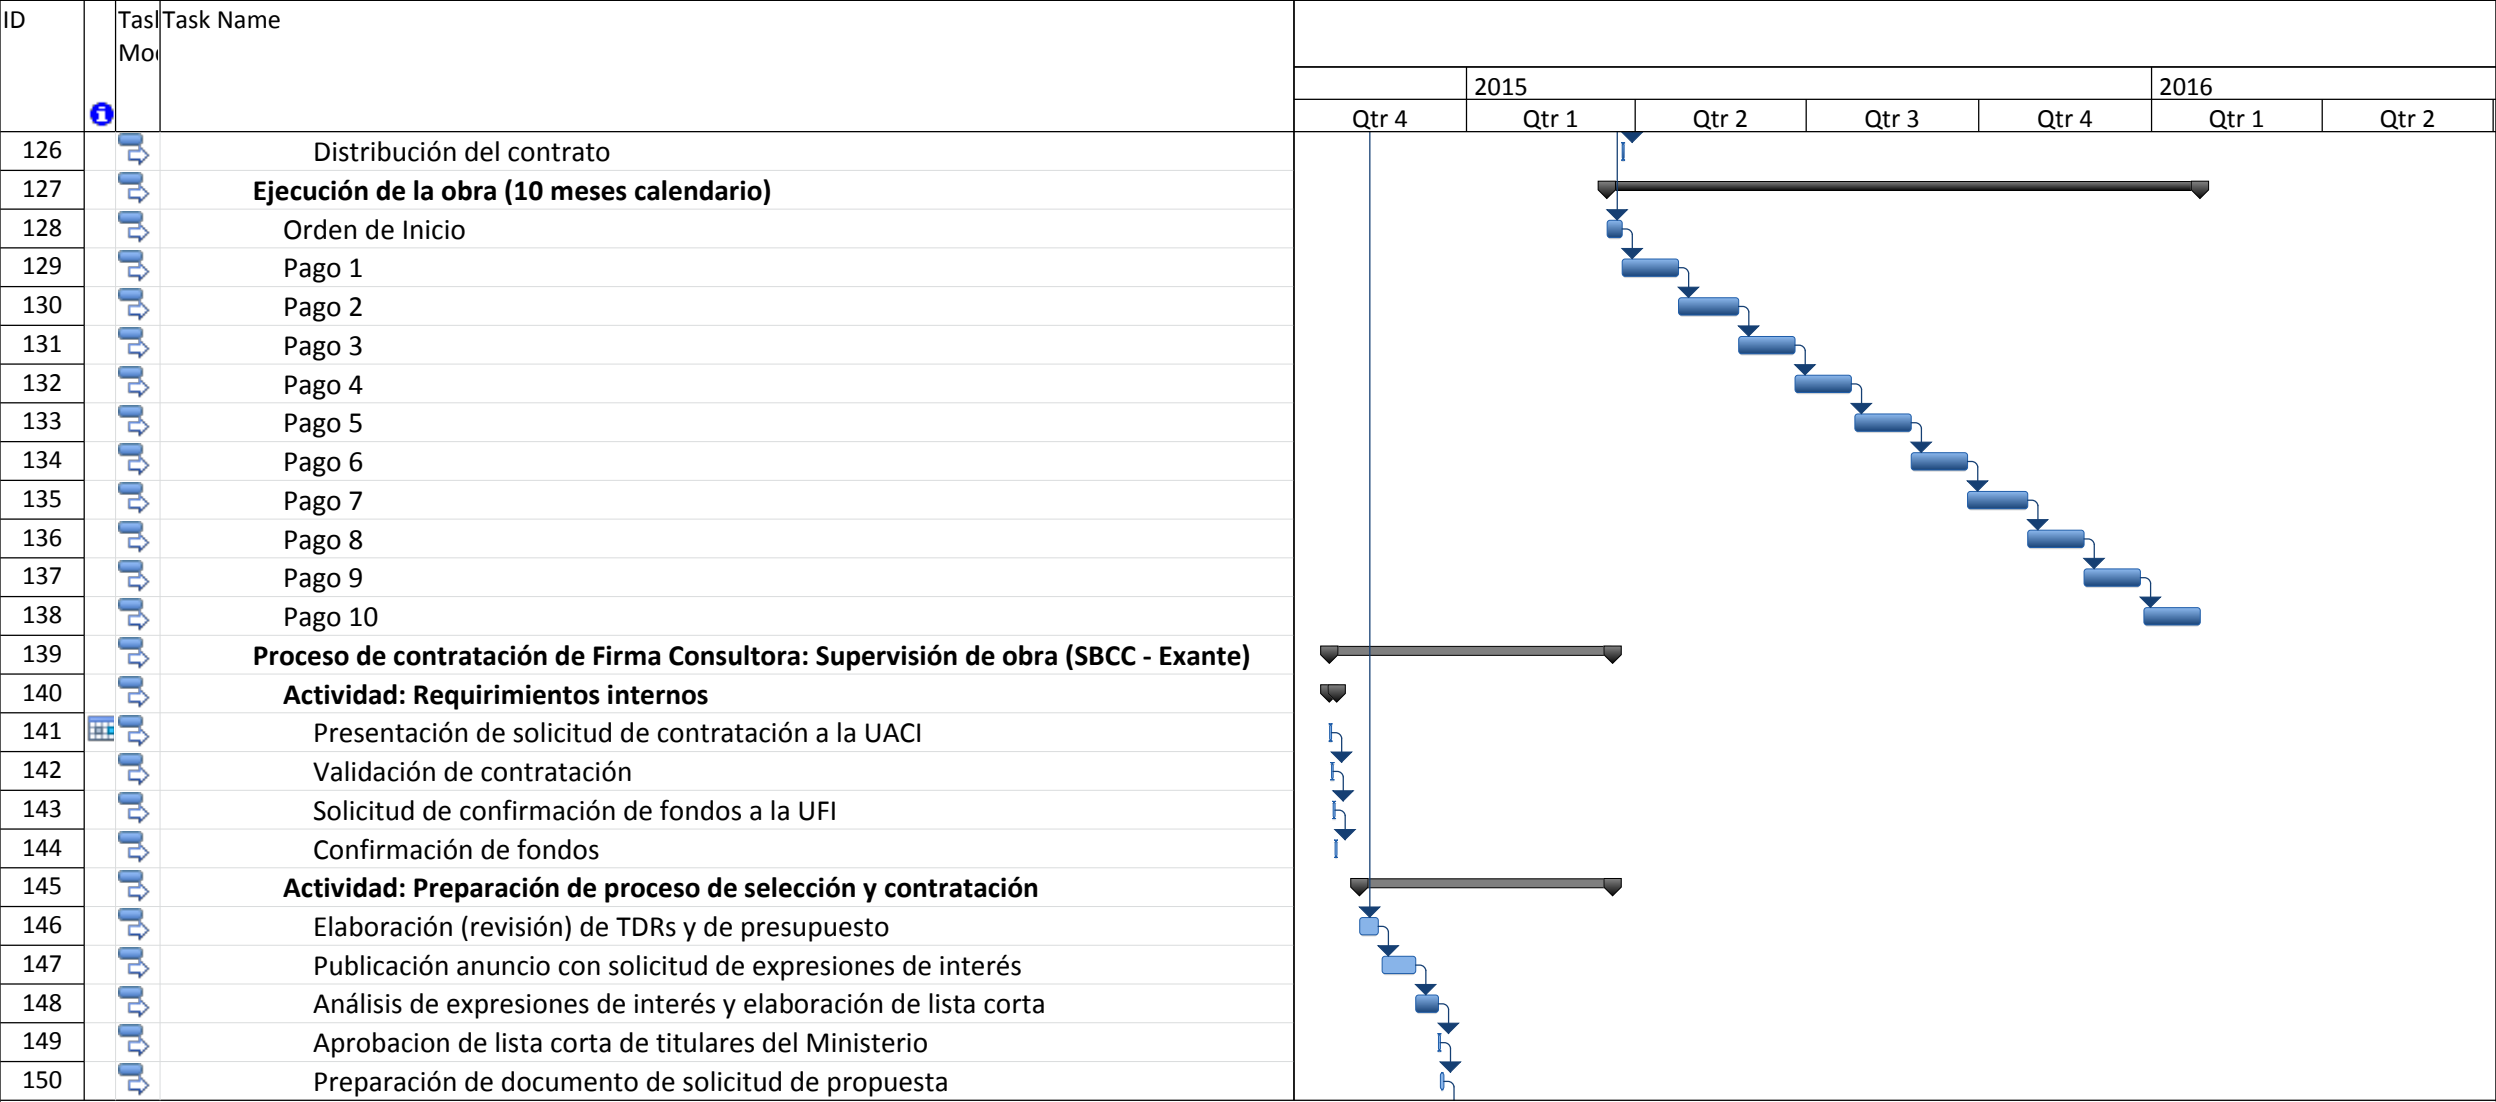

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup


Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

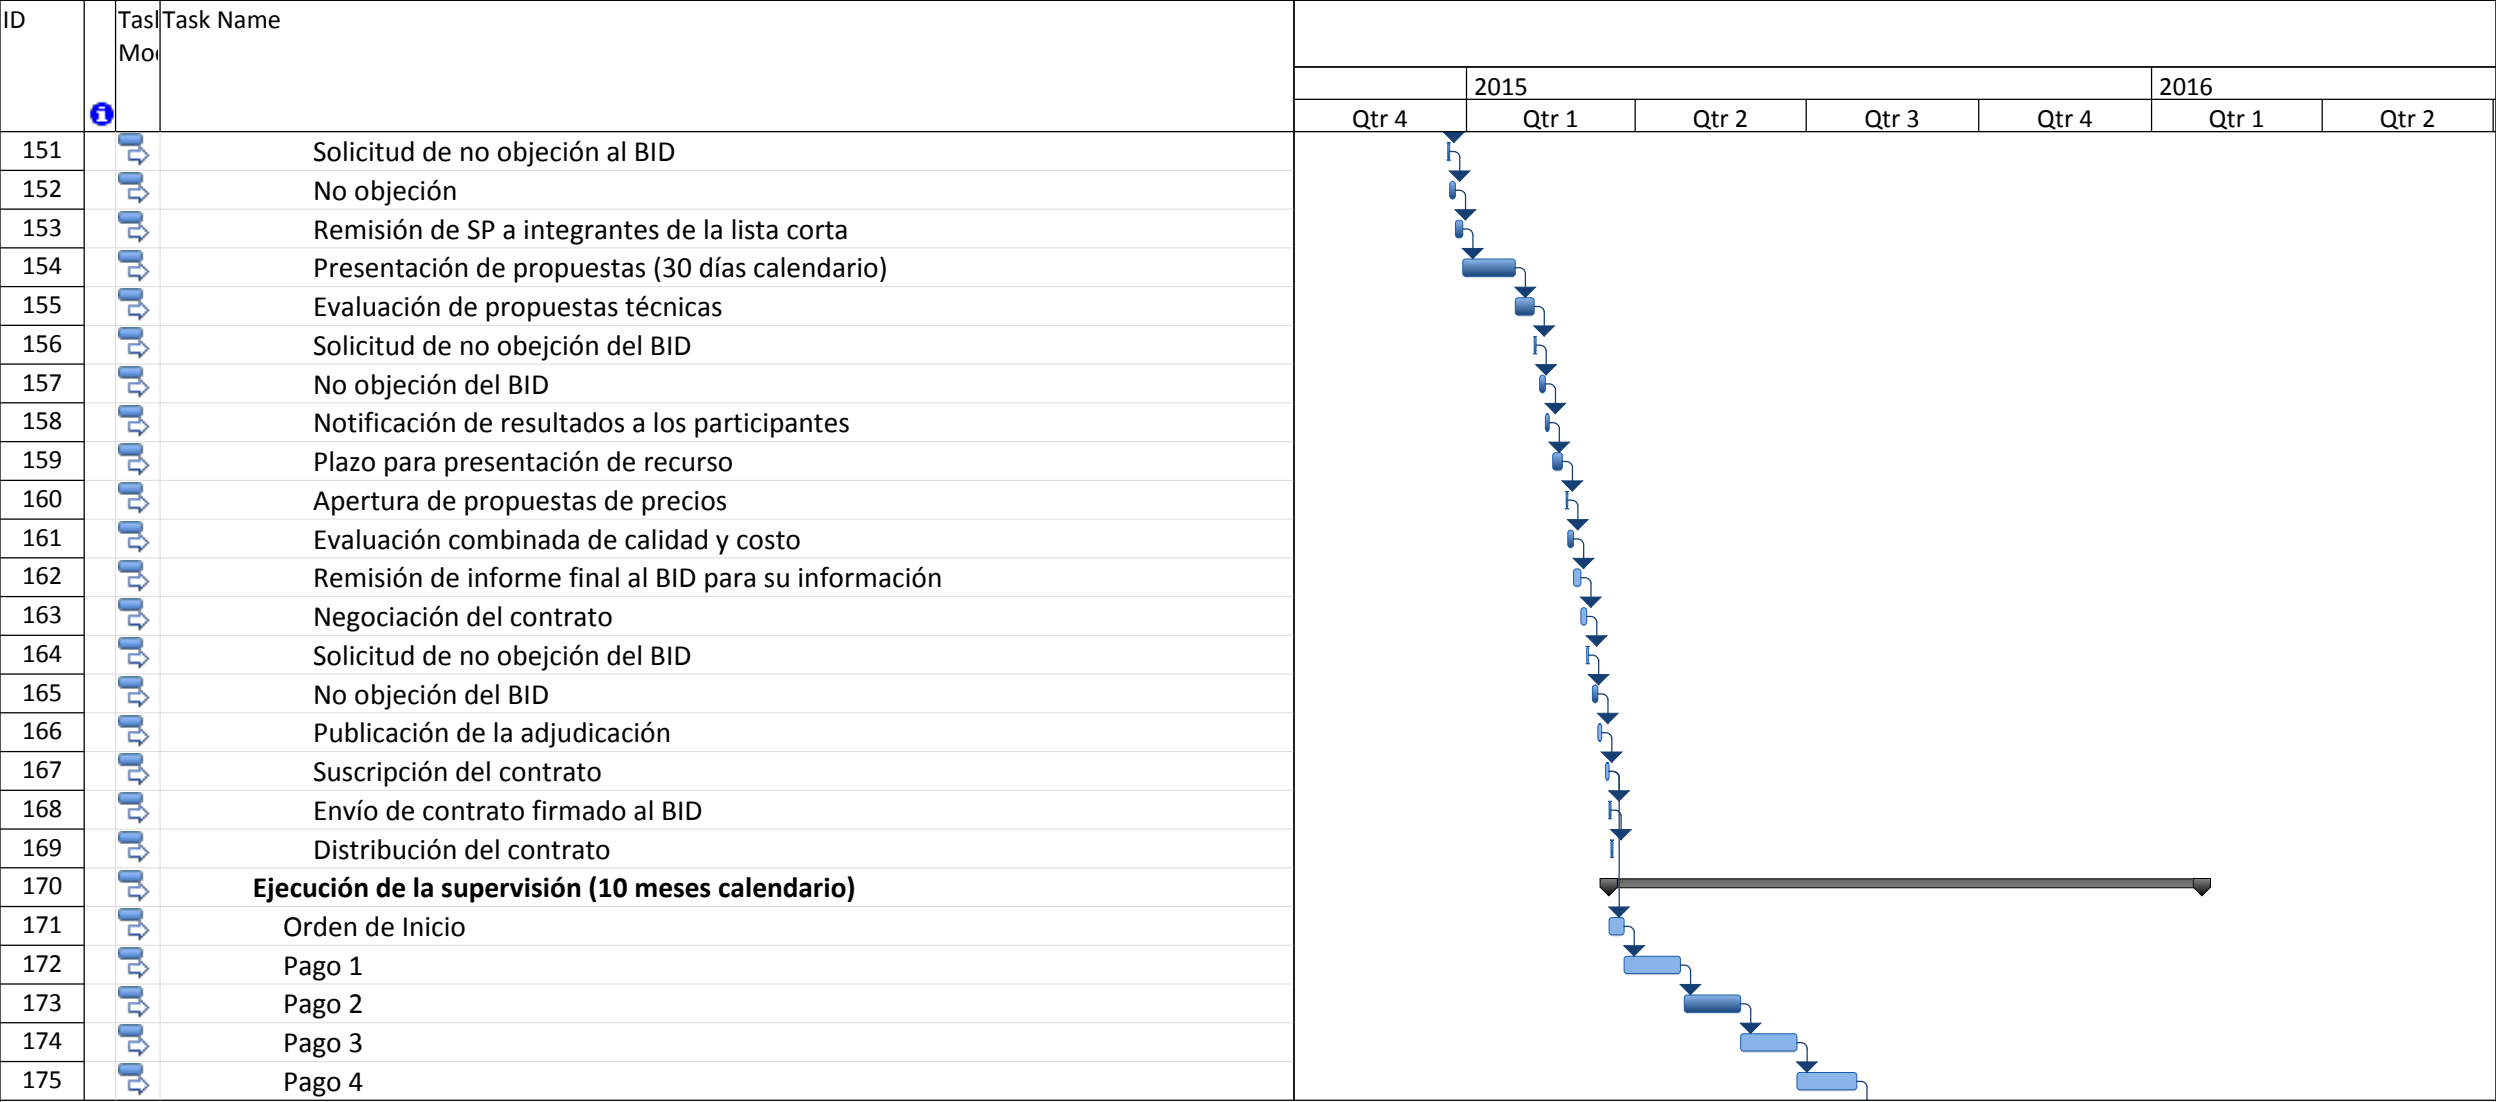

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup


Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

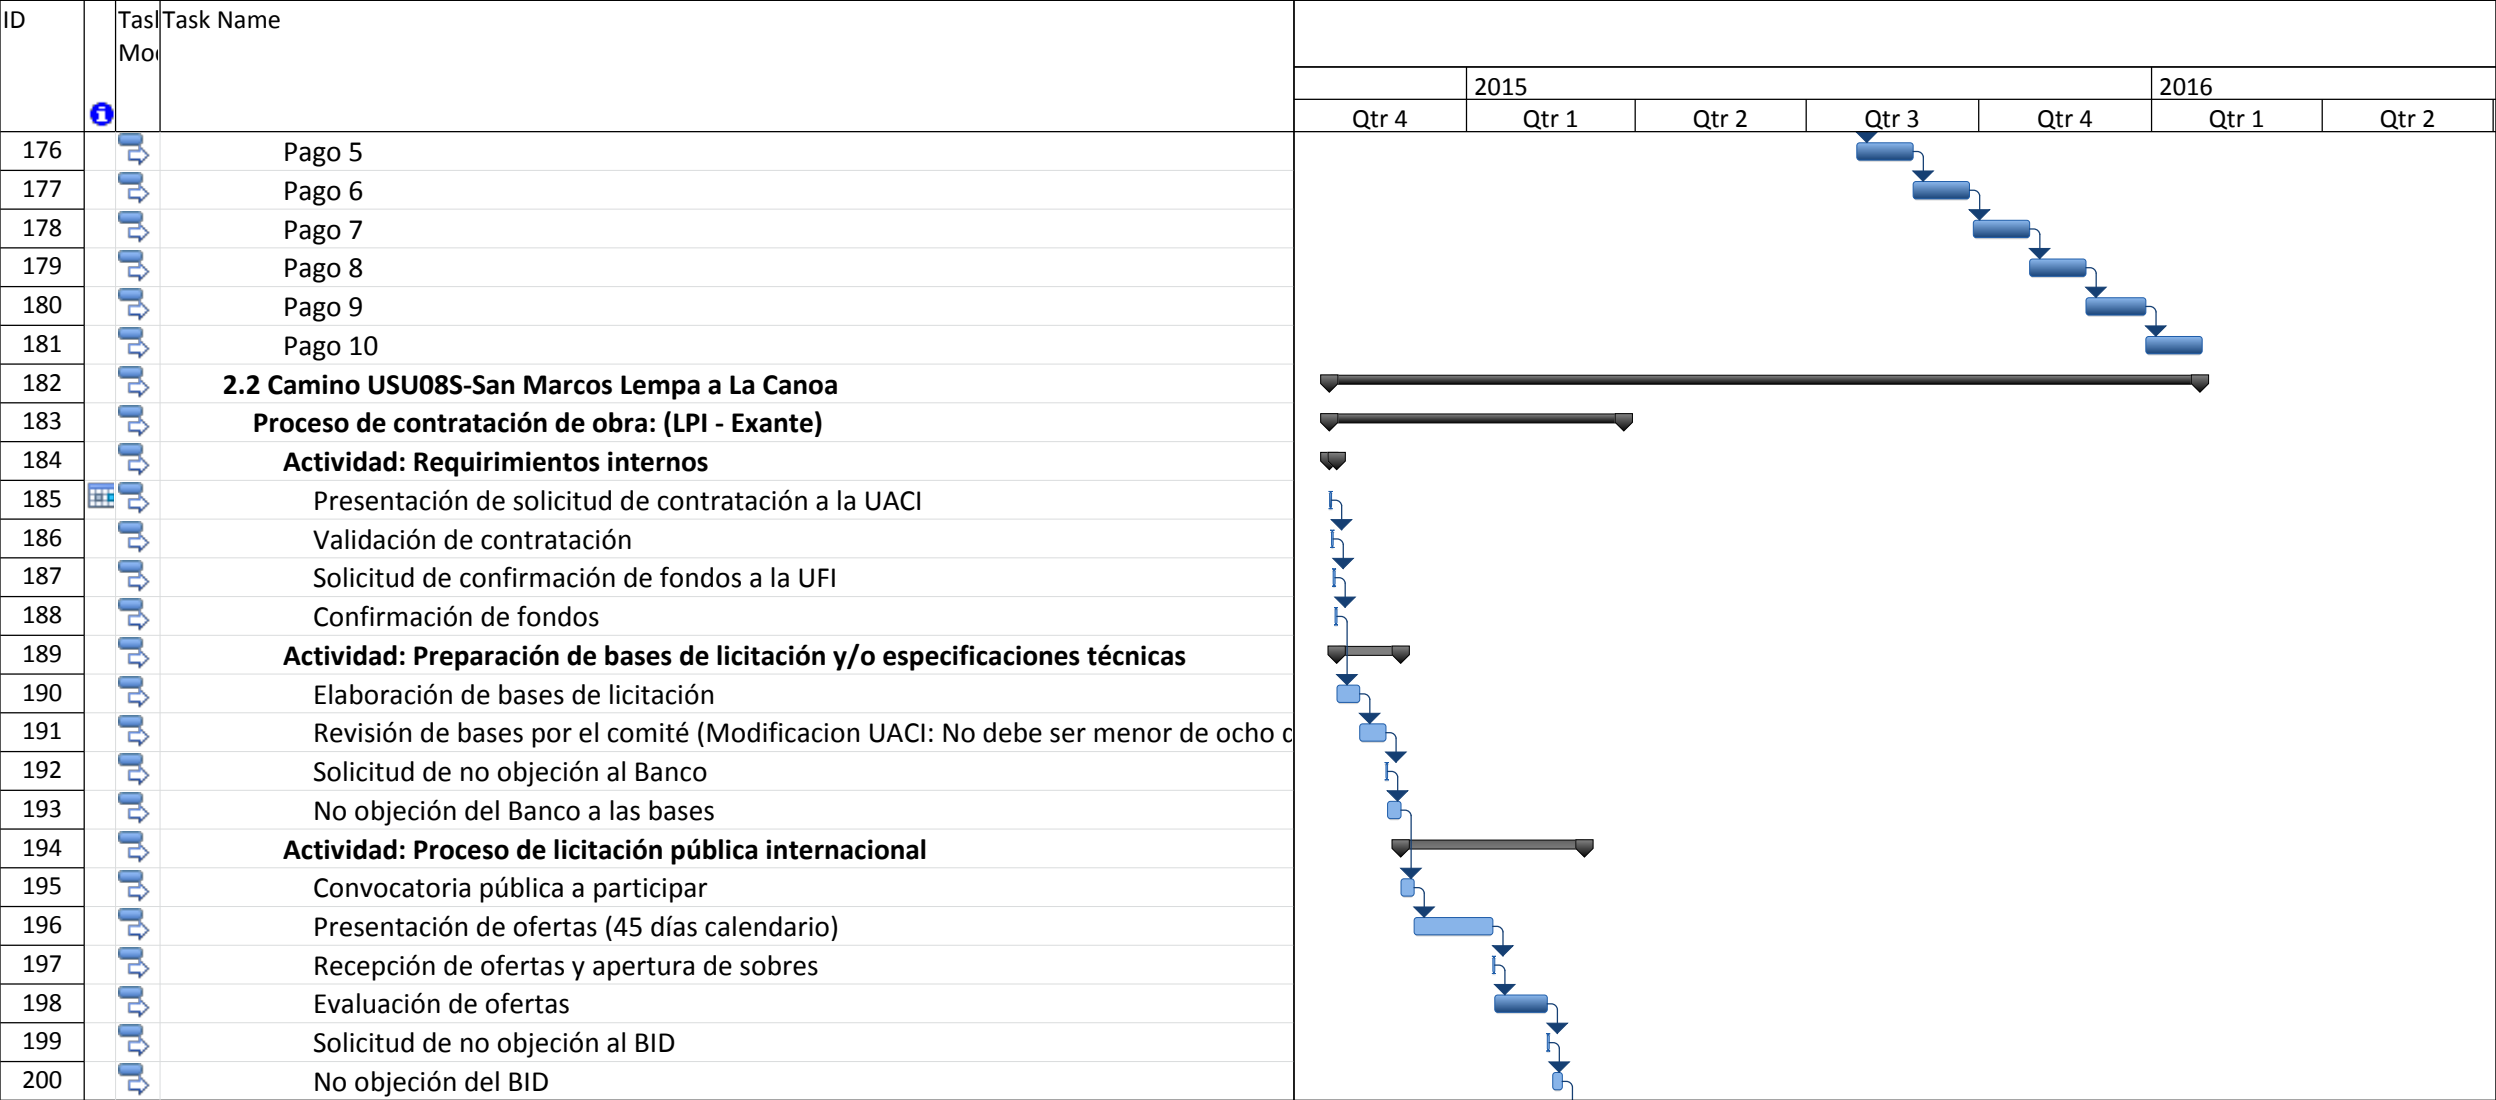

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
201		Elaboración de la resolución de adjudicación							
202		Notificación a oferentes							
203		Plazo para presentación de recurso							
204		Actividad: Proceso de suscripción de contrato							
205		Suscripción del contrato							
206		Constitución de garantía de cumplimiento de contrato							
207		Envío de contrato firmado al BID							
208		Distribución del contrato							
209		Ejecución de la obra (10 meses calendario)							
210		Orden de Inicio							
211		Pago 1							
212		Pago 2							
213		Pago 3							
214		Pago 4							
215		Pago 5							
216		Pago 6							
217		Pago 7							
218		Pago 8							
219		Pago 9							
220		Pago 10							
221		Proceso de contratación de Firma Consultora: Supervisión de obra (SBCC - Exante)							
222		Actividad: Requerimientos internos							
223		Presentación de solicitud de contratación a la UACI							
224		Validación de contratación							
225		Solicitud de confirmación de fondos a la UFI							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

External Tasks

Split

External Milestone

Milestone

Inactive Task

Summary

Inactive Milestone

Project Summary

Inactive Summary

Manual Task

Manual Task

Duration-only

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Summary

Start-only

Start-only

Finish-only

Finish-only

Deadline

Deadline

Progress

Progress

ID	Task Model	Task Name							
			2015						2016
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
226		Confirmación de fondos							
227		Actividad: Preparación de proceso de selección y contratación							
228		Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto							
229		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés							
230		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta							
231		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio							
232		Preparación de documento de solicitud de propuesta							
233		Solicitud de no objeción al BID							
234		No objeción							
235		Presentación de propuestas (30 días calendario)							
236		Evaluación de propuestas técnicas							
237		Solicitud de no obejción del BID							
238		No objeción del BID							
239		Notificación de resultados a los participantes							
240		Plazo para presentación de recurso							
241		Apertura de propuestas de precios							
242		Evaluación combinada de calidad y costo							
243		Remisión de informe final al BID para su información							
244		Negociación del contrato							
245		Solicitud de no obejción del BID							
246		No objeción del BID							
247		Publicación de la adjudicación							
248		Suscripción del contrato							
249		Envío de contrato firmado al BID							
250		Distribución del contrato							
Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m Date: Thu 9/5/13		Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
		Split		External Milestone		Duration-only		Deadline	
		Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Progress	
		Summary		Inactive Milestone		Manual Summary			
		Project Summary		Inactive Summary		Start-only			

Page 10

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
251		Ejecución de la supervisión (10 meses calendario)							
252		Orden de Inicio							
253		Pago 1							
254		Pago 2							
255		Pago 3							
256		Pago 4							
257		Pago 5							
258		Pago 6							
259		Pago 7							
260		Pago 8							
261		Pago 9							
262		Pago 10							
263		2.3 Muelle Zacatillo							
264		Proceso de contratación de obra: (LPI - Exante)							
265		Actividad: Requerimientos internos							
266		Presentación de solicitud de contratación a la UACI							
267		Validación de contratación							
268		Solicitud de confirmación de fondos a la UFI							
269		Confirmación de fondos							
270		Actividad: Preparación de bases de licitación y/o especificaciones técnicas							
271		Elaboración de bases de licitación							
272		Revisión de bases por el comité (Modificacion UACI: No debe ser menor de ocho c							
273		Solicitud de no objeción al Banco							
274		No objeción del Banco a las bases							
275		Actividad: Proceso de licitación pública internacional							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

External Tasks

Split

External Milestone

Milestone

Inactive Task

Summary

Inactive Milestone

Project Summary

Inactive Summary

Manual Task

Manual Task

Duration-only

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Summary

Start-only

Start-only

Finish-only

Finish-only

Deadline

Deadline

Progress

Progress

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
276		Convocatoria pública a participar							
277		Presentación de ofertas (45 días calendario)							
278		Recepción de ofertas y apertura de sobres							
279		Evaluación de ofertas							
280		Solicitud de no objeción al BID							
281		No objeción del BID							
282		Elaboración de la resolución de adjudicación							
283		Notificación a oferentes							
284		Plazo para presentación de recurso							
285		Actividad: Proceso de suscripción de contrato							
286		Suscripción del contrato							
287		Constitución de garantía de cumplimiento de contrato							
288		Envío de contrato firmado al BID							
289		Distribución del contrato							
290		Ejecución de la obra (10 meses calendario)							
291		Orden de Inicio							
292		Pago 1							
293		Pago 2							
294		Pago 3							
295		Pago 4							
296		Pago 5							
297		Pago 6							
298		Pago 7							
299		Proceso de contratación de Firma Consultora: Supervisión de obra (SBCC - Exante)							
300		Actividad: Requerimientos internos							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m Date: Thu 9/5/13	Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
	Split		External Milestone		Duration-only		Deadline	
	Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Progress	
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary			
	Project Summary		Inactive Summary		Start-only			

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
301		Presentación de solicitud de contratación a la UACI							
302		Validación de contratación							
303		Solicitud de confirmación de fondos a la UFI							
304		Confirmación de fondos							
305		Actividad: Preparación de proceso de selección y contratación							
306		Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto							
307		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés							
308		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta							
309		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio							
310		Preparación de documento de solicitud de propuest a							
311		Solicitud de no objeción al BID							
312		No objeción							
313		Presentación de propuestas (30 días calendario)							
314		Evaluación de propuestas técnicas							
315		Solicitud de no obejcción del BID							
316		No objeción del BID							
317		Notificación de resultados a los participantes							
318		Plazo para presentación de recurso							
319		Apertura de propuestas de precios							
320		Evaluación combinada de calidad y costo							
321		Remisión de informe final al BID para su información							
322		Negociación del contrato							
323		Solicitud de no obejcción del BID							
324		No objeción del BID							
325		Publicación de la adjudicación							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m

Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup


Manual Summary

Start-only


Finish-only

Deadline

Progress

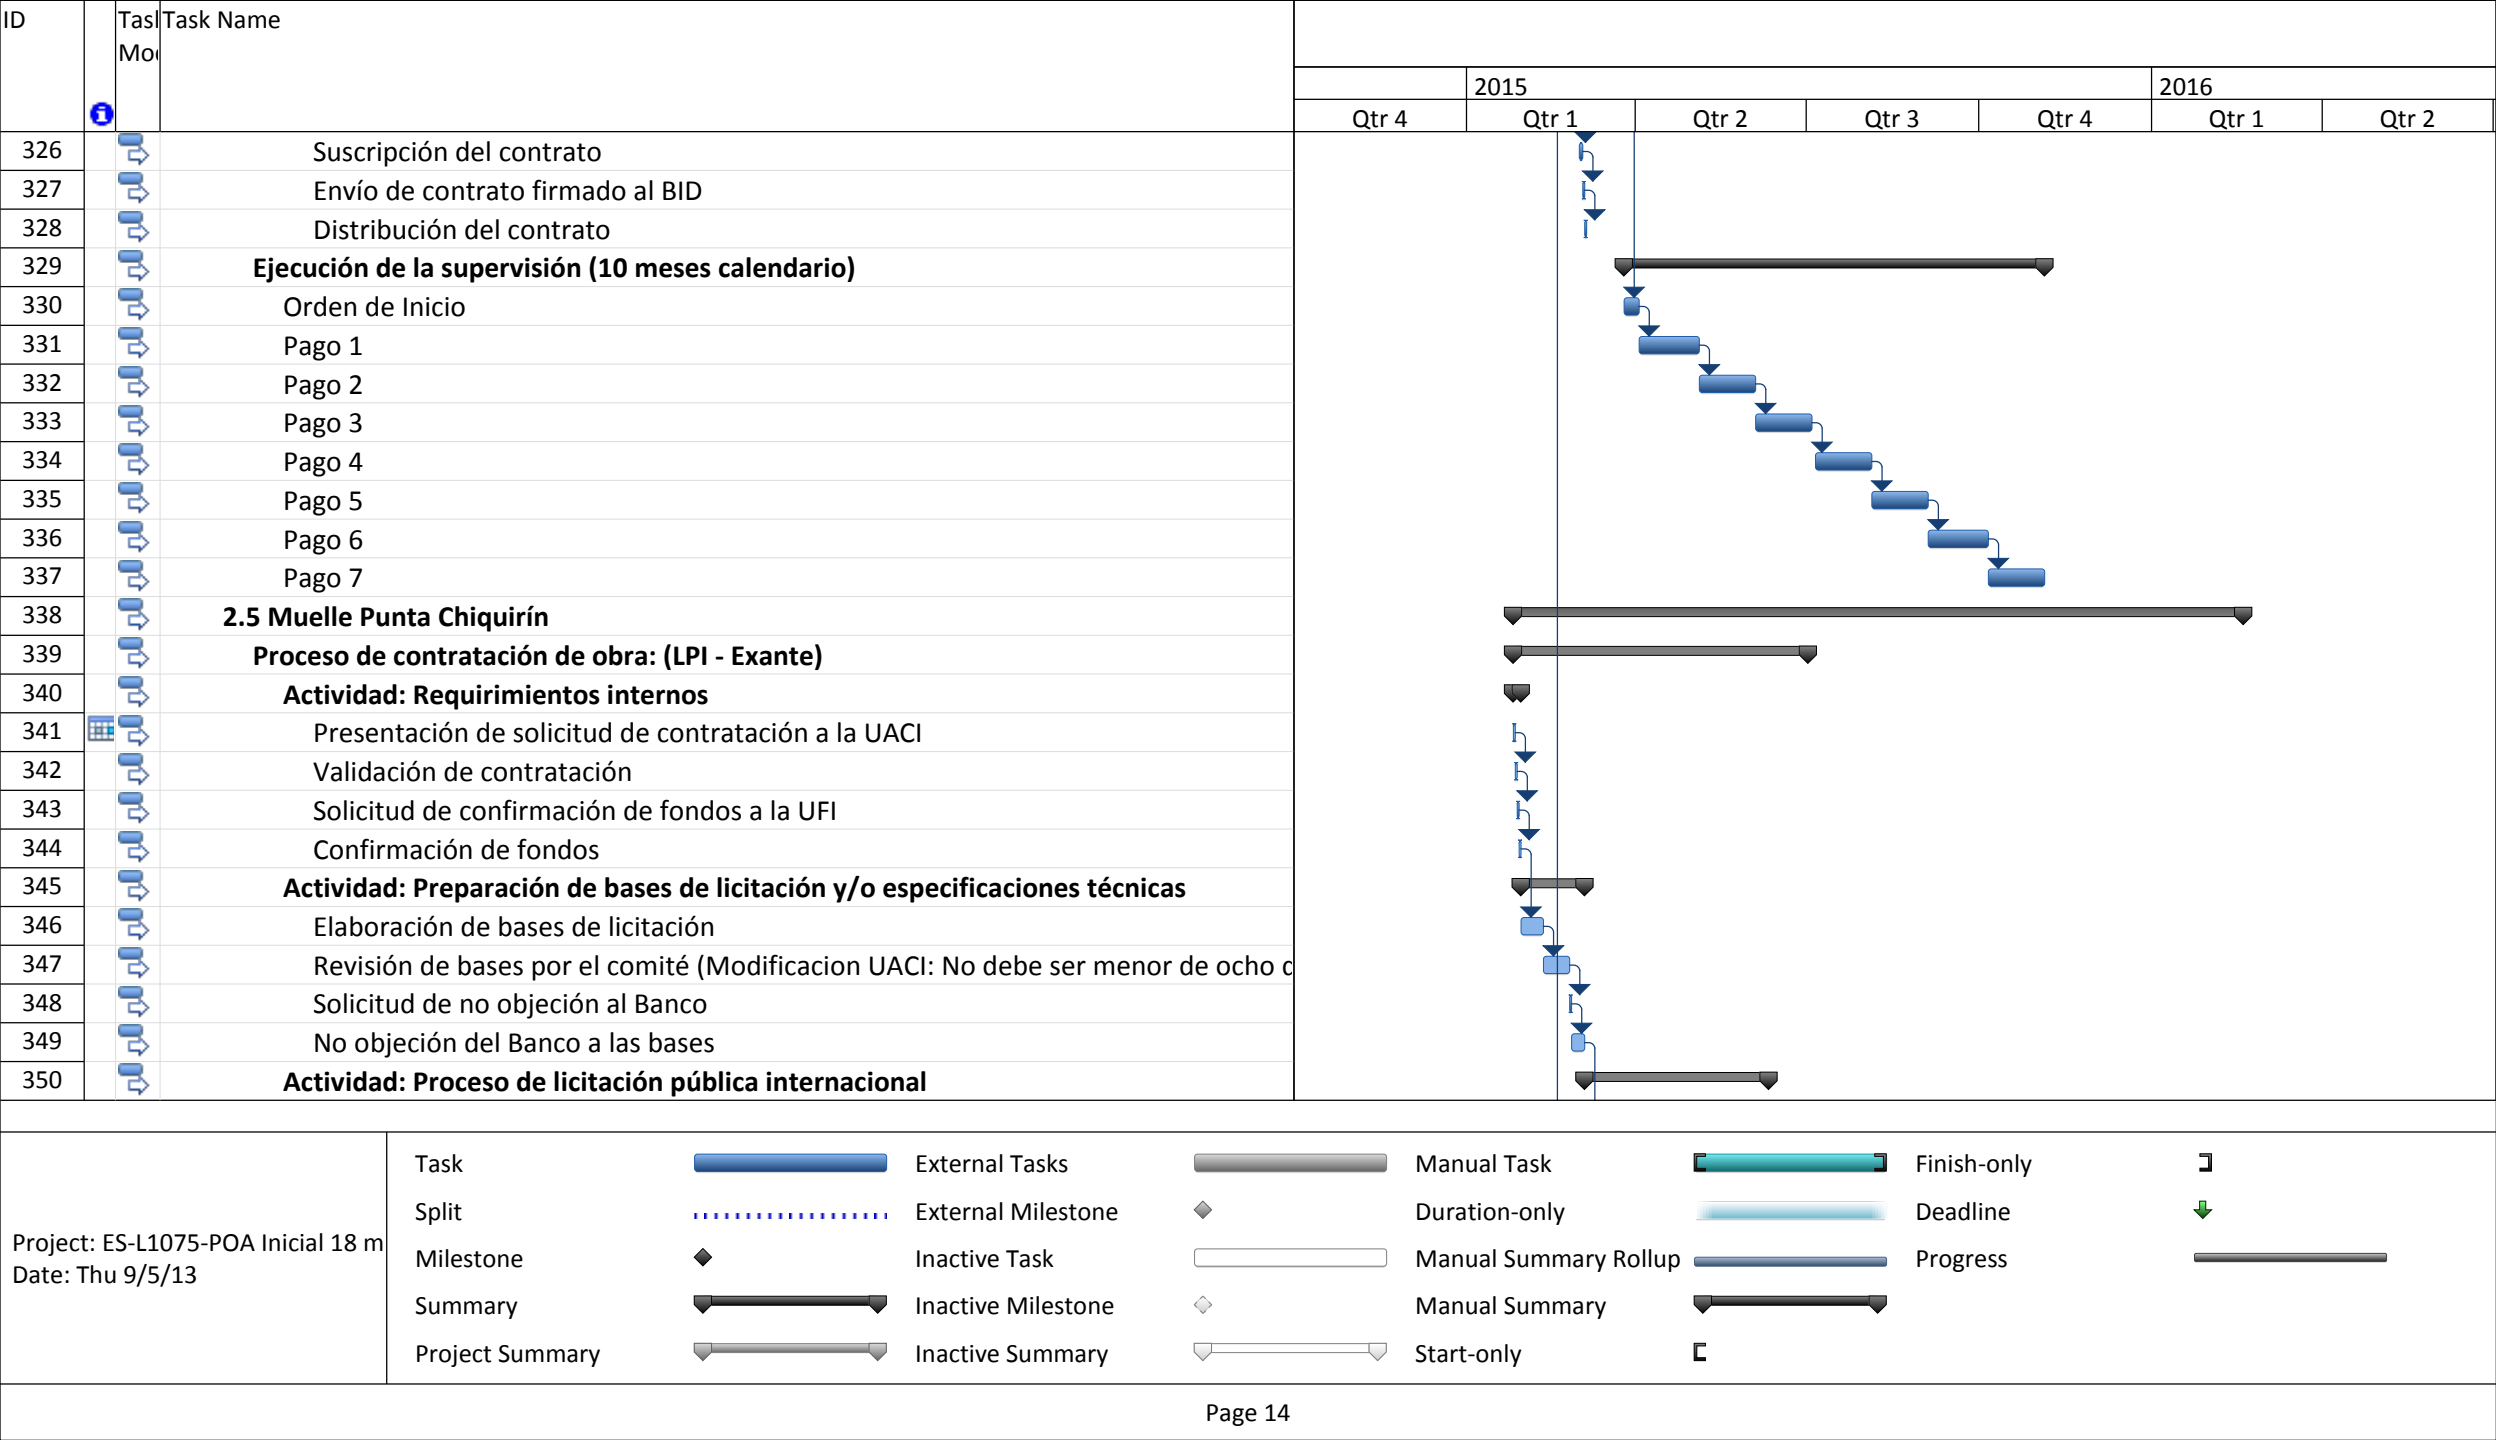 Finish-only Deadline Progress

Page 14

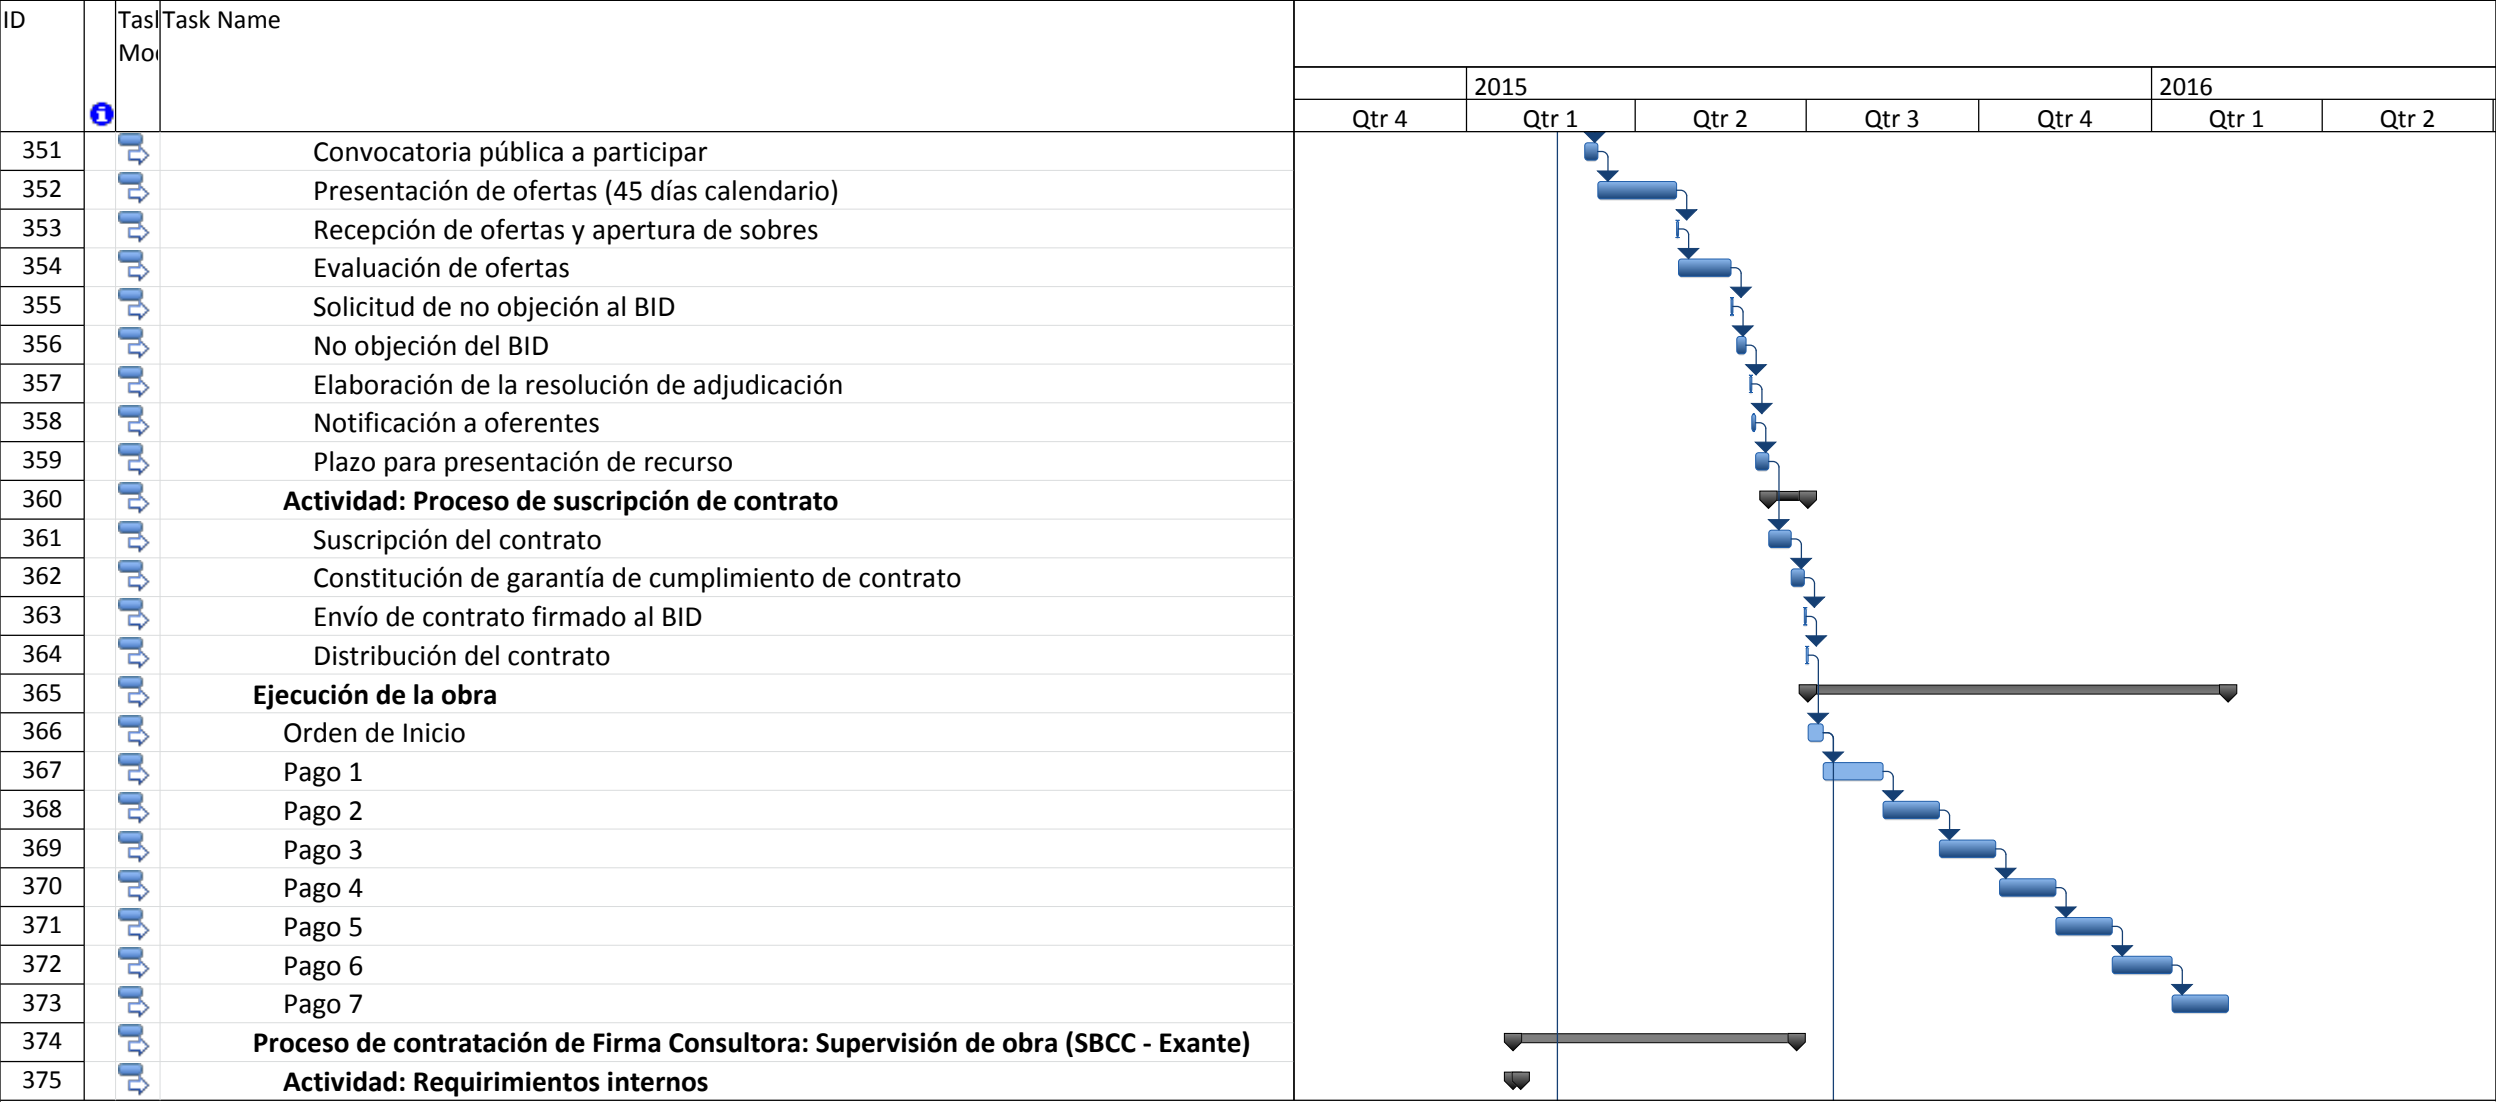

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup


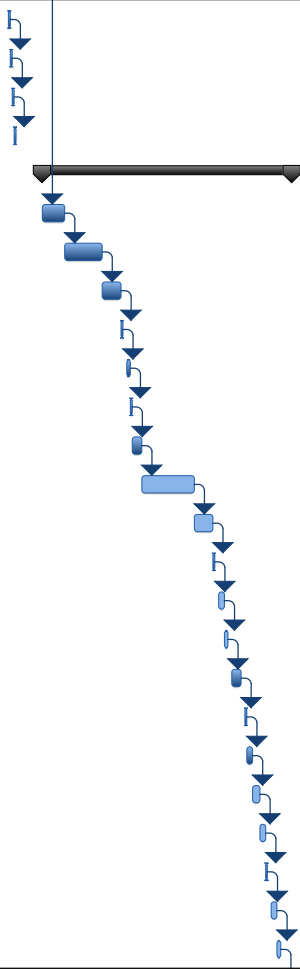
























Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
376		Presentación de solicitud de contratación a la UACI							
377		Validación de contratación							
378		Solicitud de confirmación de fondos a la UFI							
379		Confirmación de fondos							
380		Actividad: Preparación de proceso de selección y contratación							
381		Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto							
382		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés							
383		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta							
384		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio							
385		Preparación de documento de solicitud de propuest a							
386		Solicitud de no objeción al BID							
387		No objeción							
388		Presentación de propuestas (30 días calendario)							
389		Evaluación de propuestas técnicas							
390		Solicitud de no obejción del BID							
391		No objeción del BID							
392		Notificación de resultados a los participantes							
393		Plazo para presentación de recurso							
394		Apertura de propuestas de precios							
395		Evaluación combinada de calidad y costo							
396		Remisión de informe final al BID para su información							
397		Negociación del contrato							
398		Solicitud de no obejción del BID							
399		No objeción del BID							
400		Publicación de la adjudicación							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m

Date: Thu 9/5/13


Task


Split


Milestone


Summary


Project Summary


 External Tasks


 External Milestone


 Inactive Task


 Inactive Milestone


 Inactive Summary


 Manual Task


 Duration-only


 Manual Summary Rollup


 Manual Summary


 Start-only


 Finish-only


 Deadline


 Progress













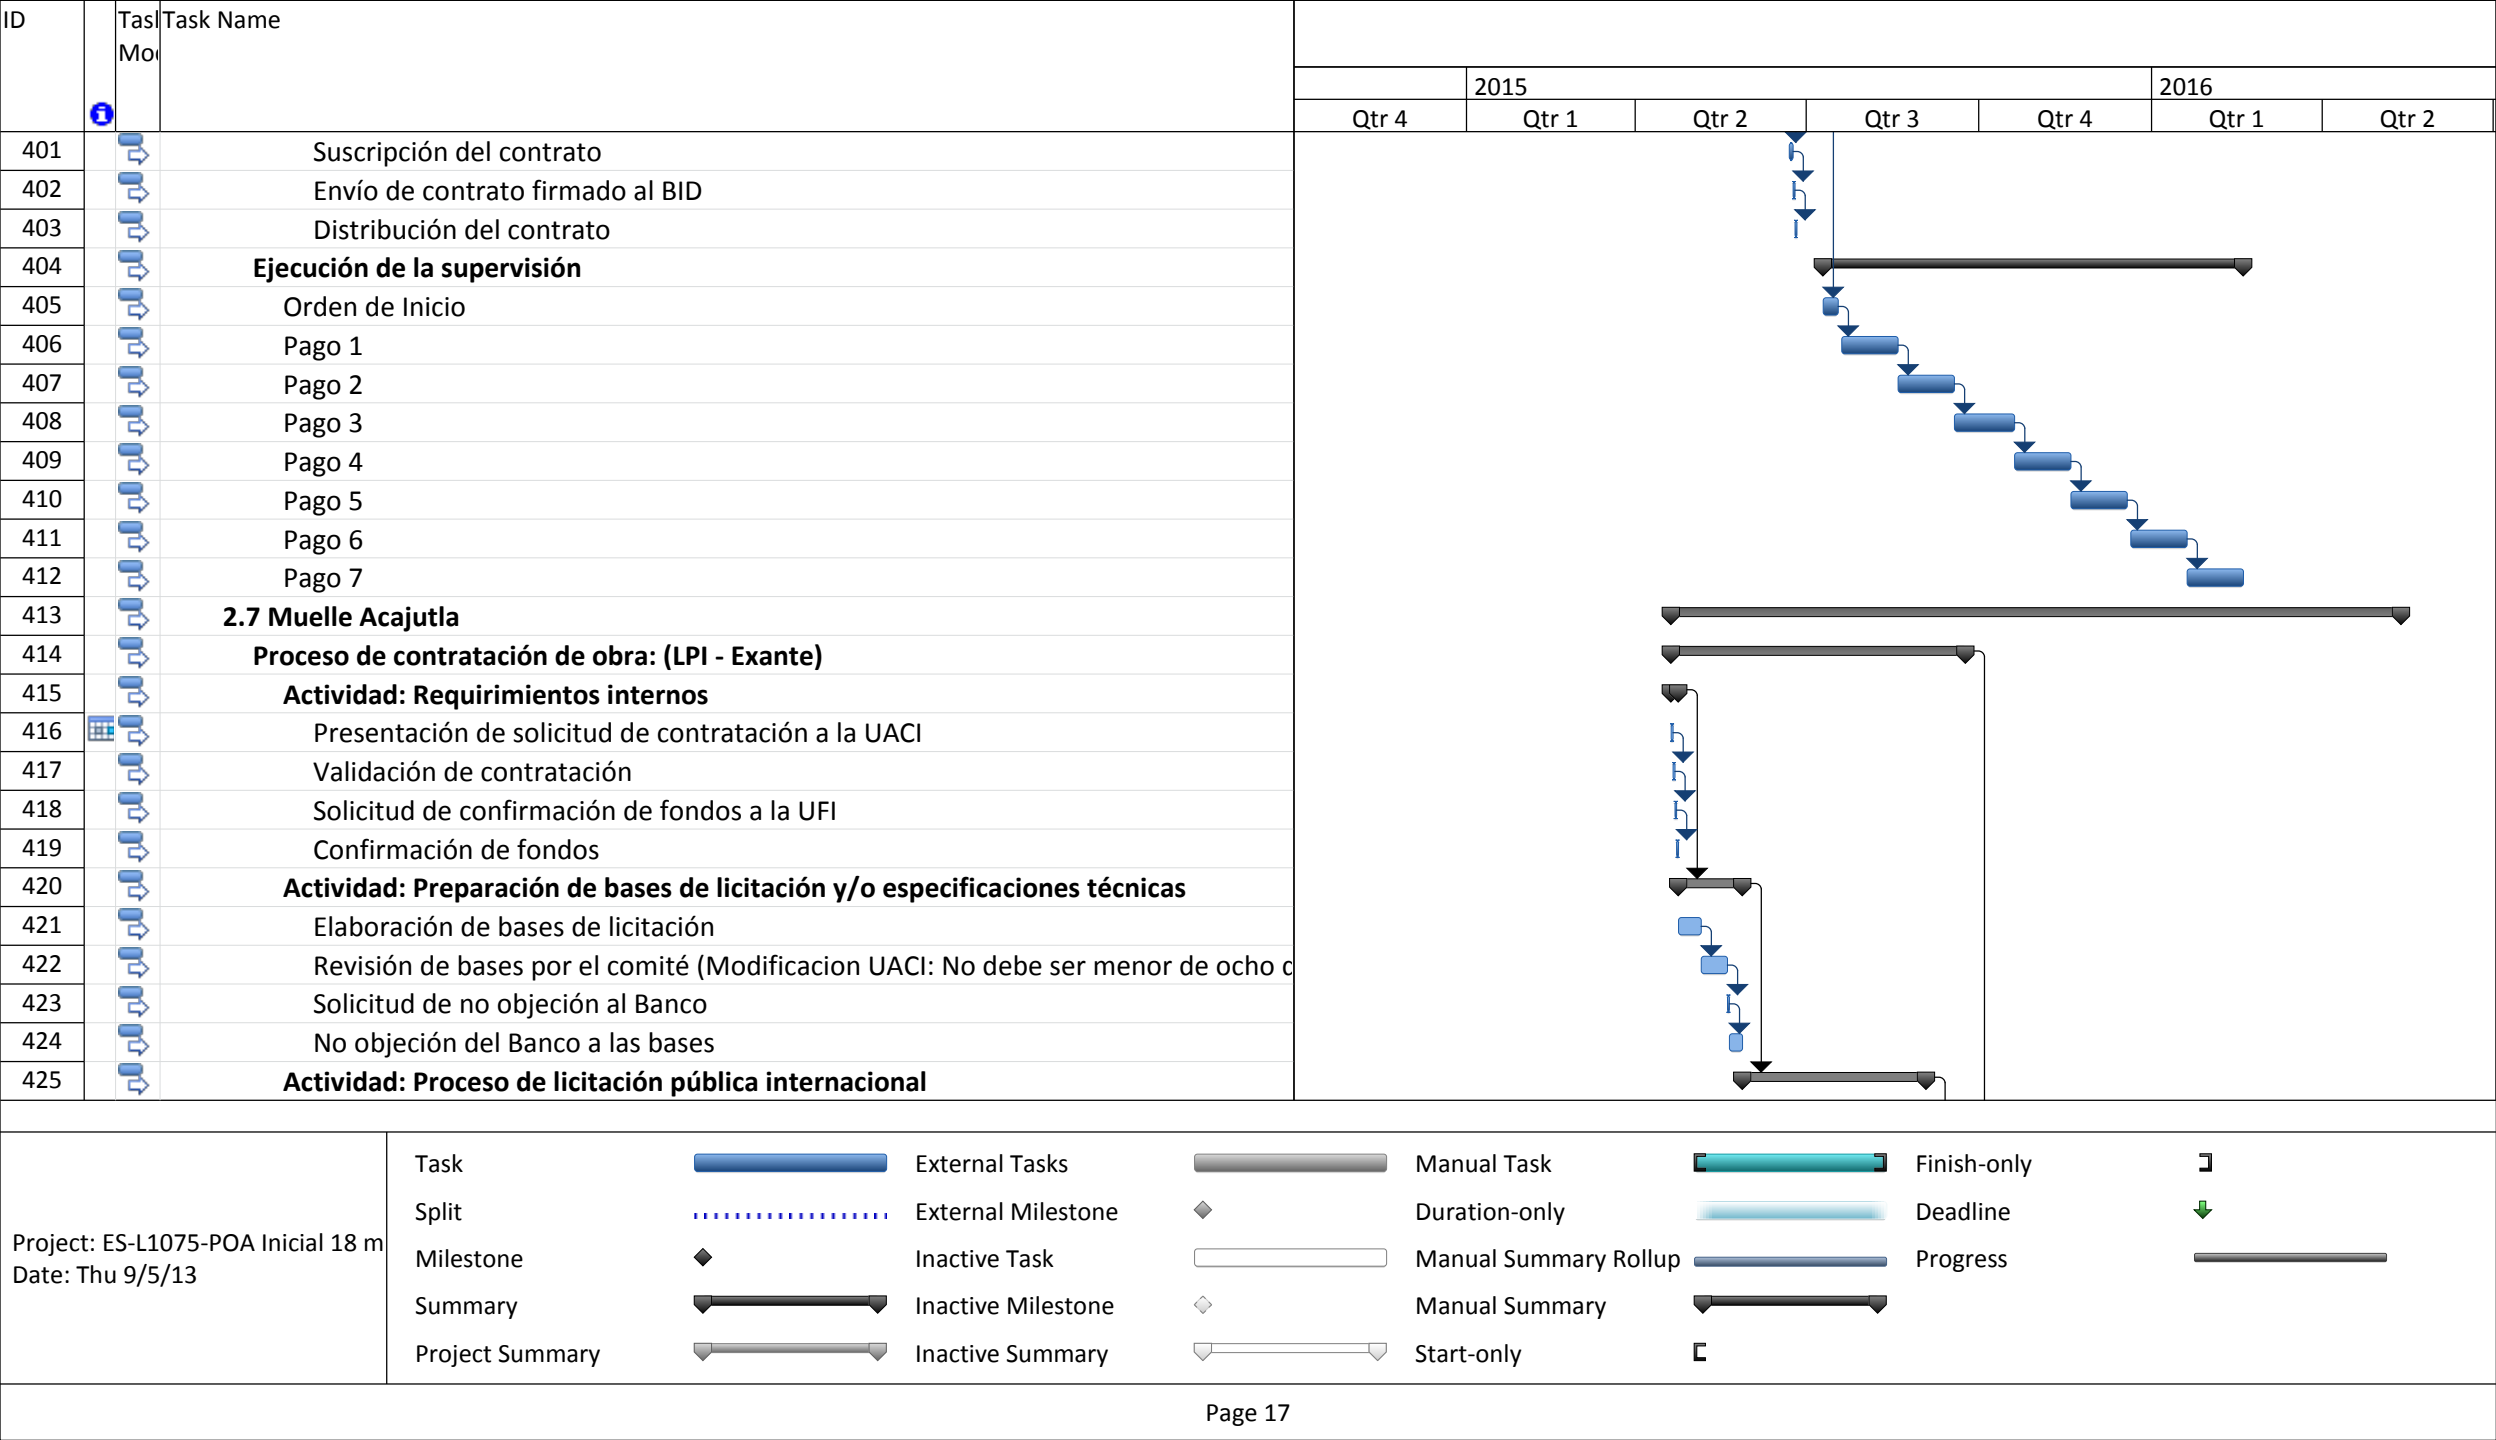

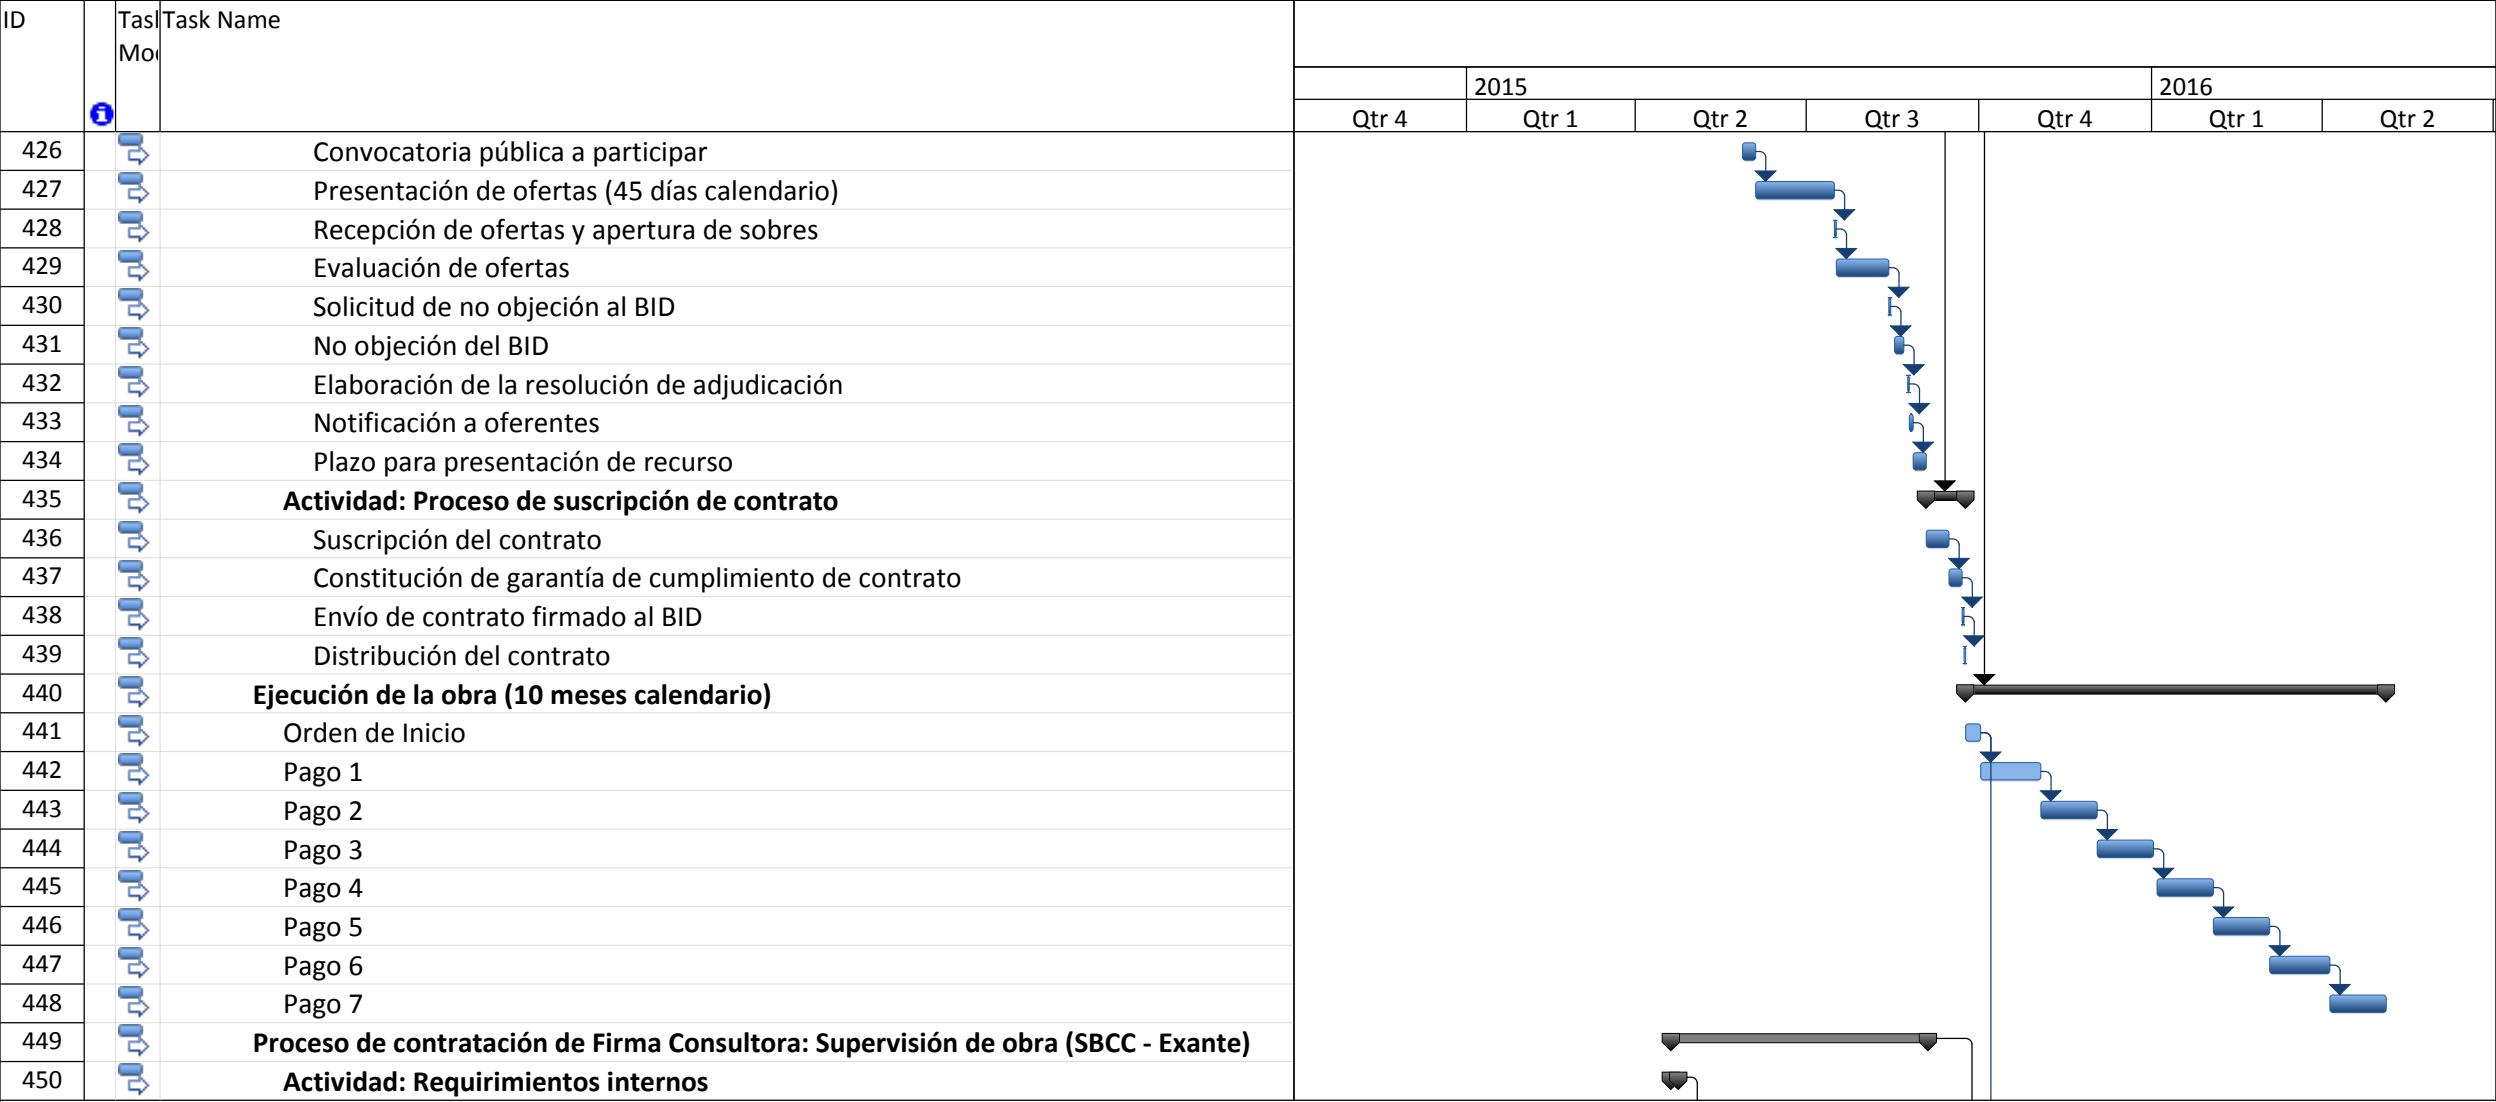

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

ID	Task Mo	Task Name								
			2015						2016	
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	
451		Presentación de solicitud de contratación a la UACI								
452		Validación de contratación								
453		Solicitud de confirmación de fondos a la UFI								
454		Confirmación de fondos								
455		Actividad: Preparación de proceso de selección y contratación								
456		Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto								
457		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés								
458		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta								
459		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio								
460		Preparación de documento de solicitud de propuest a								
461		Solicitud de no objeción al BID								
462		No objeción								
463		Presentación de propuestas (30 días calendario)								
464		Evaluación de propuestas técnicas								
465		Solicitud de no obejción del BID								
466		No objeción del BID								
467		Notificación de resultados a los participantes								
468		Plazo para presentación de recurso								
469		Apertura de propuestas de precios								
470		Evaluación combinada de calidad y costo								
471		Remisión de informe final al BID para su información								
472		Negociación del contrato								
473		Solicitud de no obejción del BID								
474		No objeción del BID								
475		Publicación de la adjudicación								

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

External Tasks

Split

External Milestone

Milestone

Inactive Task

Summary

Inactive Milestone

Project Summary

Inactive Summary

Manual Task

Manual Task

Duration-only

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Summary

Start-only

Start-only

Finish-only

Finish-only

Deadline

Deadline

Progress

Progress

ID	Task Mode	Task Name								
			2015				2016			
Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2				
476	Task	Suscripción del contrato								
477	Task	Envío de contrato firmado al BID								
478	Task	Distribución del contrato								
479	Summary	Ejecución de la supervisión (10 meses calendario)								
480	Task	Orden de Inicio								
481	Task	Pago 1								
482	Task	Pago 2								
483	Task	Pago 3								
484	Task	Pago 4								
485	Task	Pago 5								
486	Task	Pago 6								
487	Task	Pago 7								
488	Summary	2.8 Malecon La Unión								
489	Summary	Proceso de contratación de obra: (LPI - Exante)								
490	Summary	Actividad: Requerimientos internos								
491	Task	Presentación de solicitud de contratación a la UACI								
492	Task	Validación de contratación								
493	Task	Solicitud de confirmación de fondos a la UFI								
494	Task	Confirmación de fondos								
495	Summary	Actividad: Preparación de bases de licitación y/o especificaciones técnicas								
496	Task	Elaboración de bases de licitación								
497	Task	Revisión de bases por el comité (Modificacion UACI: No debe ser menor de ocho c								
498	Task	Solicitud de no objeción al Banco								
499	Task	No objeción del Banco a las bases								
500	Summary	Actividad: Proceso de licitación pública internacional								

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m

Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 20

ID	Task Mo	Task Name								
			2015				2016			
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	
501		Convocatoria pública a participar								
502		Presentación de ofertas (45 días calendario)								
503		Recepción de ofertas y apertura de sobres								
504		Evaluación de ofertas								
505		Solicitud de no objeción al BID								
506		No objeción del BID								
507		Elaboración de la resolución de adjudicación								
508		Notificación a oferentes								
509		Plazo para presentación de recurso								
510		Actividad: Proceso de suscripción de contrato								
511		Suscripción del contrato								
512		Constitución de garantía de cumplimiento de contrato								
513		Envío de contrato firmado al BID								
514		Distribución del contrato								
515		Ejecución de la obra (10 meses calendario)								
516		Orden de Inicio								
517		Pago 1								
518		Pago 2								
519		Pago 3								
520		Pago 4								
521		Pago 5								
522		Pago 6								
523		Pago 7								
524		Pago 8								
525		Pago 9								

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

External Tasks

Split

External Milestone

Milestone

Inactive Task

Summary

Inactive Milestone

Project Summary

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Summary

Start-only


Finish-only

Deadline

Progress

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
526		Pago 10							
527		Proceso de contratación de Firma Consultora: Supervisión de obra (SBCC - Exante)							
528		Actividad: Requerimientos internos							
529		Presentación de solicitud de contratación a la UACI							
530		Validación de contratación							
531		Solicitud de confirmación de fondos a la UFI							
532		Confirmación de fondos							
533		Actividad: Preparación de proceso de selección y contratación							
534		Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto							
535		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés							
536		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta							
537		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio							
538		Preparación de documento de solicitud de propuest a							
539		Solicitud de no objeción al BID							
540		No objeción							
541		Presentación de propuestas (30 días calendario)							
542		Evaluación de propuestas técnicas							
543		Solicitud de no obejcción del BID							
544		No objeción del BID							
545		Notificación de resultados a los participantes							
546		Plazo para presentación de recurso							
547		Apertura de propuestas de precios							
548		Evaluación combinada de calidad y costo							
549		Remisión de informe final al BID para su información							
550		Negociación del contrato							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m Date: Thu 9/5/13	Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
	Split		External Milestone		Duration-only		Deadline	
	Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Progress	
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary			
	Project Summary		Inactive Summary		Start-only			

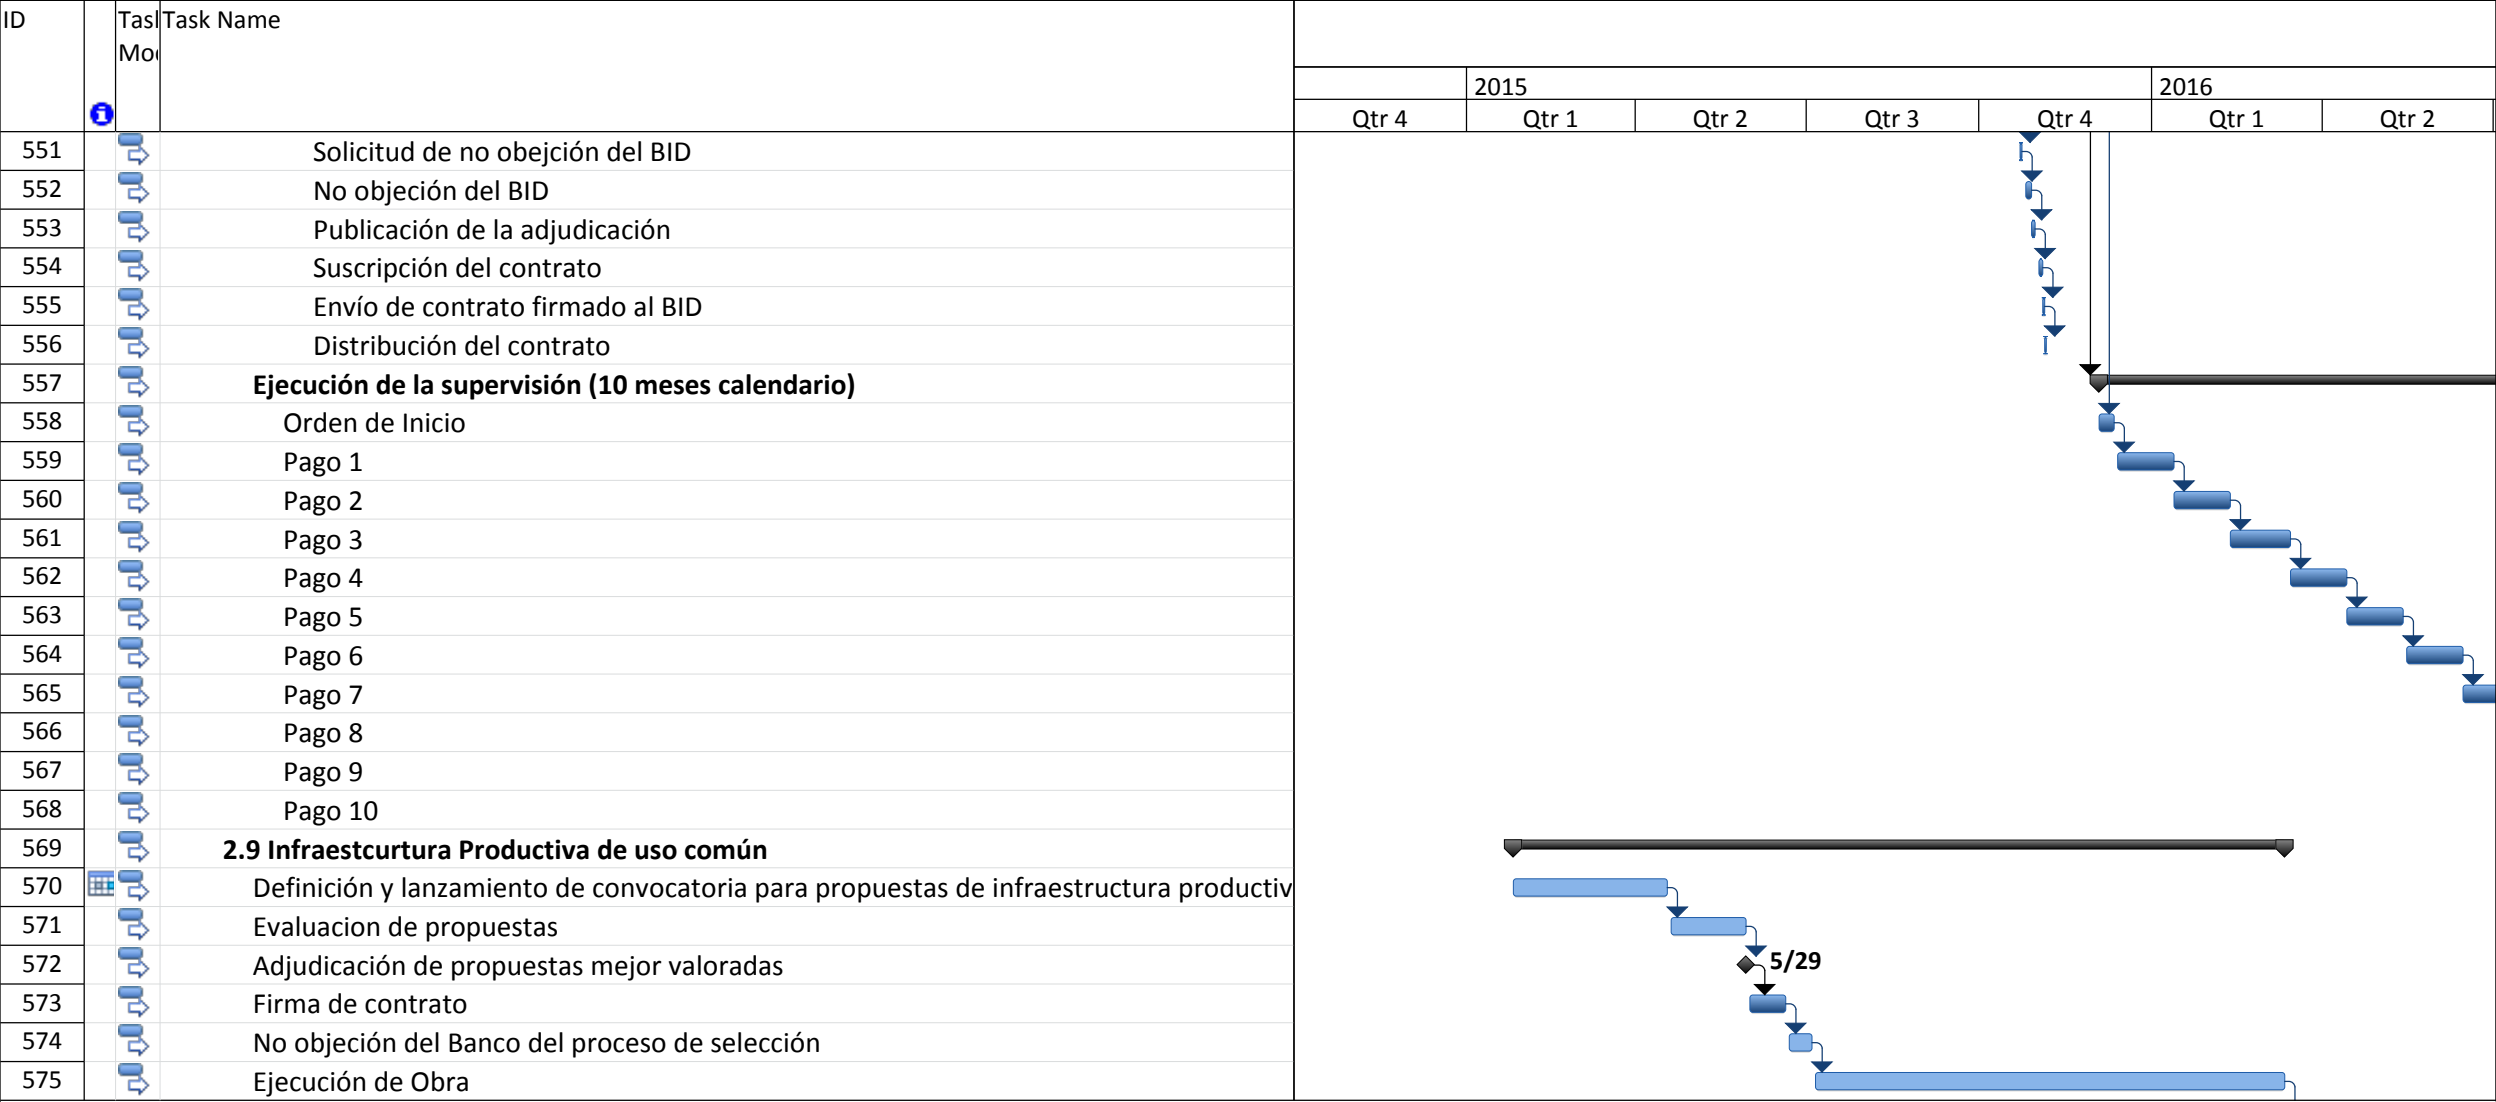

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

ID	Task Mode	Task Name								
			Qtr 4	2015		2016		2017		
			Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4
576	Task	Cierre de obras								
577	Task	Componente III-Gestión Ambiental de la Franja Costero Marina								
578	Task	3.1 Manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques salados y zonas costeras								
579	Task	Levantamiento de condición actual de campo, incluyendo capas ídricas batimetría y p								
580	Task	Definición de términos de referencia								
581	Task	Búsqueda de candidatos								
582	Task	Evaluación de candidatos								
583	Task	Proceso de contrato								
584	Task	Firma de contrato								
585	Task	Ejecución de consultoría								
586	Task	Identificación de áreas de ribera afectadas por procesos de deterioro de la vegetació								
587	Task	Definición de términos de referencia								
588	Task	Búsqueda de candidatos								
589	Task	Evaluación de candidatos								
590	Task	Proceso de contrato								
591	Task	Firma de contrato								
592	Task	Ejecución de consultoría								
593	Task	Formulación del Plan de Aprovechamiento Sostenible (PLAS) de los recursos pesquero								
594	Task	Definición de términos de referencia								
595	Task	Búsqueda de candidatos								
596	Task	Evaluación de candidatos								
597	Task	Proceso de contrato								
598	Task	Firma de contrato								
599	Task	Ejecución de consultoría								
600	Task	Estudio de capacidad de carga del manglar								

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m

Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary


Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 24

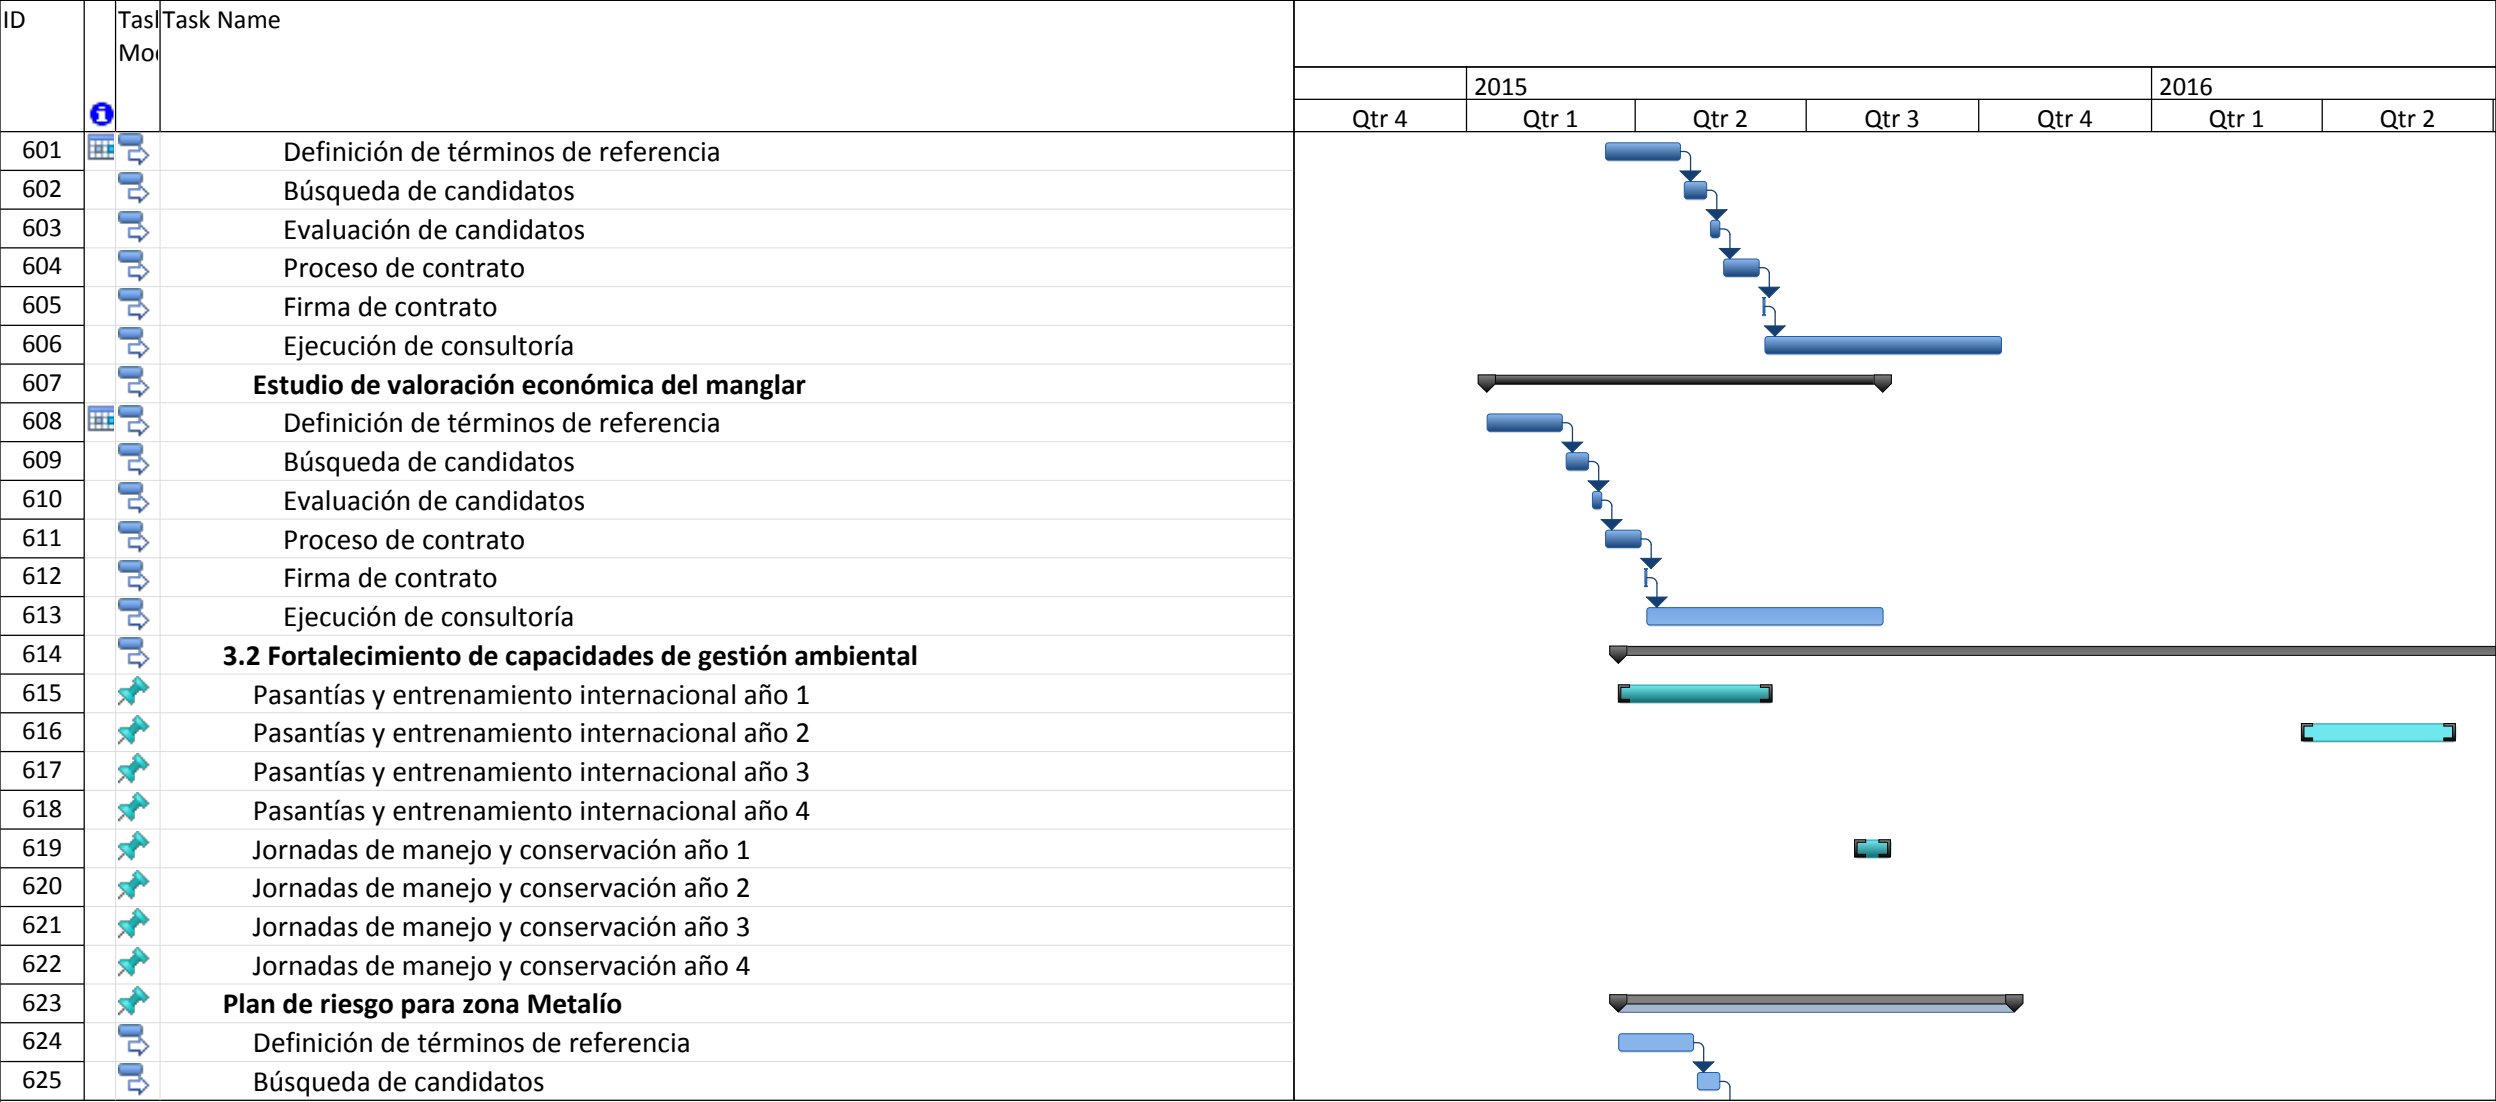

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

External Tasks

Split

External Milestone

Milestone

Inactive Task

Summary

Inactive Milestone

Project Summary

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup


Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

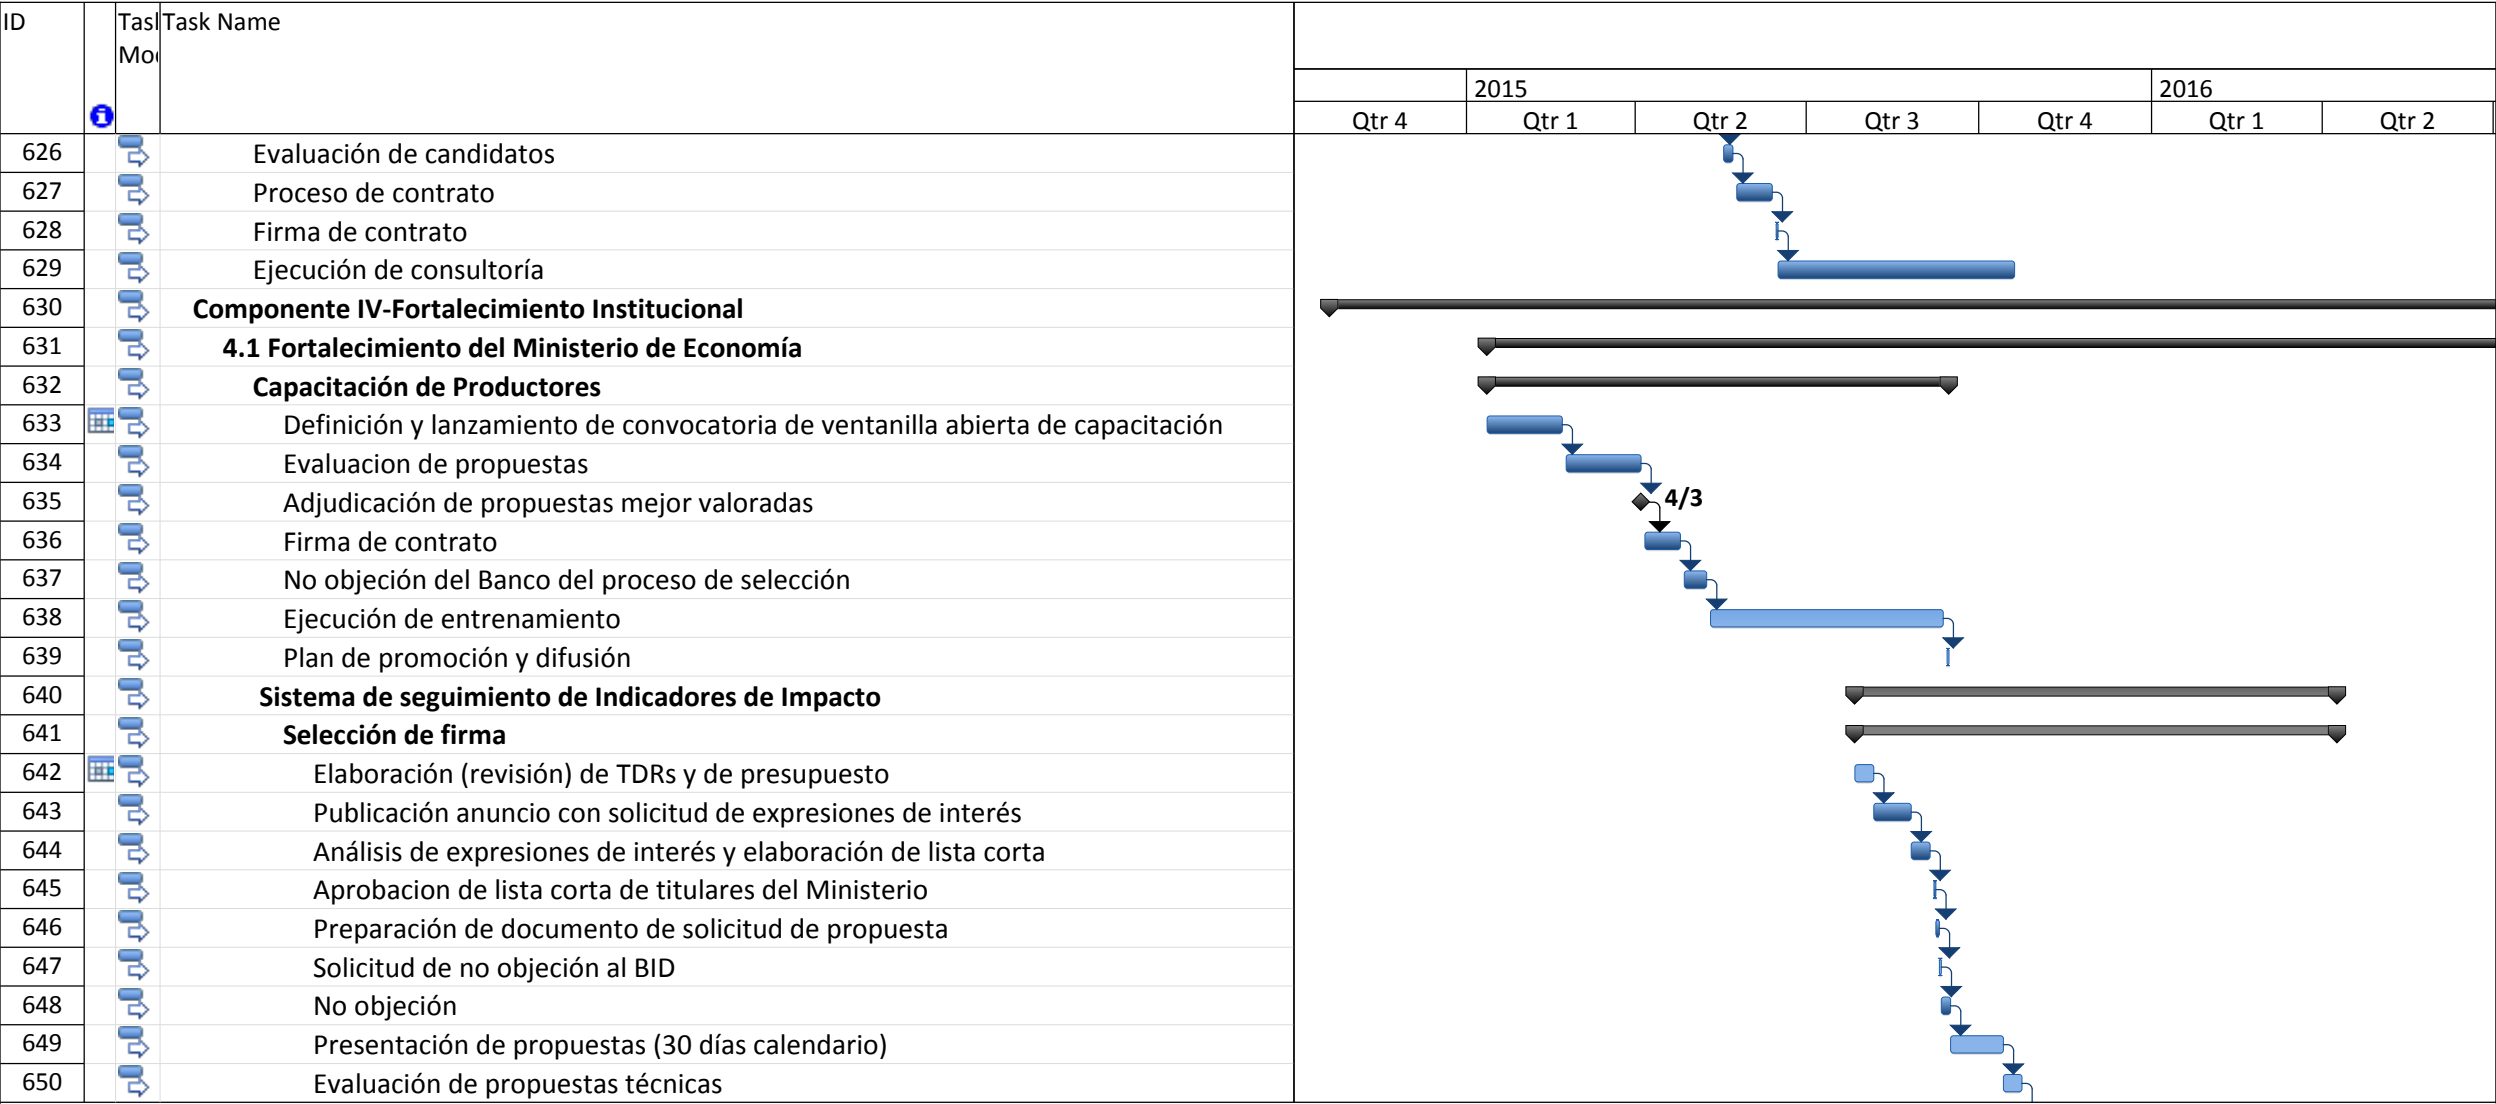

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
651		Solicitud de no obeección del BID							
652		No obeección del BID							
653		Notificación de resultados a los participantes							
654		Plazo para presentación de recurso							
655		Apertura de propuestas de precios							
656		Evaluación combinada de calidad y costo							
657		Remisión de informe final al BID para su información							
658		Negociación del contrato							
659		Solicitud de no obeección del BID							
660		No obeección del BID							
661		Publicación de la adjudicación							
662		Suscripción del contrato							
663		Envío de contrato firmado al BID							
664		Distribución del contrato							
665		Ejecución del contrato							
666		Estudios Especializados de Fomento Productivo Territorial							
667		Selección de firma							
668		Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto							
669		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés							
670		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta							
671		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio							
672		Preparación de documento de solicitud de propuesta							
673		Solicitud de no obeección al BID							
674		No obeección							
675		Presentación de propuestas (30 días calendario)							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m

Date: Thu 9/5/13

Task

External Tasks

Split

External Milestone

Milestone

Inactive Task

Summary

Inactive Milestone

Project Summary

Inactive Summary

Manual Task

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Progress

Deadline

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
676		Evaluación de propuestas técnicas							
677		Solicitud de no obeección del BID							
678		No objeción del BID							
679		Notificación de resultados a los participantes							
680		Plazo para presentación de recurso							
681		Apertura de propuestas de precios							
682		Evaluación combinada de calidad y costo							
683		Remisión de informe final al BID para su información							
684		Negociación del contrato							
685		Solicitud de no obeección del BID							
686		No objeción del BID							
687		Publicación de la adjudicación							
688		Suscripción del contrato							
689		Envío de contrato firmado al BID							
690		Distribución del contrato							
691		Ejecución del contrato							
692		4.2 Fortalecimiento del CONAMYPE							
693		Sistema de georeferenciación de empresas en las zonas de intervención							
719		Desarrollo de un sistema de monitoreo para medición de impacto							
720		Selección de firma							
721		Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto							
722		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés							
723		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta							
724		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio							
725		Preparación de documento de solicitud de propuesta							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
726		Solicitud de no objeción al BID							
727		No objeción							
728		Presentación de propuestas (30 días calendario)							
729		Evaluación de propuestas técnicas							
730		Solicitud de no obejción del BID							
731		No objeción del BID							
732		Notificación de resultados a los participantes							
733		Plazo para presentación de recurso							
734		Apertura de propuestas de precios							
735		Evaluación combinada de calidad y costo							
736		Remisión de informe final al BID para su información							
737		Negociación del contrato							
738		Solicitud de no obejción del BID							
739		No objeción del BID							
740		Publicación de la adjudicación							
741		Suscripción del contrato							
742		Envío de contrato firmado al BID							
743		Distribución del contrato							
744		Ejecución del contrato							
745		Desarrollo de cultura de gestión de riesgo							
746		Selección de firma							
747		Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto							
748		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés							
749		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta							
750		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Progress

Start-only

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
751		Preparación de documento de solicitud de propuesta							
752		Solicitud de no objeción al BID							
753		No objeción							
754		Presentación de propuestas (30 días calendario)							
755		Evaluación de propuestas técnicas							
756		Solicitud de no obejcción del BID							
757		No objeción del BID							
758		Notificación de resultados a los participantes							
759		Plazo para presentación de recurso							
760		Apertura de propuestas de precios							
761		Evaluación combinada de calidad y costo							
762		Remisión de informe final al BID para su información							
763		Negociación del contrato							
764		Solicitud de no obejcción del BID							
765		No objeción del BID							
766		Publicación de la adjudicación							
767		Suscripción del contrato							
768		Envío de contrato firmado al BID							
769		Distribución del contrato							
770		Ejecución del contrato							
771		4.3 Fortalecimiento de las Asociaciones de Desarrollo Económico Local							
772		Equipamiento de Asociaciones de Desarrollo Económico Local							
773		Adecuación de espacios de atención a empresarios							
774		Asesoría internacional para desarrollo económico local							
775		Selección de firma							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m

Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone














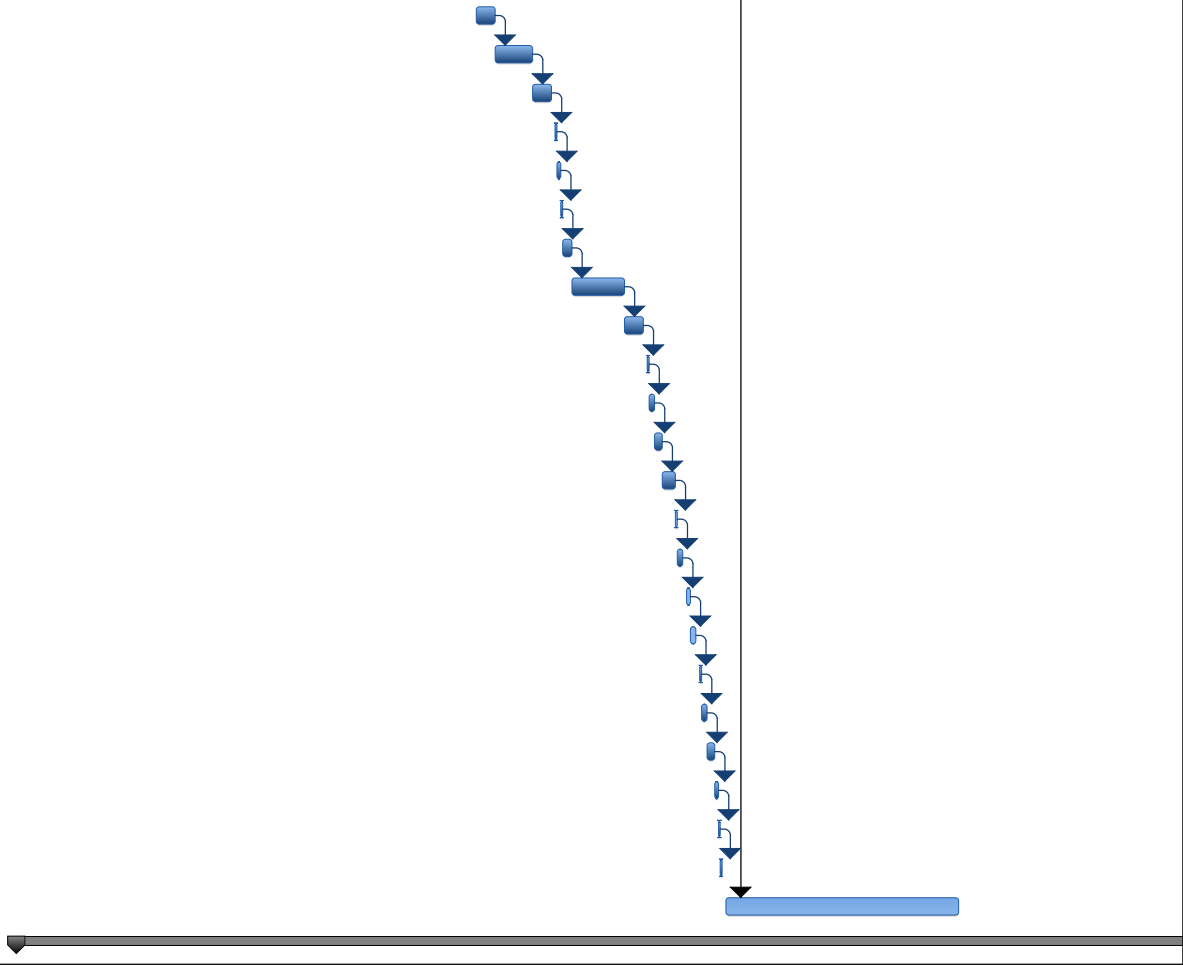














Summary

Project Summary

External Tasks
 External Milestone
 Inactive Task
 Inactive Milestone
 Inactive Summary

Manual Task
 Duration-only
 Manual Summary Rollup
 Manual Summary
 Start-only

Finish-only
 Deadline
 Progress

ID	Task Mo	Task Name							
			2015					2016	
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
776	 	Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto							
777		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés							
778		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta							
779		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio							
780		Preparación de documento de solicitud de propuesta							
781		Solicitud de no objeción al BID							
782		No objeción							
783		Presentación de propuestas (30 días calendario)							
784		Evaluación de propuestas técnicas							
785		Solicitud de no obejción del BID							
786		No objeción del BID							
787		Notificación de resultados a los participantes							
788		Plazo para presentación de recurso							
789		Apertura de propuestas de precios							
790		Evaluación combinada de calidad y costo							
791		Remisión de informe final al BID para su información							
792		Negociación del contrato							
793		Solicitud de no obejción del BID							
794		No objeción del BID							
795		Publicación de la adjudicación							
796		Suscripción del contrato							
797		Envío de contrato firmado al BID							
798		Distribución del contrato							
799		Ejecución del contrato							
800		4.4 Fortalecimiento de CENDEPESCA							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13


Task


Split


Milestone


Summary


Project Summary












External Tasks


External Milestone


Inactive Task


Inactive Milestone


Inactive Summary












Manual Task


Duration-only


Manual Summary Rollup


Manual Summary


Start-only














Finish-only

Deadline

Progress







ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
801		Plan e implementación de de promoción y divulgación del acceso a los servicios							
802		Selección de firma							
803		Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto							
804		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés							
805		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta							
806		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio							
807		Preparación de documento de solicitud de propuesta							
808		Solicitud de no objeción al BID							
809		No objeción							
810		Presentación de propuestas (30 días calendario)							
811		Evaluación de propuestas técnicas							
812		Solicitud de no obejción del BID							
813		No objeción del BID							
814		Notificación de resultados a los participantes							
815		Plazo para presentación de recurso							
816		Apertura de propuestas de precios							
817		Evaluación combinada de calidad y costo							
818		Remisión de informe final al BID para su información							
819		Negociación del contrato							
820		Solicitud de no obejción del BID							
821		No objeción del BID							
822		Publicación de la adjudicación							
823		Suscripción del contrato							
824		Envío de contrato firmado al BID							
825		Distribución del contrato							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m

Date: Thu 9/5/13

Task

External Tasks

Manual Task

Finish-only

Split

External Milestone

Duration-only

Deadline

Milestone

Inactive Task

Manual Summary Rollup

Progress

Summary

Inactive Milestone

Manual Summary

Project Summary

Inactive Summary

Start-only

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
826		Ejecución del contrato							
827		Diseño, equipamiento y asistencia técnica para un sistema de estadísticas pesqueras							
828		Selección de firma							
829		Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto							
830		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés							
831		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta							
832		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio							
833		Preparación de documento de solicitud de propuesta							
834		Solicitud de no objeción al BID							
835		No objeción							
836		Presentación de propuestas (30 días calendario)							
837		Evaluación de propuestas técnicas							
838		Solicitud de no obejcción del BID							
839		No objeción del BID							
840		Notificación de resultados a los participantes							
841		Plazo para presentación de recurso							
842		Apertura de propuestas de precios							
843		Evaluación combinada de calidad y costo							
844		Remisión de informe final al BID para su información							
845		Negociación del contrato							
846		Solicitud de no obejcción del BID							
847		No objeción del BID							
848		Publicación de la adjudicación							
849		Suscripción del contrato							
850		Envío de contrato firmado al BID							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m

Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Progress

Start-only

ID	Task Mo	Task Name							
			2015				2016		
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
851		Distribución del contrato							
852		Ejecución del contrato							
853		Diseño, equipamiento y asistencia técnica para la actualización del sistema de registro							
854		Selección de firma							
855		Elaboración (revisión) de TDRs y de presupuesto							
856		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés							
857		Análisis de expresiones de interés y elaboración de lista corta							
858		Aprobacion de lista corta de titulares del Ministerio							
859		Preparación de documento de solicitud de propuesta							
860		Solicitud de no objeción al BID							
861		No objeción							
862		Presentación de propuestas (30 días calendario)							
863		Evaluación de propuestas técnicas							
864		Solicitud de no obejción del BID							
865		No objeción del BID							
866		Notificación de resultados a los participantes							
867		Plazo para presentación de recurso							
868		Apertura de propuestas de precios							
869		Evaluación combinada de calidad y costo							
870		Remisión de informe final al BID para su información							
871		Negociación del contrato							
872		Solicitud de no obejción del BID							
873		No objeción del BID							
874		Publicación de la adjudicación							
875		Suscripción del contrato							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

External Tasks

Split

External Milestone

Milestone

Inactive Task

Summary

Inactive Milestone

Project Summary

Inactive Summary

Manual Task

Manual Task

Duration-only

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Manual Summary

Start-only

Start-only

Finish-only


Finish-only

Deadline

Deadline

Progress

Progress

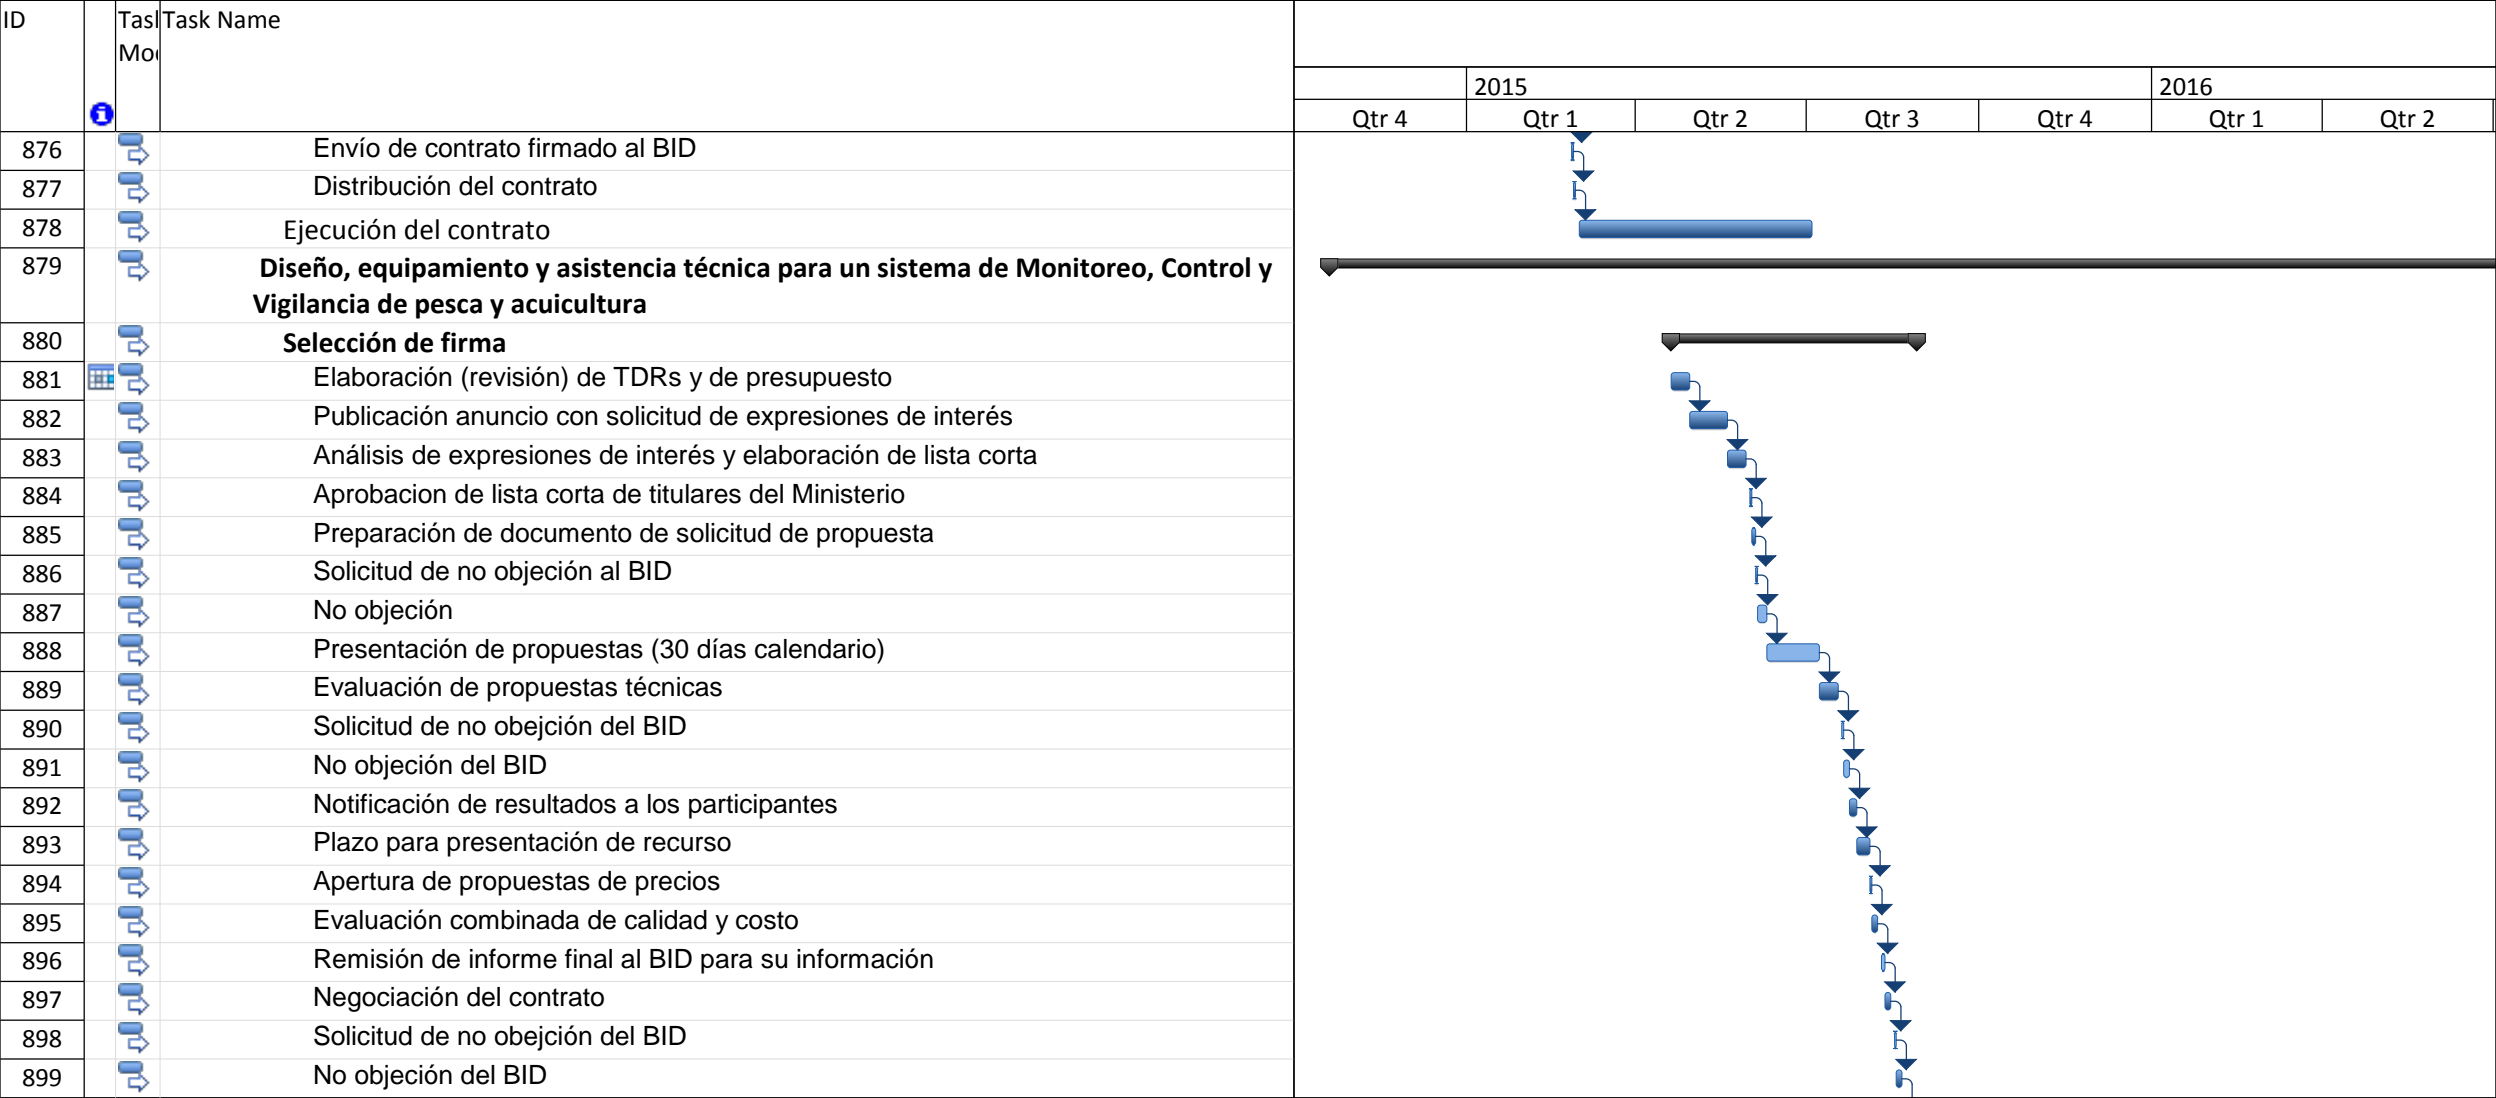

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m
Date: Thu 9/5/13

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

ID	Task Mo	Task Name							
				2015				2016	
			Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4	Qtr 1	Qtr 2
900		Publicación de la adjudicación							
901		Suscripción del contrato							
902		Envío de contrato firmado al BID							
903		Distribución del contrato							
904		Ejecución del contrato							
905		Administración							

Project: ES-L1075-POA Inicial 18 m Date: Thu 9/5/13	Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only	
	Split		External Milestone		Duration-only		Deadline	
	Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Progress	
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary			
	Project Summary		Inactive Summary		Start-only			
