



Operation Number: **GU-L1022**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/17/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/17/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Improved Access and Quality of Health and Nutrition Services - Phase I	Loan Number:	2328/BL-GU
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		
Team Leader:	Perez Exposito,Ana	Sector/Subsector:	HEALTH SERVICES
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	GUATEMALA
Borrower:	REPUBLICA DE GUATEMALA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
GU-L1022	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$0.00		\$35,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
GU-L1022	\$35,000,000.00	\$8,500,000.00	24.29%	\$26,500,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

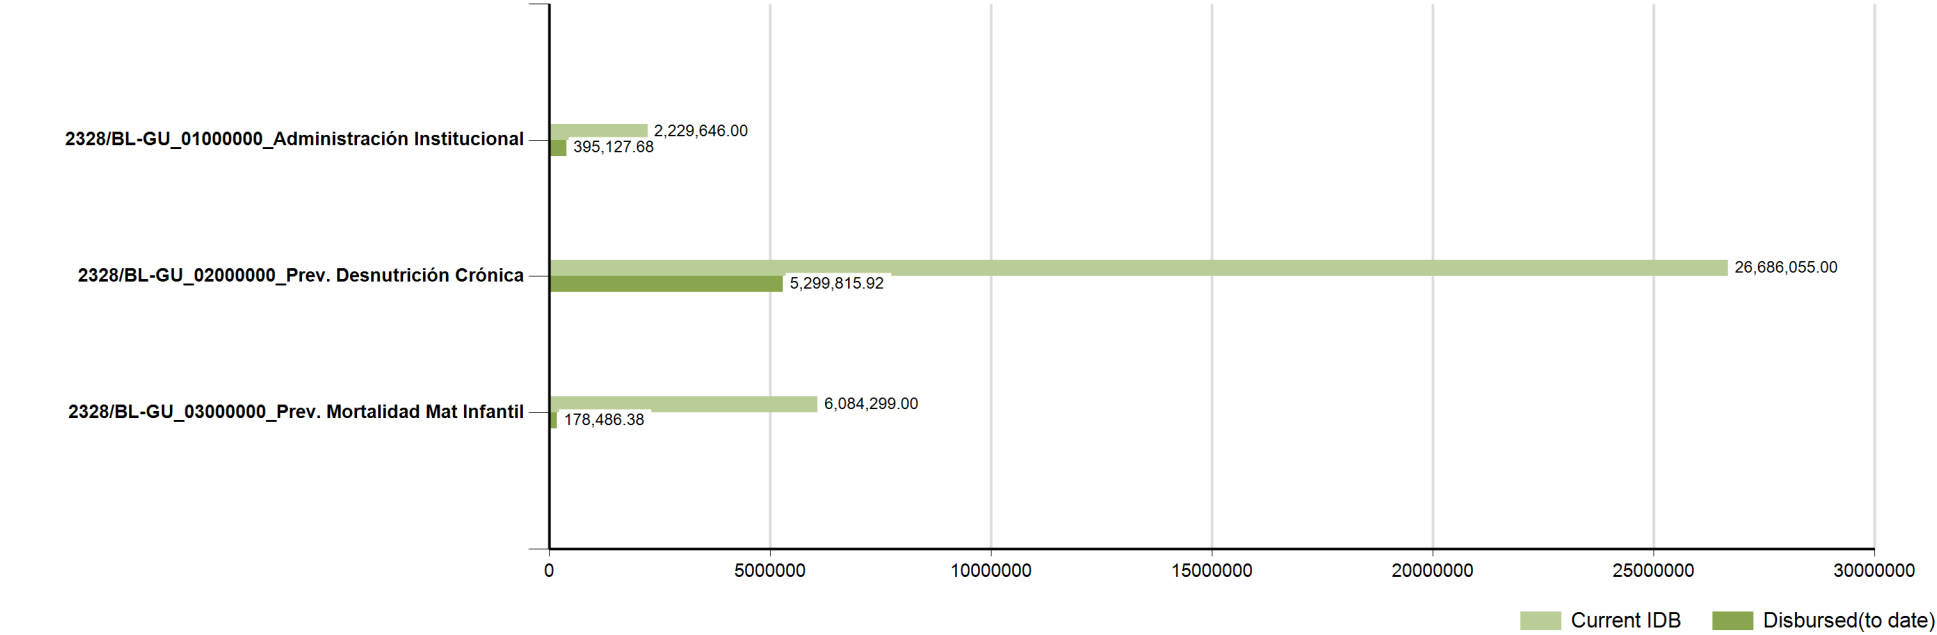

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 El acceso, la utilización y la calidad de los servicios de nutrición y salud del primer y segundo nivel de atención mejorada, en al menos 47 municipios priorizados por el programa de transferencias condicionadas.									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016		EOP	
1.1 Desnutrición crónica en niños de 6 a 24 meses		%	44.50	2011	Encuesta Evaluación de Impacto	Población cubierta por GMI y AIMN-C fortalecido en 47 municipios	P		38.50	
							P(a)		38.50	
							A			
1.2 Anemia en niños de 6 a 24 meses		%	65.00	2011	Encuesta Evaluación de Impacto	Población cubierta por GMI y AIMN-C fortalecido en 47 municipios	P		53.60	
							P(a)		53.60	
							A			
1.3 Anemia en mujeres embarazadas y lactantes		%	22.00	2011	ENSMI 2008 y siguientes ENSMI	Población en 47 municipios	P		18.20	
							P(a)		18.20	
							A			

 RF - Contribution

 RF - Alignment

 RF - Strategic Alignment

 RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator


 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Acceso y cobertura de los servicios de salud del primer nivel de atención en énfasis en nutrición preventiva										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	EOP	
1.1 Embarazadas captadas antes de 12 semanas de embarazo por equipo GMI	 P-G	%	0.00	2011	Sistema de información MSPAS	Mujeres embarazadas en comunidades cubiertas por GMI en los 47 municipios priorizados	P	11.00	16.00	21.00	21.00
							P(a)	11.00	16.00	21.00	21.00
	A						0.00	64.00	0.00		

1.1 Embarazadas con al menos dos controles por médico o enfermera profesional del GMI y uno en el último trimestre	 P-G	%	0.00	2011	Sistema de información MSPAS	Mujeres embarazadas en comunidades cubiertas por GMI en los 47 municipios priorizados	P	15.00	22.00	30.00	30.00
	P(a)						15.00	22.00	30.00	30.00	
	A						0.00	64.00	0.00		
1.2 Recién nacidos con un control médico en los primeros 28 días de nacido por equipo GMI		%	0.00	2011	Sistema de Información MSPAS	Población cubierta por GMI y AIMN-C fortalecido en 47 municipios	P	20.00	30.00	40.00	40.00
	P(a)						20.00	30.00	40.00	40.00	
	A						0.00	52.00	0.00		
1.3 Niños menores de 12 meses con esquema de inmunización completa según la norma entregado por equipo GMI		%	0.00	2011	Sistema de Información MSPAS	niños menores de 12 meses en comunidades cubiertas por GMI en los 47 municipios	P	40.00	60.00	80.00	80.00
	P(a)						40.00	60.00	80.00	80.00	
	A						0.00	75.00	0.00		

Outcome:	2 Calidad de los servicios de salud del primer nivel de atención con énfasis en nutrición preventiva
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	EOP
2.1 Niños entre 6 y 59 meses atendidos por GMI que reciben micronutrientes espolvoreados de acuerdo a la norma		%	0.00	2011	Sistema de Información MSPAS	Población cubierta por GMI y AIMN-C en 47 municipios	P	40.00	60.00	80.00	80.00
	P(a)						40.00	60.00	80.00	80.00	
	A						0.00	64.00	0.00		
2.1 Niños de 12 a 24 meses suplementados con dosis de Vitamina A a partir de los 12 meses de edad atendidos por GMI		%	0.00	2011	Sistema de Información MSPAS	Población cubierta por GMI y AIMN-C en 47 municipios	P	35.00	50.00	70.00	70.00
	P(a)						35.00	50.00	70.00	70.00	
	A						0.00	63.00	0.00		

2.2 Facilitadores institucionales GMI capacitados que pesan de acuerdo a la norma		%	0.00	2014	Evaluación de Proceso AIMN-C y GMI	Personal técnico de los GMIs en los 47 municipi os priorizad os	P		50.00		50.00
							P(a)		50.00	50.00	50.00
							A		85.00	0.00	
Outcome:	3 Fortalecimiento del sistema de información en salud										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	EOP
3.1 Puestos de Salud que recibieron 2 visitas de supervisión en los últimos 6 meses		%	0.00	2011	Encuesta equipo Monitoreo y Evaluación del Proyecto	47 municipios priorizados	P		70.00		70.00
							P(a)		70.00	70.00	70.00
							A		100.00	0.00	
3.1 Jurisdicciones del PEC y GMI que recibieron 2 visitas de supervisión en los últimos 6 meses		%	0.00	2014	Evaluación de Proceso AIMN-C y GMI	47 municipios priorizados	P		70.00		70.00
							P(a)		70.00	70.00	70.00
							A		86.00	0.00	

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Acceso y cobertura de los servicios de salud del primer nivel de atención con énfasis en nutrición preventiva		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Población cubierta por Grupos Móviles Institucionales GMI (beneficiarios-año)	Beneficiaries (#)	P	550,000.00	1,550,000.00	P	6,100,000.00	15,000,000.00
		P(a)	530,000.00	2,088,863.00	P(a)	5,100,000.00	15,000,000.00
		A	538,863.00	1,497,726.00	A	550,581.00	5,277,278.98
Número de Puestos de Salud construidos y equipados	puestos de salud	P	8.00	8.00	P	1,700,000.00	1,700,000.00
		P(a)	0.00	8.00	P(a)	460,000.00	1,700,000.00
		A	0.00	0.00	A	6,794.00	6,794.00
Calidad de los servicios de salud del primer nivel de atención con énfasis en nutrición preventiva		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Construcción de unidades de manejo de desechos sólidos hospitalarios	Unidades	P	10.00	10.00	P	510,000.00	510,000.00
		P(a)	10.00	10.00	P(a)	150,000.00	510,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Puestos de Salud dotados con equipamiento y mobiliario	puestos de salud	P	0.00	262.00	P	0.00	1,830,000.00
		P(a)	262.00	524.00	P(a)	0.00	1,830,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Auxiliares de Enfermería formadas en multiculturalismo	Talleres	P	3.00	8.00	P	81,000.00	216,000.00
		P(a)	5.00	8.00	P(a)	25,000.00	216,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Auxiliares de Enfermería con grado profesional	Individuos	P	200.00	200.00	P	288,000.00	288,000.00
		P(a)	200.00	200.00	P(a)	120,000.00	288,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Municipios cuyos trabajadores de salud del primer nivel (institucional: GMI, puestos; comunitario: comadronas, educadores) han sido capacitados en prácticas de atención y prevención incluyendo nutrición	municipios	P	27.00	47.00	P	1,400,000.00	2,300,000.00
		P(a)	27.00	87.00	P(a)	150,000.00	2,300,000.00
		A	0.00	60.00	A	0.00	115,386.44
Puestos de salud rehabilitados	puestos de salud	P	47.00	47.00	P	2,500,000.00	2,500,000.00
		P(a)	25.00	47.00	P(a)	1,100,000.00	2,500,000.00
		A	0.00	0.00	A	38,550.00	38,550.00
Puestos de salud con reparaciones menores realizadas	puestos de salud	P	150.00	150.00	P	700,000.00	700,000.00
		P(a)	0.00	150.00	P(a)	400,000.00	700,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Fortalecimiento del sistema de información en salud		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Áreas de salud con aplicaciones informáticas implementadas	áreas de salud	P	6.00	10.00	P	660,000.00	1,100,000.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	120,000.00	1,100,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Áreas con dotación de equipo de aire y video	áreas de salud	P	0.00	10.00	P	0.00	125,000.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	0.00	125,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Áreas de salud dotadas de infraestructura informática	áreas de salud	P	0.00	10.00	P	0.00	1,300,000.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	0.00	1,300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Áreas de salud con conectividad de unidades de prestación de servicios	áreas de salud	P	0.00	10.00	P	0.00	1,800,000.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	0.00	1,800,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administración, evaluaciones, auditoría e imprevistos							

Other Cost		2016	Cost
Administración, Auditoría e Imprevistos	P	\$2,215,000.00	\$5,631,000.00
	P(a)	\$2,671,460.00	\$5,631,000.00
	A	\$223,582.00	\$773,394.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$16,154,000.00	\$35,000,000.00
	P(a)	\$10,296,460.00	\$35,000,000.00
	A	\$819,507.00	\$6,211,403.42

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
