Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO (FINAL)

JULIO 2011 - DICIEMBRE 2011

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría

Nro. Proyecto: BO-M1005 - Nro. Operación: ATN/MT-10078-BO

Propósito: Los profesionales miembros del CAUB aplican normas contables y de auditoría acordes a la normativa internacional NIIF y NIA.

País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
BOLIVIA	BOLIVIA	FCD - Sector financiero y mercado de capitales	AUST - Normas de contabilidad y auditoría

Agencia Ejecutora:	Colegio de Auditores o Contadores Públicos Autorizados	**Líder equipo de diseño:**	Ponce, Camille
		Líder equipo de supervisión:	Ponce, Camille

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

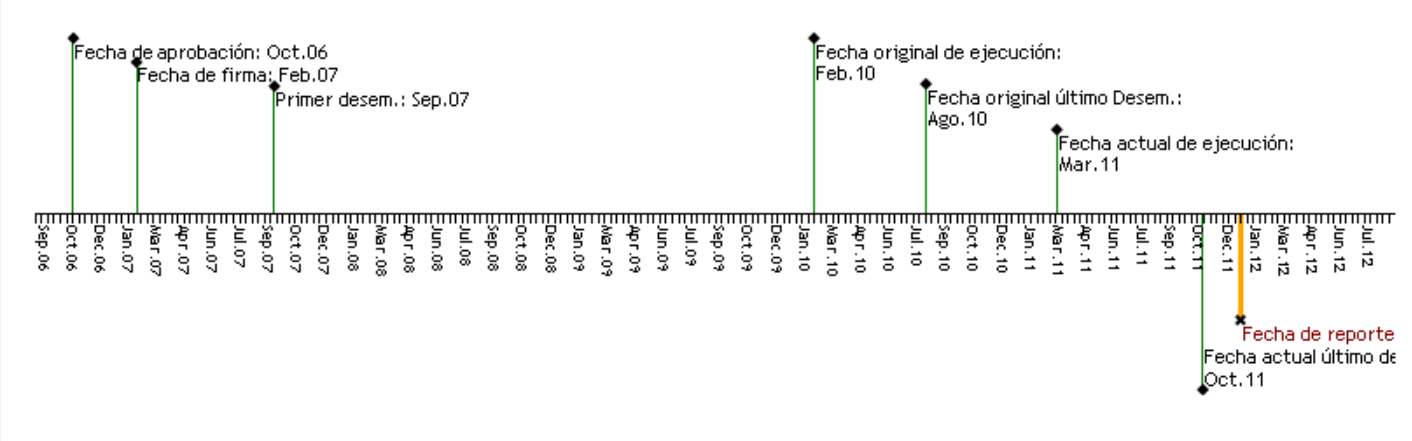

RECURSOS

	Aprobado	Cancelado	Desembolsado
FOMIN	$498,000.00	$42,006.26	$455,993.74
Contrapartida	$0.00	$213,500.00	$215,282.29

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

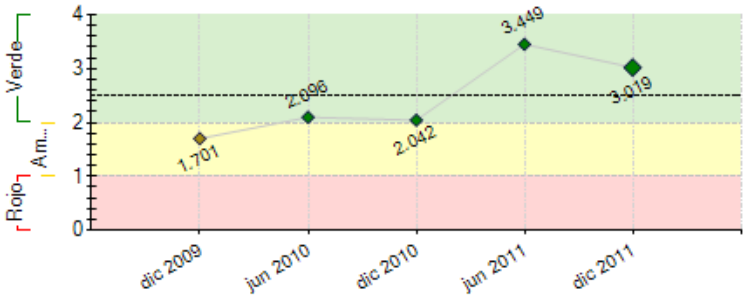

----- Promedio desempeño FOMIN

SECCIÓN 2: RESULTADOS Y LOGROS

Desempeño del proyecto una vez terminado

La ejecución del proyecto fue muy satisfactoria, los indicadores fueron sustancialmente cumplidos. Los productos y resultados alcanzados son muy útiles para la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. La *lógica* del proyecto mantiene su validez; la operación fue *efectiva*, *eficiente* y su *sostenibilidad* está asegurada después de terminar el apoyo financiero del FOMIN. Los principales resultados alcanzados y productos obtenidos: i) Aprobación de 38 NIF y 33 NA, 25 interpretaciones de NIF, 1 norma de control de calidad, 1 Código de Ética, 1 NIF para PYME; ii) Libros impresos: 10000 NIF básicas, 3000 NIF completas y 2000 NA; iii) 240 formadores en NIF y NA; iv) 7727 profesionales y estudiantes de la carrera capacitados; v) 9 convenios de cooperación con universidades; vi) Aprobación y puesta en funcionamiento de los Programas de Certificación y Control de calidad; vii) 5 páginas web de Colegios Departamentales para diseminar las normas y su enseñanza

Entre los obstáculos que se tuvieron: Ausencia de apoyo del Estado. Oposición inicial al cambio de la normativa; escasez de expertos con conocimiento de normas; ausencia de poder del CAUB como emisor de normas. Estos obstáculos fueron salvados y en su caso mitigados a través de gestiones realizadas por el CAUB, como ser: Suscripción de convenio con la Institución del Estado facultada para la emisión de normas contables en el país, donde se delega al CAUB la tarea de desarrollar las normas; jornadas de socialización y consenso a nivel nacional para acordar y definir el rumbo de la convergencia; buscar el apoyo de las instituciones internacionales como la IFAC y AIC; involucrar a todos los actores relacionados con la profesión contable

Existe una alta motivación de los contadores y los auditores por seguir con la certificación, la educación continuada y el control de calidad, con la implantación de estos programas, se asegura una fuente permanente de ingresos; La ejecución del proyecto ha generado una utilidad de US$ 120.000 derivados de la venta de libros y cursos; También refuerza la sostenibilidad la actual presencia del CAUB en los organismos internacionales rectores de la profesión (IFAC, AIC, CILEA y GLENIF), lo cual le permitirá seguir recibiendo apoyo al proceso formativo y mejoramiento en la calidad profesional; Finalmente, a través del Comité

Interinstitucional el CAUB ha logrado establecer eficientes canales de trabajo con las entidades del sector público y privado relacionados con la profesión contable

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El proyecto ha concluido y la evaluación final, en términos generales ha determinado que la ejecución fue **muy satisfactoria** y que los resultados son positivos. El análisis del marco lógico y de los indicadores respectivos pudo identificar que se cumplieron los objetivos y el propósito del proyecto. Los resultados de ejecución de los Componentes 1 y 2 fueron evaluados como **muy satisfactorios** y del Componte 3 como **satisfactorio**.

El objetivo del proyecto referido a que los profesionales miembros del CAUB apliquen normas contables y de auditoría acordes a la normativa internacional: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Auditoria (NIA), fue cumplido.

En el proyecto se tuvo como beneficiarios a capacitadores, usuarios, supervisores -nacionales e internacionales- de información contable de empresas bolivianas, así como a profesionales contadores y auditores y estudiantes de esta temática.

Evaluación final

'

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

'

Evaluación final http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36475620

SECCIÓN 3: INDICADORES

		Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Propósito: Los profesionales miembros del CAUB aplican normas contables y de auditoría acordes a la normativa internacional NIIF y NIA. **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**P.I1**	Porcentaje de socios activos que participan en los cursos sobre las nuevas normas	0	40	82	205 %
	P.I2	Porcentaje de las normas aprobadas publicadas y difundidas a los afiliados al CAUB.	0	100	100	100 %
	P.I3	Número de universidades por ciudad capital que introduce en la enseñanza las nuevas normas en convergencia con las normas internacionales.	0	9	9	100 %
	P.I4	Número de profesionales contables, socios activos del CAUB, que participan como beneficiarios del proyecto.	0	6000	4924	82 %
	P.I5	Número de estudiantes de la profesión contable que participan del proyecto como beneficiarios.	0	3300	3043	92 %
	P.I6	Número de Entidades Gremiales de la Profesión Contable que participan en el proyecto.	0	10	10	100 %
Componente 1: Normas bolivianas armonizadas con las normas internacionales. **Peso:** 40% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C1.I1**	Porcentaje de NIIF (IFRS) y NIA analizadas e interpretadas en el proyecto.	0	100	100	100 %
	C1.I2	Normas aprobadas por el Comité Interinstitucional y el Consejo Nacional del CAUB. Línea de base: NIIF 38 y NIA 33 y 2 de Ética y Control de Calidad	0	100	100	100 %
Componente 2: Profesionales del ramo conocen y tienen acceso a las normas bolivianas armonizadas con las normas internacionales. **Peso:** 50% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C2.I1**	Porcentaje de afiliados activos que reciben copia del 100% de las nuevas normas aprobadas. Línea de base: STC 1800, LP 1500, CBB 1500, CH 600, PT 200, OR 200, TJ 150, BN 30, PD 20. Total 6.000.	0	90	88	98 %
	C2.I2	Al final del proyecto, al menos el 80% de los capacitados aprueban los cursos (NIF-1.100; NB-1.100; NA-800; NB Universitarios-3.300)	0	80	100	125 %
	C2.I3	El CAUB introduce en su plan de capacitación las NIIF para PYME.			Si	100 %
	C2.I4	Porcentaje de los participantes que aprueba los cursos de capacitación a capacitadores de NIF y NA y al menos uno por departamento ha sido contratado como instructor del proyecto (excepción Cobija y Trinidad). Línea de base: 180 profesionales capacitadores en NIF y/o NA	0	60	100	167 %
Componente 3: La calidad de los servicios profesionales de auditoría cuentan con un sistema de certificación voluntario, un sistema de control de calidad y un centro de información disponibles. **Peso:** 10% **Clasificación:** Satisfactorio	**C3.I1**	El sistema de Certificación Profesional Voluntario ha sido aprobado por el Consejo Nacional del CAUB			Si	100 %
	C3.I2	La metodología del Sistema de Control de Calidad ha sido aprobada por el Consejo Nacional del CAUB y probada en firmas auditoras.	0	3	4	133 %

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

[X] Cambios en la política nacional

[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 5 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable
A la fecha el proyecto ya ha concluido y el CAUB ha continuado con la difusión y capacitación de las Normas NIF y NIAS. El CAUB a cobrado relevancia a nivel internacional y nacional y se han posicionado como un Colegio líder en la temática. Por otro lado, el CAUB tiene recursos financieros generados gracias al proyecto, que le permitirán continuar con las acciones del proyecto en cuanto a investigación y capacitación.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Existe gran interés de profesionales y estudiantes por aprender y aplicar las normas y alta motivación de los afiliados por seguir con la certificación y control de calidad.
El proyecto ha generado un capital de US$ 120.000, derivados de la venta de libros y cursos de capacitación. La posición financiera está garantizada y provendría de los futuros eventos de capacitación, la venta de normas y otros productos, los cursos de certificación, control de calidad, el incremento de sus afiliados y firmas de auditoría. También refuerza la sostenibilidad, la actual presencia del CAUB en los organismos internacionales rectores de la profesión (IFAC, AIC, CILEA y GLENIF), lo cual le permitirá seguir recibiendo apoyo al proceso formativo y mejoramiento profesional.
A través del Comité Interinstitucional el CAUB ha logrado establecer eficientes canales de trabajo con las entidades públicas y privadas relacionado con la profesión contable.
Otro elemento muy significativo que dará sostenibilidad proviene del Convenio Interinstitucional firmado con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), que reconoce al CAUB como la instancia encargada de elaborar la normativa contable.

Plan de Sostenibilidad http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36430237

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas	Relativa a	Autor
1. Otro aprendizaje fue que la creación del Comité Interinstitucional como mecanismo de acción resultó ser una buena práctica para integrar a todos los involucrados del proyecto y la participación activa de sus miembros ha sido una clave de éxito que permitió la ejecución y la reformulación adecuada del manejo de la operación en los momentos necesarios. El establecimiento de canales de comunicación y relacionamiento entre el CAUB, los colegios departamentales y los entes públicos y privados relacionados con la profesión contable e interesados en los objetivos del Proyecto, a través de las suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, permitieron que los objetivos del Proyecto se logren, pues con el involucramiento de todos los sectores beneficiarios, su coordinaron esfuerzos y se logró una mayor eficiencia y eficacia, situación que al inició adoleció el Proyecto.	Sustainability	Gil Gil, Gustavo
2. Otra importante lección aprendida es que la reticencia inicial de algunos actores de participar activamente mostró que a menor involucramiento en tomar decisiones mayor la demora en la ejecución. Esta aseveración es especialmente valida después de finalizado el periodo de ejecución del Proyecto, contrastando el aporte de algunos entes al final del Proyecto con relación a su renuencia inicial de participar en el programa.	Implementation	Gil Gil, Gustavo
3. El proceso de aprobación de las nuevas normas resultó ser más complejo que lo previsto. Dado el tiempo insumido en el análisis, búsqueda de consenso hasta la aprobación de la normativa – la cual en su mayor parte fue idéntica a los estándares internacionales - la interrogante que surge es que tal vez hubiera sido más lógico optar directamente por la vía de la adopción plena y no por la convergencia.	Implementation	Gil Gil, Gustavo

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

En el proyecto se han publicado 38 NIF y 33 NA que fueron aprobadas para Bolivia. Además se aprobaron: 1 Norma de Control de Calidad; el Código de Ética para Contadores; y las NIF para Pymes. Esta documentación se encuentra en la página web del CAUB, en la biblioteca de CBO y en el propio CAUB.
Se considera que esta documentación que ha sido publicada en documentos impresos y también en CD puede brindar información básica para otros colegios del gremio.
Por lo extenso de los documentos no se pudo subir todas las normas como productos en este PSR pero están disponibles en los sitios mencionados.

Productos principales del proyecto

[Nov 2010] Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Información Financiera 1 (NIF 1): Adopción por Primera Vez de las Normas de Información Financiera (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Información Financiera 2 (NIF-2): Pagos Basados en Acciones (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Información Financiera 3 (NIF-3): Combinaciones de Negocios (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Información Financiera 4 (NIF 4): Contratos de seguros (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Información Financiera 5 (NIF-5): Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas (Technical publications)

Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Información Financiera 6 (NIF 6): Exploración y evaluación de recursos naturales (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Información Financiera 7 (NIF-7): Instrumentos financieros: Información a revelar (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Información Financiera 8 (NIF-8): Segmentos de operación (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 1 (NC 1): Presentación de estados financieros (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 2 (NC 2): Inventarios (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 7 (NC 7): Estado de flujos de efectivo (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 8 (NC 8): Políticas contables, cambios en estimaciones contables y (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 10 (NC 10): Hechos ocurridos después de la fecha del balance (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 11 (NC 11): Contratos de construcción (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 12 (NC 12): Impuesto a las ganancias (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 16 (NC 16): Propiedades, planta y equipo (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 17 (NC 17): Arrendamientos (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 18 (NC 18): Ingresos de actividades ordinarias (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 19 (NC 19): Beneficios a los empleados (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 20 (NC 20): Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 21 (NC 21): Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 23 (NC 23): Costo por préstamos (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 24 (NC 24): Información a revelar sobre partes relacionadas (Technical publications)
Autor: CAUB

[Nov 2010] Norma de Contabilidad 26 (NC 26): Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro (Technical publications)
Autor: CAUB
