




Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

######

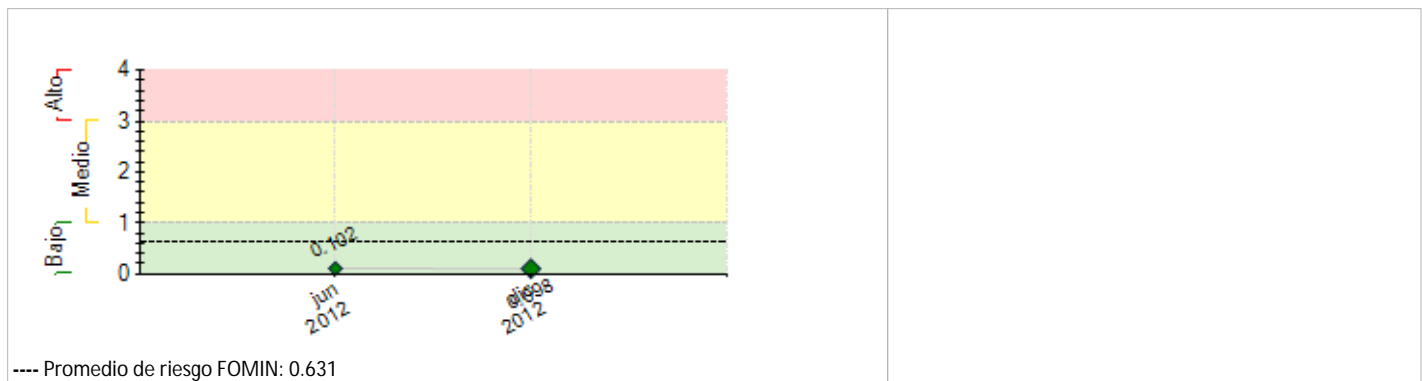

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Em 2012, devido à reorganização da equipe da ABVCAP e de limitações orçamentárias, o projeto não teve a celeridade esperada.

O foco maior foi na realização de fóruns de investimento e eventos de sensibilização, e a regionalização de suas atividades. Esse processo levou a ABVCAP a uma grande exposição no segmento de pequenas empresas e uma grande demanda surgiu dessa atuação, devido às inúmeras parcerias construídas para execução dessas atividades.

Outro grande esforço feito em 2012 foi em relação à captação de dados da indústria, cujos resultados só se farão sentir agora em 2013.

O maior empenho para mitigar riscos é buscar medidas de sustentabilidade e criar processos estruturados e registrados para que não haja quebra na continuidade dos projetos que dependem de consultorias externas, trazer esses consultores para o ambiente da ABVCAP, promovendo maior interação com os funcionários efetivos até que se possa torná-los parte da Associação.

A grande diversidade de stakeholders e o universo muito diferenciado compõem outro grande desafio. Buscamos mitigar os riscos com uma atração cada vez maior de nossos membros para as atividades estratégicas do projeto, o que vem dando resultados positivos.

Na próxima fase daremos ênfase à produção de estudos e conteúdo, para a indústria (gestores, investidores), à estruturação de treinamentos, à divulgação de dados da indústria e criaremos um processo contínuo de troca de experiências com as entidades similares latino-americanas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante o último semestre, foram alcançados resultados consideráveis com a capacitação de empresários e a realização de fóruns de investimento. Quatro eventos levaram os conceitos e fundamentos da indústria de private equity e venture capital a 137 empresários de diversas regiões do País. Adicionalmente, três fóruns de investimento setoriais capacitaram 36 empresários, para se apresentarem a investidores em eventos promovidos pela ABVCAP.

Outro grande driver da atuação da ABVCAP foi a discussão da nova regulamentação do CADE, através da promoção de encontros entre os Conselheiros da entidade e os associados da ABVCAP visando a avaliação dos impactos dessa medida nas operações realizadas na indústria de private equity e venture capital, em busca da maior agilidade possível na aprovação dessas operações.

Destaque para o envio à CVM de proposta de regulamentação consolidando as Instruções CVM nº 209 e 391, que normatizam a indústria de private equity e venture capital, trabalho desenvolvido pelo Comitê de Regulamentação da ABVCAP.

Nos próximos seis meses, além de cumprir a remodelação do website para criar uma interface mais direta com os empreendedores e facilitar o acesso à plataforma do Venture Fórum, a ABVCAP pretende concluir a primeira consolidação dos dados da indústria, apresentando um relatório durante o Congresso ABVCAP, em abril de 2013.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

I- Execução do Programa

Neste segundo semestre, a ABVCAP continuou realizando os Fóruns de Investimentos, eventos de sensibilização e buscando a regionalização de suas atividades, ganhando grande visibilidade no seguimento de pequenas empresas e parcerias para realização destas atividades.

Respondendo a solicitação do Banco, enfatizou o trabalho de sistematização de processos e registro das lições aprendidas. Trabalhou na redução dos riscos do projeto, buscou a integração dos consultores externos ao ambiente da ABVCAP e a integração dos Stakeholders nas atividades estratégicas.

Os próximos objetivos da ABVCAP serão: produção de estudos e conteúdo voltados para indústria, estruturação de treinamentos, divulgação de dados da indústria e a criação de um processo contínuo de troca de experiências com as entidades similares na América Latina. Além de remodelar o website, criando uma interface mais direta com os empreendedores e facilitando o acesso à plataforma Venture Fórum. A ABVCAP também visa concluir a primeira consolidação dos dados da indústria com a apresentação de um relatório durante o Congresso ABVCAP, em abril de 2013.

No segundo semestre de 2012 a ABVCAP alcançou resultados consideráveis como:

- 1-realização de 4 eventos sobre capital semente que capacitaram 137 empresários de diversas regiões do país e mais 3 fóruns de investimento que capacitaram 36 empresários a fim de se apresentarem a investidores em eventos promovidos por esta Agência Executora.
- 2-Promoção de encontro entre conselheiros das entidade e associados ABVCAP, visando a discussão da nova regulamentação do CADE, avaliando os impactos dessa medida nas operações realizadas na indústria de *Private Equity*.
- 3-Envio de proposta de regulamentação consolidando as instruções CVM nº 209 e 391, normalizando a indústria de *Private Equity e Venture Capital*, criado pelo Comitê de Regulamentação da ABVCAP.

II- Cumprimentos dos Marcos Intermediários

No semestre compreendido por este relatório, a ABVCAP cumpriu os Marcos Intermediários conforme planejado.

Alcance	Descrição	Prazo	Cumprimento
100%	P.14- Numero de regulamentos vigentes ou sob consideração por parte dos organismos normativos pertinentes como resultado dos estudos ou propostas apresentadas no marco do projeto.	Março de 2016	Julho de 2012

III- Cumprimento das Cláusulas da Carta-Convênio

No semestre compreendido por este relatório, a ABVCAP cumpriu 4 cláusulas presentes no Convênio de Cooperação Técnica, sendo 3 com pequeno atraso, inferior a 30 dias, que não afetou o desempenho operacional do projeto.

Cláusula	Descrição	Prazo	Cumprimento
2(a)(ii)	Apresentar solicitação de desembolso justificada por extenso	06 de setembro de 2012	26 de setembro de 2012
2(a)(iii)	Apresentação do cronograma para o uso da Contrapartida Local.	06 de setembro de 2012	26 de setembro de 2012
3(a)(ii)	Apresentação de organograma dos responsáveis pelas atividades relacionadas com a execução do Programa.	06 de setembro de 2012	02 de outubro de 2012

3(a)(iii)	Apresentação do primeiro POA.	06 de setembro de 2012	25 de julho de 2012
-----------	-------------------------------	------------------------	---------------------

IV- Avaliações

Por se tratar do período inicial do projeto, ainda não foi realizada nenhuma avaliação, que estão previstas para o primeiro trimestre de 2014 (avaliação intermediária) e para o primeiro semestre de 2016 (avaliação final).

V- Sustentabilidade do Programa

O empenho da equipe da ABVCAP para a envolver os membros da Associação nas ações e nos resultados alcançados produziram resultados efetivos, incrementando a participação efetiva destes nos Venture Fóruns, nas bancas de seleção e treinamento dos empresários e nos eventos de sensibilização regionais, recebendo inclusive oferecimentos voluntários de participação.

VI- Aspectos Financeiros

O primeiro desembolso foi realizado em outubro de 2012, por um total de USD 99.991,81, o que representa 10,8% do valor total da Contribuição do FUMIN. Restando USD 825.715,19 a serem desembolsados.

VII- Externalidades e impactos

O projeto está acima da pontuação média do FUMIN(2.529) e se encontra em status satisfatório: 2.701.

VIII- Riscos

O nível de risco do projeto é baixo. De um total de 13 riscos identificados, há 10 riscos vigentes, 1 risco não vigente e 2 riscos mitigados.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Aprimorar o ecossistema de capital semente e empreendedor (VC) através de maior disponibilidade de dados sobre a indústria, do aumento de oportunidades de treinamento e networking para players locais, de iniciativas para eliminação de gargalos regulatórios e do fortalecimento de instituições locais capazes de catalisar esses aprimoramentos. O projeto também visará a transferência de competências a outros ecossistemas de capital semente e VC menos desenvolvidos na região da América Latina.	P.I1 Número de pequenas e médias empresas que participaram em eventos sobre capital semente e empreendedor patrocinados pelo proyecto reciben investimentos.	10 Mar 2015	5 Mar 2014		20 Mar 2016	1 Mar 2013	
	P.I2 Valor dos novos investimentos canalizados para pequenas e médias empresas em eventos sobre capital semente e empreendedor patrocinados pelo projeto.	0 Mar 2012	20000000 Mar 2014	40000000 Mar 2015	63000000 Mar 2016	0	
	P.I3 Número de associações de capital empreendedor que amplia sua oferta de serviços.	0 Mar 2012			1 Mar 2016	0	
	P.I4 Número de regulamentos vigentes ou sob consideração por parte dos organismos normativos pertinentes como resultado dos estudos ou propostas apresentadas no marco do projeto.	0 Mar 2012			1 Mar 2016	1 Jul 2012	
	P.I5 Número de GP que adotam o código de autorregulação para seus fundos de capitais semente, empreendedor e privado.	0 Mar 2012	20 Mar 2014	40 Mar 2015	60 Mar 2016	1 Mar 2012	
	P.I6 Percentual de incremento do número de associados da ABVCAP.	100 Mar 2012	110 Mar 2014	140 Mar 2015	150 Mar 2016	0	
	P.I7 Percentual do custo total da ABVCAP coberto por receitas próprias, incluídas as cotas de seus afiliados.	25 Mar 2012	40 Mar 2014	60 Mar 2015	90 Mar 2016	1 Mar 2012	
	P.I8 Número de LP locais têm acesso a investidores internacionais como resultado de eventos patrocinados pelo projeto.	20 Mar 2015	10 Mar 2014		30 Mar 2016	0	
	P.I9 Número de instituições sediadas fora do Brasil que utiliza o toolkit da ABVCAP para a gestão e o desenvolvimento de associações de capital empreendedor.	0 Mar 2012			1 Mar 2016	0	
Componente 1: Melhorar o acesso a informações sobre a indústria Peso: 15% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1 Número de sites de capital empreendedor e capital privado reconfigurados.	0 Mar 2012			1 Mar 2013		Dic 2012
	C1.I2 Número de publicações anuais.	0 Mar 2012	1 Mar 2014	2 Mar 2015	3 Mar 2016		Dic 2012
	C1.I3 Número de publicações trimestrais sobre o setor.	0 Mar 2012	4 Mar 2014	8 Mar 2015	12 Mar 2016		Dic 2012
	C1.I4 Número de censos de capital semente, empreendedor e privado realizados.	0 Mar 2012	1 Sep 2013		2 Mar 2015		Dic 2012
	C1.I5 Número de documentos de pesquisas ou manuais sobre o setor.	0 Mar 2012	1 Mar 2013	2 Mar 2014	3 Mar 2015	4 Mar 2016	Dic 2012

C1.16 Número de bases de dados internacionais de Limited Partners.	0				1		
	Mar 2012				Sep 2013	Dic 2012	
Componente 2: Desenvolver as competências dos participantes da indústria Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11 Número de conferências anuais realizadas sobre capital semente, empreendedor e privado com um mínimo de 500 participantes.	0	1	2	3	4	1
		Mar 2012	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Abr 2012
	C2.12 Número de fóruns empresariais com um mínimo de 320 participantes realizados.	0	1	2	3	4	3
		Mar 2012	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Dic 2012
	C2.13 Número de seminários trimestrais realizados com um mínimo de 50 participantes.	0	4	8		12	1
		Mar 2012	Mar 2014	Mar 2015		Mar 2016	Nov 2012
	C2.14 Número de mesas redondas de LP/GP com um mínimo de 50 participantes	0	3	6		9	
		Mar 2012	Mar 2014	Mar 2015		Mar 2016	Dic 2012
	C2.15 Número de eventos institucionais realizados com um mínimo de 80 participantes.	0	1	3	5	7	2
		Mar 2012	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Nov 2012
	C2.16 Número de eventos de promoção de investimentos com uma cobertura mínima de 50 investidores potenciais por evento	0	2	4	6	8	1
		Mar 2012	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Dic 2012
	C2.17 Número de pequenos e médios empresários capacitados sobre capital empreendedor e capital privado em programas de capacitação.	0	100	200	300	400	137
		Mar 2012	Mar 2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Sep 2012
Componente 3: Influenciar o ambiente regulatório Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.11 Número de estudos publicados contendo propostas sobre temas jurídicos e normativos.	3	1			5	1
		Mar 2015	Mar 2014			Mar 2016	Jul 2012
	C3.12 Número de cartilhas de melhores prática para o setor de capital semente, empreendedor e privado produzidas.	0				1	
		Mar 2012				Mar 2016	Dic 2012
Componente 4: Fortalecer as instituições estratégicas para o desenvolvimento do ecossistema de capital semente e VC/PE Peso: 35% Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.11 Número de novas estratégias institucional e de comunicação lançadas.	0				1	
		Mar 2012				Mar 2013	Dic 2012
	C4.12 Número de mecanismos de autosustentabilidade estabelecidos ou reestruturados.	0				1	
		Mar 2012				Mar 2016	Dic 2012
	C4.13 Número de escritórios prestando serviços na área de São Paulo	0				1	1
		Mar 2012				Mar 2013	Ago 2011
Componente 5: Transferir conhecimento para instituições da América Latina Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C5.11 Número de toolkits elaborados para associações de capital empreendedor.	0				1	
		Mar 2012				Mar 2015	Dic 2012
	C5.12 Número de memorando de entendimentos subscritos ente a ABVCAP e outras associações de capital empreendedor para a transferência de conhecimentos.	0				3	
		Mar 2012				Mar 2013	Dic 2012
	C5.13 Número de intercâmbios patrocinados.	0				3	
		Mar 2012				Mar 2013	Dic 2012
	C5.14 Número de estratégias formuladas de integração regional.	0				1	
		Mar 2012				Mar 2014	Dic 2012
	C5.15 Número de eventos regionais para difundir a a conhecer la experiencia e o toolkit da ABVCAP	0	1			2	
		Mar 2012	Sep 2013			Mar 2014	Dic 2012

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	6	Sep 2012	6	Sep 2012	Logrado tarde
H1 Número de Websites de capital semente e VC/PE lançados.	1	Mar 2013	0	Dic 2012	
H2 Número de escritórios adicionais oferecendo serviços na área de São Paulo.	1	Mar 2013	1	Ago 2011	Logrado
H3 [*] Número de novas estratégias institucionais e de comunicações em implementação.	1	May 2013	0	Dic 2012	
H4 Número de intercâmbios apoiados	2	Sep 2013	0	Dic 2012	
H5 Número de bases de dados internacionais de Limited Partners criadas.	1	Sep 2013	0	Dic 2012	
H6 Número de Venture Forums com pelo menos 160 participantes.	2	Sep 2013	1	Abr 2012	
H7 Número de Seminários Trimestrais com pelo menos 250 participantes.	5	Mar 2014	2	Nov 2012	
H8 Número de papers de pesquisa ou manuais sobre a indústria produzidos.	1	Mar 2014	0	Dic 2012	
H9 Número de eventos regionais disseminando a experiência da ABVCAP e toolkits para a indústria de VC.	2	Sep 2014	0	Dic 2012	
H10 Número de estudos ou propostas sobre questões legais ou regulatórias publicados.	2	Sep 2014	1	Jul 2012	
H11 Número de PMEs que participaram em eventos Seed e VC/PE apoiados pelo projeto que receberam investimentos.	10	Sep 2014	0	Dic 2012	
H12 Número de toolkit para Associações de VC desenvolvidos.	1	Mar 2015	0	Dic 2012	
H13 Número de papers ou manuais sobre a indústria foi produzido.	3	Sep 2015	0	Dic 2012	
H14 Número de PMEs que participaram em eventos Seed e VC/PE apoiados pelo projeto que receberam investimentos.	18	Sep 2015	0	Dic 2012	
H15 Número de guias de melhores práticas para Seed e VC/PE foi produzidas.	1	Mar 2016	0	Dic 2012	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Os membros da ABVCAP apresentam baixa receptividade e motivação para pagar por novos serviços.	Bajo	-Desenvolvimento de ações de comunicação estratégica para que os membros possam melhor enxergar os benefícios e o valor da representatividade da ABVCAP. O Plano de Comunicação Estratégica acaba de ser concluído e as ações serão implementadas.	Invitado Proyecto
2. Outras instituições da América Latina e do Caribe apresentam baixo nível de receptividade e disposição em cooperar com	Bajo	- Workshop de avaliação a ser promovido em setembro de 2013. A ABVCAP é frequentemente procurada por instituições similares da região em busca do conhecimento das experiências da Associação, de	Invitado Proyecto

ABVCAP.		seus membros e de suas iniciativas. O workshop visa reunir e sistematizar essa experiência, confrontando-a com as expectativas e necessidades das demais instituições da região, de maneira a produzir acordos de cooperação e um toolkit adequado a essas necessidades	
3. As ferramentas oferecidas são de baixa relevância utilizadas marginalmente pelas instituições de capital empreendedor.	Bajo	- A ABVCAP realizará em setembro de 2013 workshop de avaliação com entidades regionais. O workshop visa a avaliar o estágio de desenvolvimento, as expectativas e necessidades das demais instituições da região, de maneira a produzir acordos de cooperação e um toolkit adequado a essas necessidades	Invitado Proyecto
4. Reduzido nível de desenvolvimento de mercados de capital semente, empreendedor e privado em países vizinhos.	Bajo	-Workshops e produção de material com cases, toolkits e experiência brasileira para que sirvam de modelo às instituições da região	Invitado Proyecto
5. As instituições governamentais e regulatórias apresentam reduzido interesse em promover o setor de capital semente, por insuficiente embasamento de estudos e propostas apresentadas.	Bajo	- A ABVCAP está aprimorando sua base de dados (ABVCAPDATA) para dela extrair estudos e pesquisas de qualidade. A parceria com a KPMG, firmada para a divulgação dos dados da indústria no Congresso 2013 foi o primeiro passo para geração de dados com qualidade e confiabilidade. Paralelamente, enfatiza-se o trabalho de aproximação com entidades governamentais de fomento à indústria de VC/PE, como FINEP, BNDES, ABDI, via convênios para realização dos Venture Foruns e divulgação da indústria de VC/PE, assim como divulgação dos programas de fomento existentes entre os associados da ABVCAP. Participação de representantes da ABVCAP em programas de fomento às pequenas e médias empresas desenvolvidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.	Invitado Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 13 RIESGOS VIGENTES: 10 RIESGOS NO VIGENTES: 1 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

No âmbito da sustentabilidade do projeto e da ABVCAP como um todo, cumpre destacar a atração dos membros da Associação para as ações do projeto e os resultados alcançados com essa participação ativa. Além de um processo de maior aproximação e potencialização dos resultados, os membros passaram a sentir que tem um papel importante na evolução da Associação. Esse resultado fica claro nos Venture Foruns, em que os membros hoje se apresentam para colaborar nas bancas de seleção e treinamento dos empresários, assim como nos próprios eventos de sensibilização realizados regionalmente, no qual temos recebido inúmeros oferecimentos voluntários de participação.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Sustainability	Autor
1. No âmbito da sustentabilidade do projeto e da ABVCAP como um todo, cumpre destacar o empenho para atração dos membros da Associação nas ações do projeto e os resultados alcançados com essa participação ativa. Além de um processo de maior aproximação e potencialização dos resultados, os membros passaram a sentir que tem um papel importante na evolução da Associação. Esse resultado fica claro nos Venture Foruns, em que os membros hoje se apresentam para colaborar nas bancas de seleção e treinamento dos empresários, assim como nos próprios eventos de sensibilização realizados regionalmente, no qual temos recebido inúmeros oferecimentos voluntários de participação.		Abreu, Angela Ximenes
