



Operation Number: **PR0146**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**
Last Update: **10/13/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/16/2014**
Division Chief validation date: **11/07/2014**
Country Representative validation date: **11/11/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strengthening the Judiciary System	Loan Number:	1723/OC-PR,1723/OC-PR-DE
Executing Agency (EA):	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ,CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		
Team Leader:	Feliciangeli,Eduardo	Sector/Subsector:	MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PARAGUAY
Borrower:	REPUBLICA DE PARAGUAY ,REPUBLICA DE PARAGUAY		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PR0146	\$6,305,000.00	\$6,305,000.00	\$2,513,000.00	\$0.00	\$8,818,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PR0146	\$6,305,000.00	\$1,675,575.71	26.58%	\$4,629,424.29


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

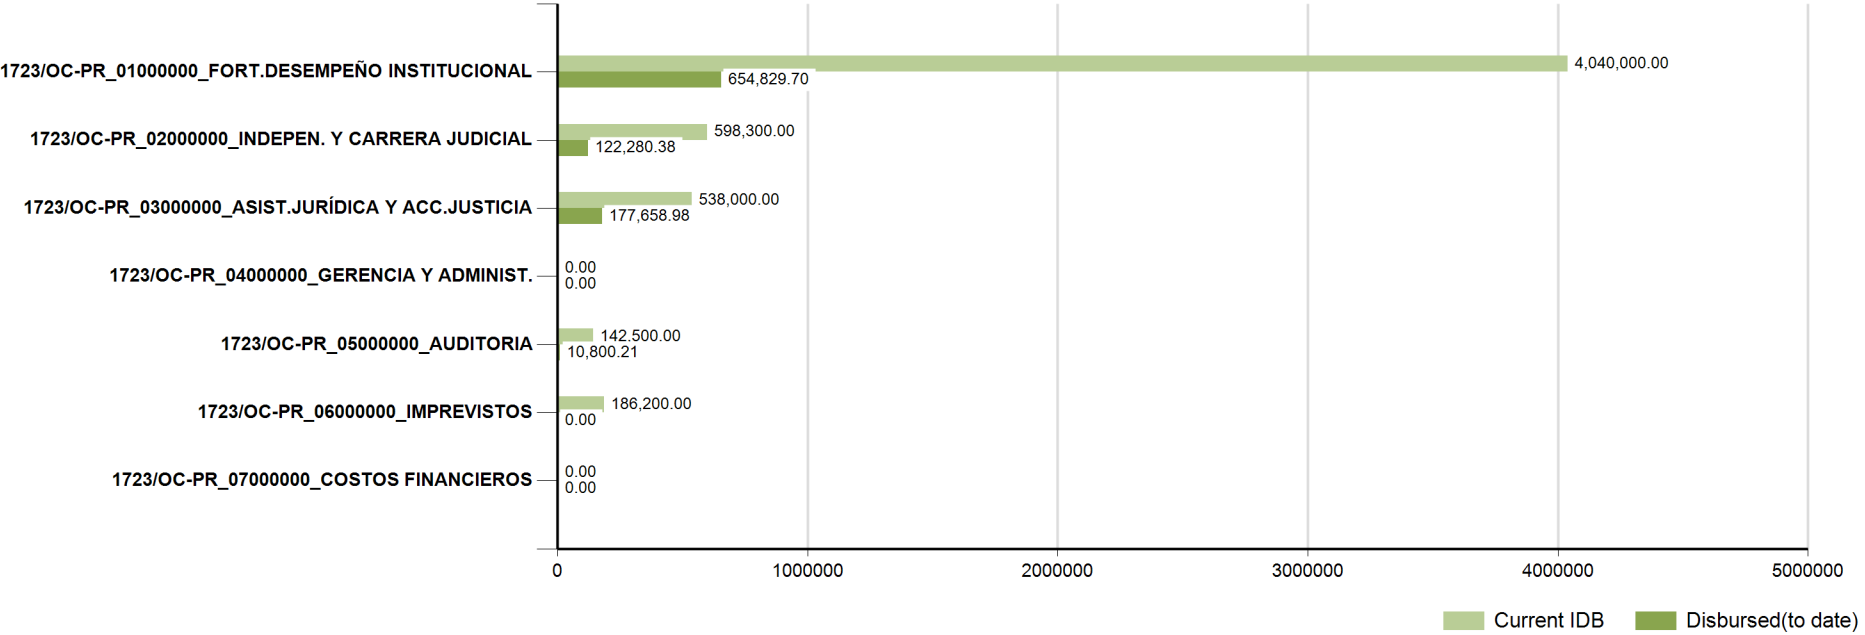

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Sistema de Justicia más confiable e independiente.						
Observation:	Las instituciones del sistema de justicia que cuentan con el apoyo del programa son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de la Defensa Pública.						
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP
1.1 Nivel de percepción sobre la confianza de la ciudadanía paraguaya hacia el sistema de justicia.		Indice de percepción de confianza.	20.00	2004	Informe Anual Organización Latino Barómetro.		P30.00
							P(a)30.00
							A

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Eficiencia operativa de la Corte Suprema de Justicia mejorada.												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2012	2013	2014	2015	EOP	
1.1 Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelación y Salas de la Corte Suprema de Justicia operan con Sistema de Gestión Jurisdiccional.		Porcentaje de Juzgados	42.00	2008	Sistema de Gestión Jurisdiccional - SGJ.		P		50.00		60.00		70.00
							P(a)		50.00		60.00		70.00
							A		22.00				
1.2 Duración media de tiempos procesales en órganos judiciales dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional en el fuero Civil de Asunción.		Años	3.80	2008	Estudio comparativo o duración media tiempos procesos jurisdiccionales, elaborado por la Corte Suprema de Justicia.		P		2.60	2.00		1.60	
							P(a)		2.60	2.00		1.60	
							A		2.50	2.00			

1.3 Stock de causas pendientes en despachos de órganos judiciales dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional.		Causas	29,982.00	2009	Informes estadísticos vinculados y generados a partir del análisis de los datos del Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia.		P			23,985.00			23,985.00
							P(a)			23,985.00			23,985.00
							A			21,341.00			

Outcome:

2 Gestión del Sistema de Justicia mejorada.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010		2012	2013	2014	2015	EOP
2.1 Sistema de selección de ministros, jueces, fiscales y defensores públicos elaborado, informatizado y en uso por el Consejo de la Magistratura.		Sistema	0.00	2008	Informe de evaluación intermedia del programa.		P		1.00				1.00
	P(a)							1.00				1.00	
	A							1.00					
2.2 Nuevo modelo de gestión académica instalado para la capacitación de los postulantes de la Escuela Judicial (EJ).		Modelo de gestión.	0.00	2008	Informe de evaluación intermedia del programa.		P		1.00				1.00
	P(a)							1.00					1.00
	A												
2.2 Causas concluidas a través de la creación, implementación, de mecanismos alternativos de conclusión del proceso penal.		Causas	218.00	2013	Evaluación final del programa		P						
	P(a)											348.00	348.00
	A												

Outcome:

3 Acceso a la justicia mejorados.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2012	2013	2014	2015	EOP
3.1 Defensores públicos realizan su trabajo en el Sistema de Gestión de la Defensa Pública - SGDP.		Defensores	0.00	2008	Informe sobre funcionamiento del Sistema de Gestión de la Defensa Pública.		P			20.00		54.00
							P(a)			20.00	20.00	54.00
		Defensores	0.00	2008	Informe del Ministerio de la Defensa Pública.		A					
3.2 Defensores Públicos capacitados utilizan el Sistema de Gestión de la Defensa Pública SGDP.		Defensores	0.00	2008	Informe del Ministerio de la Defensa Pública.		P			20.00	34.00	54.00
							P(a)			20.00	34.00	20.00
		Defensores	0.00	2008	Informe del Ministerio de la Defensa Pública.		A					
3.3 Juzgados de Paz disponen de Procedimientos de trabajos implementados (técnicas de conciliación y mediación - facilitadores judiciales).		Juzgados	25.00	2008	Informe final del programa elaborado por la Corte Suprema de Justicia.		P					190.00
							P(a)				50.00	140.00
		Juzgados	25.00	2008	Informe final del programa elaborado por la Corte Suprema de Justicia.		A					
3.4 Centros Penitenciarios pilotos utilizan de interconexión técnica para el enlace interinstitucional entre la Corte Suprema Justicia y el Ministerio de Justicia y Trabajo/Institutos Penales.		Centros P.	0.00	2008	Informe sobre interconexiones técnicas del Sistema de Gestión y Control Penitenciario.		P					3.00
							P(a)				3.00	3.00
		Centros P.	0.00	2008	Informe sobre interconexiones técnicas del Sistema de Gestión y Control Penitenciario.		A					
3.5 Mecanismos para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, diseñados e implementados (100 Reglas de Brasilia)		Mecanismos	3.00	2013	Evaluación final del programa		P					
							P(a)				2.00	2.00
		Mecanismos	3.00	2013	Evaluación final del programa		A					
3.6 Personas en condición de vulnerabilidad acceden a la justicia a través de mecanismos establecidos		Personas	120.00	2013	Evaluación final del programa		P					
							P(a)				500.00	500.00
		Personas	120.00	2013	Evaluación final del programa		A					

3.6 Unidad de Mediacion creada, estructurada y fortalecida operando em circuncrIPCione s		Unidades de Mediacion	10.00	2013	Evaluación Final Independie nte		P						
							P(a)					3.00	3.00
							A						

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento del Desempeño Institucional.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Propuesta de racionalizacion de ingresos judiciales implementada	Propuesta	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	480,000.00	885,000.00
		A		0.00	A	113,000.00	113,000.00
Diseño de Propuesta Metodologica de Sistematizacion de procesos de trabajo del Servicio de Asistencia Social.	Diseño	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	18,000.00	24,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Diseño de Propuesta Metodologica de Sistematizacion de procesos para Asesoría de Prueba.	Diseño	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	18,000.00	30,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Procedimientos de mecanismos alternativos de conclusion del proceso penal, elaborados.	procedimientos de trabajo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	18,000.00	30,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales, Remate Judiciales (1 por circunscripción) operando	Unidades de Servicios	P		0.00	P		0.00
		P(a)	8.00	15.00	P(a)	90,000.00	90,000.00
		A	13.00	13.00	A	0.00	0.00
Plataforma Web para el Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia desarrollada.	Plataforma Web	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	544,000.00	3,116,590.00
		A		0.00	A	94,000.00	94,000.00
Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia implantado en Secretarías de Juzgados adicionales.	Sistemas	P	87.00	250.00	P	87,000.00	1,379,130.00
		P(a)	87.00	235.00	P(a)	15,000.00	1,453,130.00
		A	29.00	117.00	A	0.00	1,426,130.00
Módulos web del Sistema de Gestión Jurisdiccional actualizados.	Módulos	P		2.00	P		99,840.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	15,840.00
		A		2.00	A	0.00	15,840.00
Marcos normativos impulsados.	Proyectos de Leyes	P		5.00	P		124,290.00
		P(a)	2.00	5.00	P(a)	0.00	90,290.00
		A		3.00	A	0.00	90,290.00
Inventario de procesos judiciales simplificables elaborados.	Inventario	P		1.00	P	1,839,000.00	1,873,950.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	36,950.00
		A		1.00	A	0.00	36,950.00
Unidad de Análisis de Estrategia (UAE) en operación.	Unidad	P	1.00	1.00	P	259,000.00	313,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	6,000.00	54,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Refuerzo de la independencia y apoyo a la Carrera Judicial.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Marcos normativos impulsados.	Marcos	P		1.00	P		150,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	57,000.00
		A		0.00	A		57,000.00
Sistema integral de capacitación para los agentes del sistema de justicia establecido y funcionando.	Sistema	P		0.00	P		200,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	47,000.00	101,000.00
		A	0.00	0.00	A	17,000.00	29,000.00
Procesos de selección de ternas a cargo del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia fortalecidos.	Procesos	P	0.00	33.00	P		178,800.00
		P(a)	0.00	33.00	P(a)	0.00	13,800.00
		A	0.00	33.00	A	8,000.00	21,800.00

Plan Estratégico de Capacitación de la Escuela Judicial con perspectiva transversal de género diseñado y consistente con el sistema integral de capacitación operando.	Plan	P		2.00	P		287,320.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	67,320.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	67,320.00
Reglamento de Selección de agentes del sistema de justicia (contemplando criterios técnicos, competitivos, de idoneidad, transparencia y de igualdad de género) aprobado por el CM.	Reglamento	P		1.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	17,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	17,000.00
Plan de Fortalecimiento Institucional desarrollado CM.	Plan	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	46,000.00	46,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plan de Capacitacion y Capacitaciones del Modelo Educacion Virtual- Presencial Implementado. CM	Numero Capacitaciones	P	20.00	40.00	P		0.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	0.00	17,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Plataforma Web para el Sistema Integral de Capacitación y Modelo Educativo Virtual - Presencial desarrollada. CM	Plataforma Web	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	14,000.00	70,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Sistema de información y gestión informatizada para el Consejo Magistratura desarrollada (DataCenter) CM	Sistema	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	27,000.00	147,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
INACTIVAR PRODUCTO - Carrera judicial fortalecida.	Carrera	P		1.00	P	70,000.00	70,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Mejora en la asistencia jurídica y en el acceso a la Justicia.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Modelo de políticas comunicacional de la CSJ elaborada e implementada	Modelo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	65,000.00	130,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Modelo del sistema de Gestion de Despachos de Jueces de Paz y Facilitadores implementado	Modelo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	72,000.00	174,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Propuesta de Procedimientos de Trabajo que incorporen la implementación de mecanismos de Justicia Restaurativa en el Sistema Penal de la Adolescencia presentado a la CSJ	Propuesta	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	18,000.00	36,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plan de Acción de políticas públicas del sistema de administración de justicia desde la perspectiva de género, disenado	Plan	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	18,000.00	24,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Operadores capacitados en la perspectiva de igualdad de genero y condiciones socio-economicas.	Operadores	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	300.00	P(a)	18,000.00	36,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Metodologia para acceso efectivo a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad disenados e implementados/ Diseño técnico del Observatorio de Justicia Penal Juvenil sobre la vigencia de las garantías penales y procesales, elaborado y difundido	Diseños	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	18,000.00	24,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Procesos de reclusos penitenciarios han sido depurados.	Procesos	P	80.00	260.00	P		57,000.00
		P(a)	80.00	200.00	P(a)	68,000.00	68,000.00
		A	0.00	40.00	A	0.00	0.00

Internos penitenciarios en los dos Centros Piloto en los que se instala el sistema (Buen Pastor y Tacumbú) tienen acceso a información sobre sus casos.	Internos	P	350.00	1,200.00	P		0.00
		P(a)	350.00	1,000.00	P(a)	10,000.00	10,000.00
		A	0.00	300.00	A	18,000.00	18,000.00
Jueces de Paz capacitados en las reformas legislativas Vigentes.	Jueces	P	90.00	260.00	P		0.00
		P(a)	90.00	200.00	P(a)	18,000.00	24,000.00
		A	70.00	90.00	A	0.00	0.00
Marco regulatorio de las nuevas competencias de los Jueces de Paz que impulse el uso más frecuente de medios alternativos de resolución de disputas aprobados.	Marco	P		1.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	12,000.00	12,000.00
		A	0.50	0.50	A	0.00	0.00
Plan Integral de Capacitación del Defensor que contemple la perspectiva transversal de género, aprobado.	Plan	P		1.50	P		0.00
		P(a)	0.50	1.00	P(a)	0.00	93,000.00
		A	0.00	0.50	A	0.00	0.00
Oficina de Servicios Comunes de Defensa Pública en funcionamiento con el Sistema de Gestión de la Defensa Pública implantado.	Oficina	P		2.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	0.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plan Estratégico del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) elaborado y aprobado en 2011	Plan	P		1.00	P	557,000.00	956,500.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	207,500.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	207,500.00
Gerencia del Proyecto.							

Other Cost			2014	Cost
Administración, auditoría e imprevistos.	P		\$287,000.00	\$1,155,980.00
	P(a)		\$243,000.00	\$1,089,980.00
	A		\$90,000.00	\$806,980.00
Costos financieros (intereses y comisiones).	P		\$341,000.00	\$433,600.00
	P(a)		\$254,000.00	\$284,600.00
	A		\$13,000.00	\$43,600.00
Total Cost			2014	Total Cost
	P		\$3,440,000.00	\$7,279,410.00
	P(a)		\$2,137,000.00	\$7,091,000.00
	A		\$353,000.00	\$3,044,410.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Unidad de Mediación creada, estructurada y fortalecida operando em circunscripciones	Create Outcome Indicator	Nuevo Resultado:Propuesta de Préstamo Párrafos 2.13; 2.16; 2.17; 2.18 JUSTIFICACION:La evolución de la Oficina de Mediación de la CSJ, que se ha convertido a una Dirección de Mediación de la CSJ, requiere del proceso de acompañamiento a partir de la estructuración de las funciones técnicas, contemplando las coordinaciones con otros organismos competentes.	5/30/2014	3/13/2014
Outcome	Personas en condición de vulnerabilidad acceden a la justicia a traves de mecanismos establecidos	Create Outcome Indicator	Nuevo Resultado:Propuesta de Préstamo Párrafos 2.6 y transversal párrafo 2.11 JUSTIFICACION: Una vez establecido el diseño de los mecanismos, los procesos para la implementación, es indispensable la realización de capacitaciones orientados a la sensibilización de los distintos operadores del servicio, con el objetivo de obtener los resultados deseados. Todo ello se logrará, por medio de la sensibilización a los funcionarios que finalmente son los que brindan atención a los justiciables.	5/30/2014	3/13/2014
Outcome	Mecanismos para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, diseñados e implementados (100 Reglas de Brasilia)	Create Outcome Indicator	Nuevo Resultados: Párrafos de la Propuesta de Préstamo 2.23 / 2.27 JUSTIFICACION:Es necesario el diseño para establecer mecanismos por medio del cual aquellas personas consideradas vulnerables tengan la posibilidad real de poder acceder a la justicia. De tal forma a que los mismos cuenten con igualdad de oportunidades, reciban un tratamiento apropiado a los efectos de que sus respectivas condiciones no constituyan impedimentos para recibir el trato justo, para el acceso efectivo a los servicios de justicia.	5/30/2014	3/13/2014

Outcome	Causas Concluidas a través de la Creación, Implementación de mecanismos alternativos de Conclusión del Proceso Penal	Create Outcome Indicator	Nuevo Resultado: Propuesta de Préstamo Párrafos 2.26 / 2.29 JUSTIFICACION: Se requiere el desarrollo de acciones técnicas tendientes a propiciar condiciones para la solución de conflictos planteados en el área penal, intensificando los mecanismos de mediación, de tal forma a lograr la conclusión de causas a través de la Mediación, todo ello apoyando los procesos de consolidación e implementación de la nueva Dirección de Mediación creada.	5/30/2014	3/13/2014
Output	Plataforma Web para el Sistema Integral de Capacitación y Modelo Educativo Virtual - Presencial desarrollada. CM	Create Output	NUEVO PRODUCTO:Párrafos 2.20 y 2.21 de la propuesta de préstamo. JUSTIFICACION: Productos Previstos en la Propuesta de Préstamos no incorporados inicialmente en el PMR. Concejo de la Magistratura.	5/22/2014	4/14/2014
Output	Plan de Capacitacion y Capacitaciones del Modelo Educacion Virtual-Presencial Implementado. CM	Create Output	Pasa de Hito a producto, precisión del nombre del producto y redefinición de cantidad de eventos.	5/22/2014	4/14/2014
Output	Plan de Fortalecimiento Institucional desarrollado CM.	Create Output	NUEVO PRODUCTO:Párrafos 2.20 y 2.21 de la propuesta de préstamo. JUSTIFICACION: Productos Previstos en la Propuesta de Préstamos no incorporados inicialmente en el PMR. Concejo de la Magistratura.	5/22/2014	4/14/2014
Output	Reglamento de Selección de agentes del sistema de justicia (contemplando criterios técnicos, competitivos, de idoneidad, transparencia y de igualdad de género) aprobado por el CM.	Create Output	Pasa de Hito a Producto.	5/22/2014	4/14/2014
Output	Metodologia para acceso efectivo a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad diseñados e implementados/ Diseño técnico del Observatorio de Justicia Penal Juvenil sobre la vigencia de las garantías penales y procesales, elaborado y difundido	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafos 2.5/2.6/2.7/2.12/2.17/2.18/2.23/2.26 de la Propuesta de Préstamo. JUSTIFICACION: Los productos que se plantean incluir, surgen a partir de las necesidades de las dependencias orgánicas de la CSJ, las cuales están por una parte sustentadas en el Plan Estratégico 2011 -2015 de Poder Judicial y que son recopiladas a partir de solicitudes efectuadas y/o pedidos formulados a la Dirección Nacional del Proyecto o en sesiones de trabajos y reuniones con las máximas autoridades institucionales, siempre y cuando se encuentran enmarcados dentro de los Objetivos del Programa.	5/22/2014	3/13/2014
Output	Operadores capacitados en la perspectiva de igualdad de genero y condiciones socio-economicas.	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafos 2.5/2.6/2.7/2.12/2.17/2.18/2.23/2.26 de la Propuesta de Préstamo. JUSTIFICACION: Los productos que se plantean incluir, surgen a partir de las necesidades de las dependencias orgánicas de la CSJ, las cuales están por una parte sustentadas en el Plan Estratégico 2011 -2015 de Poder Judicial y que son recopiladas a partir de solicitudes efectuadas y/o pedidos formulados a la Dirección Nacional del Proyecto o en sesiones de trabajos y reuniones con las máximas autoridades institucionales, siempre y cuando se encuentran enmarcados dentro de los Objetivos del Programa.	5/22/2014	3/13/2014
Output	Plan de Acción de políticas públicas del sistema de administración de justicia desde la perspectiva de género, diseñado	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafos 2.5/2.6/2.7/2.12/2.17/2.18/2.23/2.26 de la Propuesta de Préstamo. JUSTIFICACION: Los productos que se plantean incluir, surgen a partir de las necesidades de las dependencias orgánicas de la CSJ, las cuales están por una parte sustentadas en el Plan Estratégico 2011 -2015 de Poder Judicial y que son recopiladas a partir de solicitudes efectuadas y/o pedidos formulados a la Dirección Nacional del Proyecto o en sesiones de trabajos y reuniones con las máximas autoridades institucionales, siempre y cuando se encuentran enmarcados dentro de los Objetivos del Programa.	5/22/2014	3/13/2014
Output	Propuesta de Procedimientos de Trabajo que incorporen la implementación de mecanismos de Justicia Restaurativa en el Sistema Penal de la Adolescencia presentado a la CSJ	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafos 2.5/2.6/2.7/2.12/2.17/2.18/2.23/2.26 de la Propuesta de Préstamo. JUSTIFICACION: Los productos que se plantean incluir, surgen a partir de las necesidades de las dependencias orgánicas de la CSJ, las cuales están por una parte sustentadas en el Plan Estratégico 2011 -2015 de Poder Judicial y que son recopiladas a partir de solicitudes efectuadas y/o pedidos formulados a la Dirección Nacional del Proyecto o en sesiones de trabajos y reuniones con las máximas autoridades institucionales, siempre y cuando se encuentran enmarcados dentro de los Objetivos del Programa.	5/22/2014	3/13/2014
Output	Modelo del sistema de Gestion de Despachos de Jueces de Paz y Facilitadores implementado	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafos 2.5/2.6/2.7/2.12/2.17/2.18/2.23/2.26 de la Propuesta de Préstamo. JUSTIFICACION: Los productos que se plantean incluir, surgen a partir de las necesidades de las dependencias orgánicas de la CSJ, las cuales están por una parte sustentadas en el Plan Estratégico 2011 -2015 de Poder Judicial y que son recopiladas a partir de solicitudes efectuadas y/o pedidos formulados a la Dirección Nacional del Proyecto o en sesiones de trabajos y reuniones con las máximas autoridades institucionales, siempre y cuando se encuentran enmarcados dentro de los Objetivos del Programa.	5/22/2014	3/13/2014
Output	Modelo de politicas comunicacional de la CSJ elaborada e implementada	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafo 2.28 de la Propuesta de Préstamo. JUSTIFICACION: Inicialmente no se incluyó en el PMR como un producto, se agrega a efectos de reflejar lo indicado en el Marco Lógico y Propuesta de Préstamo.	5/22/2014	3/13/2014
Output	Marco regulatorio de las nuevas competencias de los Jueces de Paz que impulse el uso más frecuente de medios alternativos de resolución de disputas aprobados.	Create Output	Pasa de Hitos a Productos	5/22/2014	3/13/2014
Output	Jueces de Paz capacitados en las reformas legislativas Vigentes.	Create Output	Pasa de Hitos a Productos	5/22/2014	3/13/2014

Output	Internos penitenciarios en los dos Centros Piloto en los que se instala el sistema (Buen Pastor y Tacumbú) tienen acceso a información sobre sus casos.	Create Output	Pasa de Hitos a Productos	5/22/2014	3/13/2014
Output	Procesos de reclusos penitenciarios han sido depurados.	Create Output	Pasa de Hitos a Productos	5/22/2014	3/13/2014
Output	Oficina de Servicios Comunes de Defensa Pública en funcionamiento con el Sistema de Gestión de la Defensa Pública implantado.	Create Output	Pasa de Hitos a Productos	5/21/2014	3/13/2014
Output	Plan Integral de Capacitación del Defensor que contemple la perspectiva transversal de género, aprobado.	Create Output	Pasa de Hitos a Productos	5/21/2014	3/13/2014
Output	Plataforma para el Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia desarrollada.	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafos 2.7/ 2.12 de la Propuesta de Préstamo. JUSTIFICACION: El desarrollo y la implementación de la Plataforma web, es con el propósito de mejorar el acceso a la Justicia a las partes en el proceso, al tiempo de dotar a las Secretarías de Juzgados de una herramienta que el permita interactuar con los actores principales en el marco de un juicio. Constituyéndose en sí mismo, no solo un cambio tecnológico, sino un cambio de paradigma de la gestión.	5/21/2014	3/13/2014
Output	Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales, Remate Judiciales (1 por circunscripción) operando	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafo 2.10 de la propuesta de préstamo. JUSTIFICACION: A partir de la elevación de la Oficina a nivel de Dirección General, se requiere el apoyo técnico del Programa, para la consolidación de las oficinas dependientes y el funcionamiento de los servicios en las Circunscripciones Judiciales.	5/21/2014	3/13/2014
Output	Procedimientos de mecanismos alternativos de conclusion del proceso penal, elaborados.	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafo 2.10 de la Propuesta de Préstamo. JUSTIFICACION: Con la elaboración de procedimientos de trabajo y la optimización de los mecanismos alternativos de conclusión del proceso penal, se podrá dar soluciones a corto plazo a las causas que reúnan las condiciones legales, filtrando las causas relevantes que ameriten un tratamiento procesal penal integral.	5/21/2014	3/13/2014
Output	Diseño de Propuesta Metodologica de Sistematizacion de procesos para Asesoría de Prueba.	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafo 2.10 de la Propuesta de Préstamo. JUSTIFICACION: Al contar con las propuestas metodológicas para la Asesoría de Prueba de asistencia social, se podrá disponer de los materiales necesarios para apoyar a los Despachos Judiciales a manejar con mayor rigurosidad y control más efectivo, en materia de la aplicación de las obligaciones, reglas de conducta o promesas.	5/21/2014	3/13/2014
Output	Diseño de Propuesta Metodologica de Sistematizacion de procesos de trabajo del Servicio de Asistencia Social.	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafo 2.10 de la Propuesta de Préstamo. JUSTIFICACION: Al contar con las propuestas metodológicas para la Asesoría de Prueba de asistencia social, se podrá disponer de los materiales necesarios para apoyar a los Despachos Judiciales a manejar con mayor rigurosidad y control más efectivo, en materia de la aplicación de las obligaciones, reglas de conducta o promesas.	5/21/2014	3/13/2014
Output	Propuesta de racionalizacion de ingresos judiciales implementada	Create Output	NUEVO PRODUCTO: Párrafo 2.8 de la Propuesta de Préstamo. JUSTIFICACION: Inicialmente no se incluyó en el PMR como un producto, por lo que se agrega este producto para reflejar los costos de esta actividad, ya que en el PMR no contemplaba este producto desagregado.	5/21/2014	3/13/2014

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
