



Operation Number: **PE-L1005**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/15/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/16/2015**
Division Chief validation date: **04/20/2015**
Country Representative validation date: **04/21/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Second Phase Health Sector Reform Program - PARSalud II	Loan Number:	2092/OC-PE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD		
Team Leader:	Guanais de Aguiar,Frederico Campos	Sector/Subsector:	HEALTH SERVICES
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Fully Disbursed
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1005	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$147,400,000.00	\$15,000,000.00	\$162,400,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1005	\$15,000,000.00	\$11,492,034.00	76.61%	\$3,507,966.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

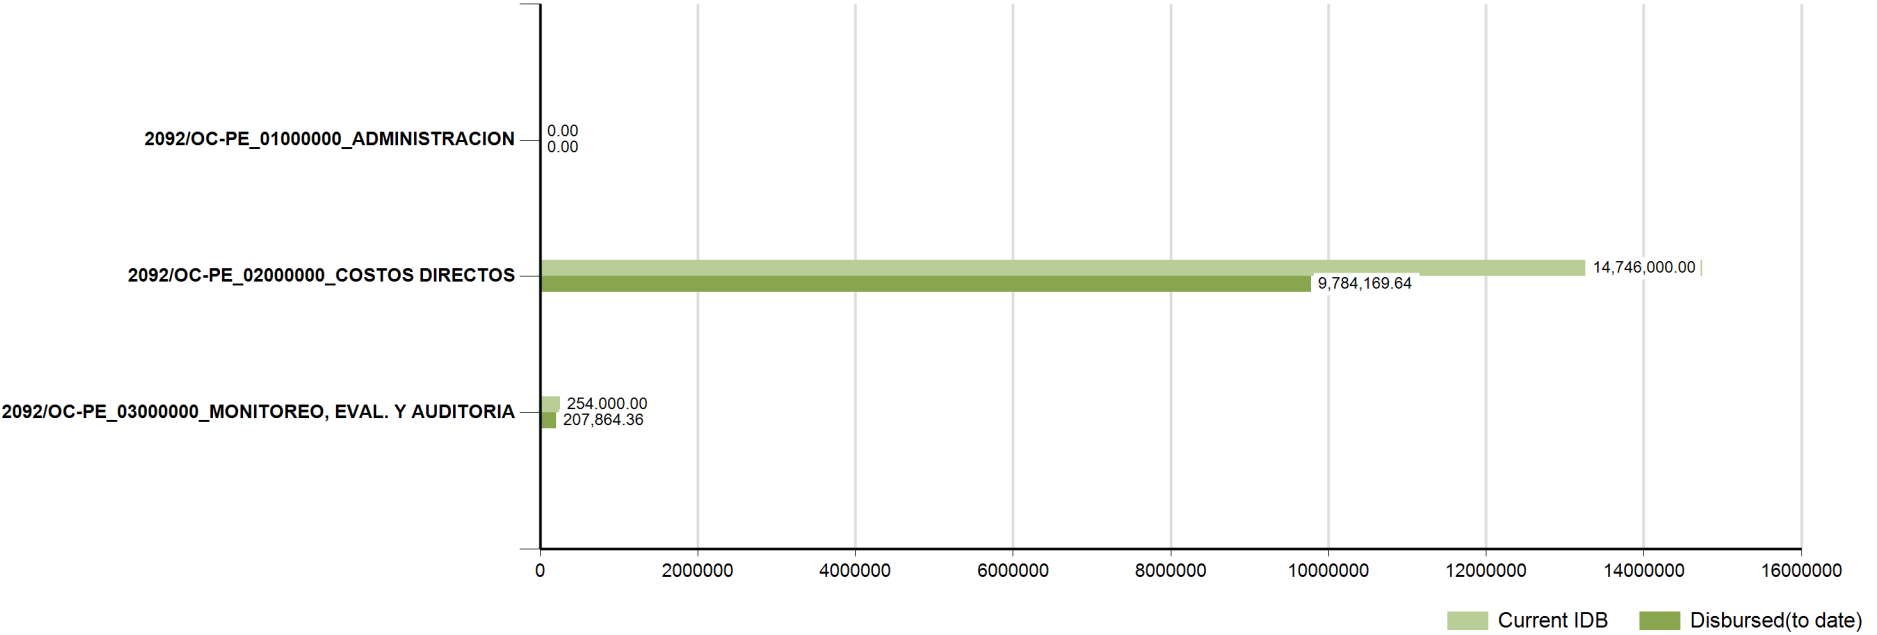

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Uso de servicios de salud materno incrementado, y morbilidad infantil de los niños y niñas menores de 3 años de familias de la zona rural de 09 regiones más pobres reducida								
Observation:	Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados de la encuesta para el 2012, los cuales se esperan para abril 2013.								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		EOP
1.1 Proporción de partos institucionales en el ámbito rural de 09 regiones más pobres		por ciento	67.10	2009	Encuesta Demografica y de Salud (ENDES)		P	74.20	79.00
							P(a)	74.20	79.00
							A	67.20	79.00
1.2 Prevalencia de anemia en menores de 3 años en el ámbito rural de 09 regiones más pobres		por ciento	58.20	2009	ENDES		P	56.80	55.20
							P(a)	56.80	55.20
							A	53.10	55.20
1.3 Prevalencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en menores de 3 años en el ámbito rural de 09 regiones más pobres		por ciento	13.70	2009	ENDES		P	13.50	11.00
							P(a)	13.50	11.00
							A	13.40	11.00

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Adecuadas prácticas y recursos de cuidados familiares y comunitarios a mujeres (gestantes, parturientas y madres en periodo de lactancia) y a niños y niñas menores de 3 años, promovidas
Observation:	Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados de la encuesta para el 2012, los cuales se esperan para abril 2013.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	EOP
1.1 Proporción de niños y niñas rurales menores de 3 años afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS)		por ciento	88.10	2009	Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)	Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados de la encuesta para el 2012.	P	91.90			95.00
							P(a)	91.90			95.00
							A	90.80			95.00

1.2 Proporción de niños rurales afiliados al SIS con Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo de acuerdo a su edad		por ciento	27.60	2009	Base de Datos del Sistema Integral de Salud (SIS)	Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a información proporcionada por el Seguro Integral de Salud (SIS) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados para el 2012.	P	57.00			67.00
						P(a)	57.00			67.00	
						A	55.40			68.20	
1.3 Proporción de gestantes rurales afiliadas al SIS que inician su atención prenatal al primer trimestre		por ciento	30.20	2008	Base de Datos SIS	Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a información proporcionada por el Seguro Integral de Salud (SIS) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados para el 2012.	P	47.30			54.60
						P(a)	47.30			54.60	
						A	65.30			70.60	

1.4 Proporción de niños menos de 6 meses con lactancia materna exclusiva		por ciento	82.20	2009	ENDES	Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados de la encuesta para el 2012, los cuales se esperan para abril 2013.	P	84.30			85.50
						P(a)	84.30			85.50	
						A	78.60			84.80	
Outcome:	2 Capacidad resolutiva de las redes de los servicios de salud para atender emergencias obstétricas, neonatales e infantiles y para la atención integral de mujeres y de niños menores de 3 años, mejorada										
Observation:											

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	EOP
2.1 Proporción de cesáreas en gestantes rurales afiliadas al SIS		por ciento	3.60	2008	Base de Datos del SIS	Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a información proporcionada por el Seguro Integral de Salud (SIS) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados para el 2012.	P	6.50			8.20
	P(a)						6.50			8.20	
	A						6.60			10.90	
2.2 Proporción de gestantes de procedencia rural, afiliadas al SIS, con pruebas de hemoglobina, orina y sífilis		por ciento	44.90	2009	Base de datos SIS	Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a información proporcionada por el Seguro Integral de Salud (SIS) 2010, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados para el 2012.	P	68.20			83.70
	P(a)						68.20			83.70	
	A						51.30			55.50	

2.3 Proporción de gestantes afiliadas al SIS, complicadas con diagnóstico Hipertensión Gestacional Grave (HIG) que reciben Sulfato de Magnesio		por ciento	39.10	2008	Base de datos SIS	Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a información proporcionada por el Seguro Integral de Salud (SIS) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados para el 2012.	P	74.40			95.00
	P(a)						74.40			95.00	
	A						46.60			95.00	
2.4 Proporción de la población rural en el ámbito del proyecto con acceso físico menor de 2 horas a un establecimiento de funciones obstétricas y neonatales básicas (FONB) o de mayor capacidad resolutive.		por ciento	55.50	2010	Dicho indicador responde a una Encuesta Ad Hoc Parsalud II del 2010, la cual no ha sido actualizada . Se espera se actualiza en el 2013	Aún no se realiza la encuesta Ad Hoc, se espera realizar en 2013.	P	76.80			79.20
	P(a)						76.80			79.20	
	A						55.50			79.20	

2.5 Razon stock/consumo promedio de suplementos de hierro/acido fólico en establecimientos I-1 y I-2		razon	4.00	2009	Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e Insumos (SISMED)	La meta final real para este indicador debe encontrarse en un rango entre 2 y 4, dependiendo del lugar y la dispersión del mismo, no se busca que esté por encima de 4 porque ello implica que el medicamento puede vencerse, tampoco menos porque implicaría	P	3.00			3.00
	P(a)						3.00			3.00	
	A						3.00			3.00	
2.6 Proporción de partos complicados entre gestantes rurales afiliadas al SIS en establecimientos I-1 en el ámbito del proyecto, atendidos en FONB o establecimientos de mayor capacidad resolutive		por ciento	49.60	2008	Base de Datos del SIS	Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a información proporcionada por el Seguro Integral de Salud (SIS) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados para el 2012.	P	60.70			65.80
	P(a)						60.70			65.80	
	A						74.60			65.80	

2.6 Personas que se benefician de un conjunto básico de servicios de salud	 RF	Individuals		2015			P				
							P(a)				4,789,238.00
							A		3,345,924.00	3,870,754.00	

Disaggregation Categories		2012	2013	2014	EOP
Individuals Indigenous receiving a basic package of health services	P				
	P(a)				1,149,417.00
	A		803,022.00	928,981.00	
Outcome:	3 Capacidad para promover la calidad y equidad del sistema de salud, fortalecida				
Observation:					

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	EOP
3.1 Proporción de hogares afiliados (pobres) al SIS que realizan gasto de bolsillo en salud por medicamentos		por ciento	62.00	2009	ENAH0	Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados de la encuesta para el 2012.	P	35.50			25.00
	P(a)						35.50			25.00	
	A						72.90			57.50	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento de la demanda		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Participantes en el Programa de Comunicación y Educación en Salud, capacitado.	persona capacitada	P		720.00	P	1,949.93	4,140,704.26
		P(a)	60.00	758.00	P(a)	2,092,137.00	4,505,426.99
		A	0.00	458.00	A	959,149.00	2,891,317.99
Establecimiento de salud con equipamiento audiovisual, instalado.	establecimiento de salud	P		1,423.00	P		1,236,925.20
		P(a)	0.00	1,423.00	P(a)	0.00	1,227,347.66
		A	0.00	1,423.00	A	0.00	1,227,347.66
Meses de Campaña por región "Nuestro Derecho a la Identidad", implementada	meses de campaña por región	P	3.00	12.00	P	71,842.19	607,542.69
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	139,711.00	262,725.35
		A	0.00	6.00	A	127,381.00	262,725.35
Fortalecimiento de la oferta		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Establecimientos de salud de la red obstétrica con infraestructura mejorada para atención materno neonatal, construida	establecimiento de salud	P		84.00	P	2,368,359.07	97,703,692.12
		P(a)	8.00	73.00	P(a)	18,015,982.00	97,310,306.80
		A	8.00	59.00	A	21,990,169.00	88,934,801.80
Establecimiento de salud de la red obstétrica con equipos médicos básicos, instalados	establecimientos de salud	P		112.00	P		29,347,300.00
		P(a)	34.00	104.00	P(a)	9,001,959.00	28,098,729.78
		A	18.00	88.00	A	12,293,140.00	25,985,835.78
Establecimientos de salud con equipos de telecomunicaciones básicos, instalados.	establecimientos de salud	P		123.00	P		2,479,245.39
		P(a)	4.00	54.00	P(a)	1,038,121.00	2,980,537.38
		A	4.00	7.00	A	354,627.00	721,395.38
Personal de salud capacitado en Atención Materno Neonatal	personas	P	81.00	674.00	P	543,274.18	5,571,175.54
		P(a)	102.00	674.00	P(a)	2,210,456.00	6,222,806.25
		A	163.00	594.00	A	1,302,426.00	4,712,877.25
Proyectos de mejora de la calidad de los servicios maternos e infantiles con inclusión de población pobre y dispersa, financiados.	proyectos	P	7.00	50.00	P	61,271.28	3,277,376.60
		P(a)	0.00	50.00	P(a)	764,268.00	1,099,163.97
		A	0.00	24.00	A	452,440.00	1,099,163.97
Personal de salud capacitado en gestión de recursos humanos y manejo de insumos	persona	P	105.00	1,143.00	P	926,968.35	5,166,830.81
		P(a)	0.00	1,336.00	P(a)	1,580,556.00	7,967,983.06
		A	0.00	1,336.00	A	566,017.00	5,095,472.06
Planes regionales de mejora de los sistemas de Referencia y Contrareferencia, elaborados	plan	P	9.00	9.00	P	33,829.79	706,773.76
		P(a)	4.00	9.00	P(a)	130,709.00	58,722.76
		A	1.00	1.00	A	0.00	35,287.76
Gobierno y financiamiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Normas y disposiciones legales para mejorar la eficiencia y equidad en el sistema de salud, propuestas	propuesta de norma	P		27.00	P	4,385.49	700,911.71
		P(a)	2.00	26.00	P(a)	569,326.00	1,394,705.95
		A	0.00	26.00	A	197,846.00	496,930.95
Sistemas de seguimiento de la regulación de la prestación y el financiamiento de salud, diseñados	sistema	P		11.00	P	4,696.46	891,221.52
		P(a)	4.00	11.00	P(a)	805,440.00	2,500,522.99
		A	0.00	7.00	A	283,764.00	796,359.99
Informes de evaluaciones periódicos del desempeño del sistema de salud, realizados.	informe de evaluacion	P	3.00	17.00	P	143,336.98	1,763,499.27
		P(a)	2.00	17.00	P(a)	453,723.00	8,736,458.35
		A	0.00	5.00	A	131,000.00	8,112,395.35
Administración							

Other Cost		2014	Cost
Unidad Coordinadora del Programa Operativa	P	\$653,187.59	\$8,789,801.13
	P(a)	\$3,101,843.00	\$16,721,644.00
	A	\$3,967,595.00	\$15,257,650.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$4,813,101.31	\$162,383,000.00
	P(a)	\$39,904,231.00	\$179,087,081.29
	A	\$42,625,554.00	\$155,629,561.29

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Normas y disposiciones legales para mejorar la eficiencia y equidad en el sistema de salud, propuestas	Modify Financial P value	Se hicieron ajustes a los datos de años anteriores: (1) modificar los progreso financieros ejecutados de 2010 a 2013 según los reportes de auditoría; (2) modificar la fila P de progreso financiero para adecuar el monto total del proyecto; y (3) ingresar en Output datos de CRF de 2013.	4/10/2015	4/15/2015
Output	Informes de evaluaciones periódicos del desempeño del sistema de salud, realizados.	Modify Financial P value	Se hicieron ajustes a los datos de años anteriores: (1) modificar los progreso financieros ejecutados de 2010 a 2013 según los reportes de auditoría; (2) modificar la fila P de progreso financiero para adecuar el monto total del proyecto; y (3) ingresar en Output datos de CRF de 2013.	4/10/2015	4/15/2015
Output	Sistemas de seguimiento de la regulación de la prestación y el financiamiento de salud, diseñados	Modify Financial P value	Se hicieron ajustes a los datos de años anteriores: (1) modificar los progreso financieros ejecutados de 2010 a 2013 según los reportes de auditoría; (2) modificar la fila P de progreso financiero para adecuar el monto total del proyecto; y (3) ingresar en Output datos de CRF de 2013.	4/10/2015	4/15/2015
Output	Normas y disposiciones legales para mejorar la eficiencia y equidad en el sistema de salud, propuestas	Modify Financial P value	Se hicieron ajustes a los datos de años anteriores: (1) modificar los progreso financieros ejecutados de 2010 a 2013 según los reportes de auditoría; (2) modificar la fila P de progreso financiero para adecuar el monto total del proyecto; y (3) ingresar en Output datos de CRF de 2013.	4/10/2015	4/15/2015
Outcome	Personas que se benefician de un conjunto básico de servicios de salud	Create Outcome Indicator	La operación contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos en el Marco de Resultados Corporativos (CRF). Motivo por lo cual, se agregó este nuevo indicador de resultados.	3/25/2015	3/25/2015
Output	Proyectos de mejora de la calidad de los servicios maternos e infantiles con inclusión de población pobre y dispersa, financiados.	Modify Physical P(a) value	En el 2014 no se obtuvo los productos planificados, los mismos se han incorporado a lo planificado para el 2015.	3/24/2015	3/25/2015
Output	Participantes en el Programa de Comunicación y Educación en Salud, capacitado.	Modify Physical P(a) value	En el 2014 no se alcanzó la meta física planificada para este producto. Por lo cual, en el 2015 se ha incrementado la meta planificada, dado que incluye lo que no se alcanzó en el 2014.	3/24/2015	3/25/2015
Output	Personas que se benefician de paquetes básicos de equipos de salud.	Delete Output	Considerando que esta operación contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos en el Marco de Resultados Corporativos (CRF). Se decidió incorporar un indicador que refleje tal contribución. Inicialmente se agregó como indicador de producto. Sin embargo, debido a que no cuenta con productos financieros asociados, se decidió eliminar e incorporar posteriormente como indicador de resultados.	3/24/2015	3/25/2015
Output	Normas y disposiciones legales para mejorar la eficiencia y equidad en el sistema de salud, propuestas	Modify Physical P(a) value	La cifra registrada anteriormente en P(a) para el 2015 fue "0". Misma que se digitó en esta oportunidad. Si bien el sistema asume que se realizó un ajuste en el P(a) para el 2015, los reportes de ambos periodos demuestran lo contrario.	3/19/2015	3/25/2015
Output	Personas que se benefician de paquetes básicos de equipos de salud.	Create Output	Considerando que esta operación contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos en el Marco de Resultados Corporativos (CRF). Se decidió incorporar un indicador que refleje tal contribución. Inicialmente se agregó como indicador de producto. Sin embargo, debido a que no cuenta con productos financieros asociados, se decidió eliminar e incorporar posteriormente como indicador de resultados.	3/19/2015	3/25/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
