

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	GU-L1022	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/21/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/21/17
<b>Last Update</b>	04/21/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/24/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Improved Access and Quality of Health and Nutrition Services - Phase I	<b>Loan Number</b>	2328/BL-GU
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	SA-SER - HEALTH-HEALTH SERVICES
<b>Team Leader</b>	PEREZ EXPOSITO,ANA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	GUATEMALA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE GUATEMALA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1022	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	8,500,000	24.29%	26,500,000
<b>Aggregated</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>24.29%</b>	<b>26,500,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

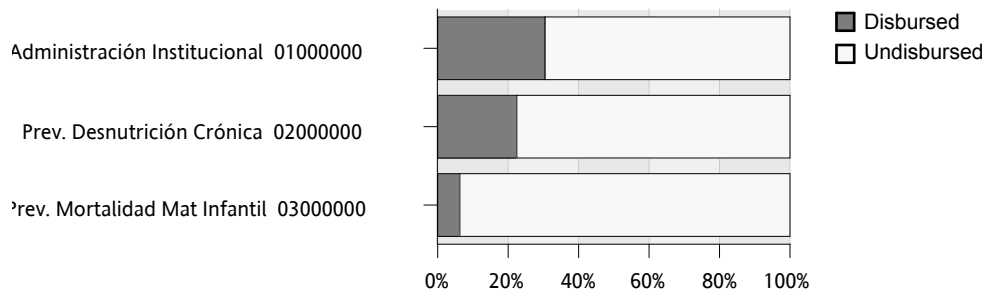

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** El acceso, la utilización y la calidad de los servicios de nutrición y salud del primer y segundo nivel de atención mejorada, en al menos 47 municipios priorizados por el programa de transferencias condicionadas.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2018
1.1	Desnutrición crónica en niños de 6 a 24 meses	%	44.5	2011	P		38.50
					P(a)		38.50
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Evaluación de Impacto

**Observations:** Población cubierta por GMI y AIMN-C fortalecido en 47 municipios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2018
1.2	Anemia en niños de 6 a 24 meses	%	65.0	2011	P		53.60
					P(a)		53.60
					A		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Evaluación de Impacto

**Observations:** Población cubierta por GMI y AIMN-C fortalecido en 47 municipios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2018
1.3	Anemia en mujeres embarazadas y lactantes	%	22.0	2011	P		18.20
					P(a)		18.20
					A		

#### Details

**Means of verification:** ENSMI 2008 y siguientes ENSMI

**Observations:** Población en 47 municipios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Acceso y cobertura de los servicios de salud del primer nivel de atención en énfasis en nutrición preventiva

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.1	Embarazadas con al menos dos controles por médico o enfermera profesional del GMI y uno en el último trimestre	%	0.0	2011	P	15.00	22.00	30.00		30.00
					P(a)	15.00	22.00	30.00		30.00
					A	0.00	64.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de información MSPAS

**Observations:** Mujeres embarazadas en comunidades cubiertas por GMI en los 47 municipios priorizados

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.2	Recién nacidos con un control médico en los primeros 28 días de nacido por equipo GMI	%	0.0	2011	P	20.00	30.00	40.00		40.00
					P(a)	20.00	30.00	40.00		40.00
					A	0.00	52.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información MSPAS

**Observations:** Poblacion cubierta por GMI y AIMN-C fortalecido en 47 municipios

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.1	Embarazadas captadas antes de 12 semanas de embarazo por equipo GMI	%	0.0	2011	P	11.00	16.00	21.00		21.00
					P(a)	11.00	16.00	21.00		21.00
					A	0.00	64.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de información MSPAS

**Observations:** Mujeres embarazadas en comunidades cubiertas por GMI en los 47 municipios priorizados

<b>Pro-Gender</b>	Yes	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
1.3	Niños menores de 12 meses con esquema de inmunización completa según la norma entregado	%	0.0	2011	P	40.00	60.00	80.00		80.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.3	por equipo GMI	%	0.0	2011	P(a)	40.00	60.00	80.00		80.00
					A	0.00	75.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información MSPAS

**Observations:** niños menores de 12 meses en comunidades cubiertas por GMI en los 47 municipios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Calidad de los servicios de salud del primer nivel de atención con énfasis en nutrición preventiva

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.1	Niños entre 6 y 59 meses atendidos por GMI que reciben micronutrientes espolvoreados de acuerdo a la norma	%	0.0	2011	P	40.00	60.00	80.00	80.00
					P(a)	40.00	60.00	80.00	80.00
					A	0.00	64.00	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información MSPAS

**Observations:** Población cubierta por GMI y AIMN-C en 47 municipios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.1	Niños de 12 a 24 meses suplementados con dosis de Vitamina A a partir de los 12 meses de edad atendidos por GMI	%	0.0	2011	P	35.00	50.00	70.00	70.00
					P(a)	35.00	50.00	70.00	70.00
					A	0.00	63.00	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información MSPAS

**Observations:** Población cubierta por GMI y AIMN-C en 47 municipios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
2.2	Facilitadores institucionales GMI capacitados que pesan de acuerdo a la norma	%	0.0	2014	P		50.00		50.00
					P(a)		50.00	50.00	50.00
					A		85.00	0.00	

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Evaluación de Proceso AIMN-C y GMI

**Observations:** Personal técnico de los GMI en los 47 municipios priorizados

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3:** Fortalecimiento del sistema de información en salud

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
3.1	Puestos de Salud que recibieron 2 visitas de supervisión en los últimos 6 meses	%	0.0	2011	P		70.00			70.00
					P(a)		70.00	70.00		70.00
					A		100.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Encuesta equipo Monitoreo y Evaluación del Proyecto

**Observations:** 47 municipios priorizados

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	EOP 2018
3.1	Jurisdicciones del PEC y GMI que recibieron 2 visitas de supervisión en los últimos 6 meses	%	0.0	2014	P		70.00			70.00
					P(a)		70.00	70.00		70.00
					A		86.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de Proceso AIMN-C y GMI

**Observations:** 47 municipios priorizados

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Mejoramiento del acceso y calidad de los servicios del primer nivel de atención

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	Población atendida por servicios de salud del primer nivel (beneficiarios directos)	Beneficiaries (#)	P		0		0
			P(a)		600,000		10,620,803
			A				0
1.2	Puestos de Salud construidos y equipados	Puestos de salud	P	8	8	1,700,000	1,700,000
			P(a)	0	0	460,000	6,794
			A	0	0	6,794	6,794
1.3	Puestos de salud remozados	Puestos de salud	P	47	47	2,500,000	2,500,000
			P(a)	25	27	1,100,000	1,059,110
			A	0	0	38,550	38,550
1.4	Servicios de salud del primer nivel de atención dotados con equipamiento y mobiliario	Servicios de salud	P		0		0
			P(a)		61		175,306
			A		0		0
1.5	Auxiliares de enfermería comunitarios dotados con equipo médico básico	Auxiliares de enfermería	P		0		0
			P(a)		283		31,075
			A		0		0
1.6	Kits de equipo para la implementación de huertos medicinales entregados en los Servicios de Salud	Kits de equipo	P		0		0
			P(a)		283		20,215
			A		0		0

## Component Nbr. 2 Mejoramiento de los servicios de nutrición preventiva

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.3	Niños entre 0 y 24 meses de edad que ingresan al programa de monitoreo de crecimiento en los 17 municipios priorizados en Huehuetenango y San Marcos	Niños	P		0		0
			P(a)		38,747		199,388
			A		0		0
2.4	Mujeres embarazadas que recibieron suplemento de hierro y ácido fólico	Mujeres embarazads	P		0		0
			P(a)		35,670		633,725
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Gestión del desarrollo del recurso humano en nutrición y salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.2	Auxiliares de enfermería comunitarias que finalizan la formación descentralizada en las sedes cubiertas por el proyecto	Auxiliares de enfermería	P		0		0
			P(a)		1,000		1,645,611
			A		0		0
3.3	Recurso humano que completa el Diplomado del Modelo Incluyente en Salud (MIS)	Personas	P		0		0
			P(a)		400		235,880
			A		0		0
3.4	Documento propuesta para modificar el Reglamento Orgánico Interno del MSPAS	Documento	P		0		0
			P(a)		1		25,974
			A		0		0
3.5	Documento propuesta para modificar el Manual de Organización y Funciones del MSPAS	Documento	P		0		0
			P(a)		1		25,974
			A		0		0
3.6	Documento propuesta para el Reglamento de la Red de Servicios de Salud	Documento	P		0		0
			P(a)		1		25,974
			A		0		0
3.7	Documento propuesta de mecanismos de gestión de recursos humanos y calidad de la atención	Documento	P		0		0
			P(a)		1		500,000
			A		0		0
3.8	Documento de sistematización del proceso de dotación y permanencia del personal en los servicios de salud	Documento	P		0		0
			P(a)		1		31,169
			A		0		0

#### Component Nbr. 4 Fortalecimiento de los sistemas de información y de la capacidad de supervisión y monitoreo del MSPAS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
4.3	Territorios que reportan la producción de servicios de salud a través del sistema de información	Territorios	P		0		0
			P(a)		499		2,685,292
			A		0		0
4.4	Sectores que reciben asistencia técnica por parte del Equipo de Apoyo al Primer Nivel de Atención	Sectores	P		0		0
			P(a)		1,714		1,724,040
			A		0		0
4.5	Documento propuesta para el Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Supervisión del Primer y Segundo Nivel de Atención	Documentos	P		0		0
			P(a)		1		25,722
			A		0		0
4.6	Unidad Central de Sistemas de Información Gerencial en Salud (SIGSA) dotada con equipo y capacitada para acceso remoto y resguardo de base de datos del Sistema	Unidades	P		0		0
			P(a)		1		2,827,382
			A		0		0
4.7	Evaluación de Impacto	Evaluaciones	P		0	300,000	900,000
			P(a)		1		205,000
			A		0		0

#### Other Cost

Administración, Auditoría e Imprevistos	P			2,215,000	5,631,000
	P(a)			2,671,460	6,902,901
	A			223,582	773,394

Total Cost

	Total Cost	P			15,390,484.32	35,000,000.06
		P(a)			10,767,774.32	35,000,000.42
		A			819,507	6,211,403.42



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Población cubierta por Grupos Móviles Institucionales GMI (beneficiarios-año)	Modify Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMIs e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Con el fin de ajustar la nueva planificación con productos y montos, se han inactivado productos para incluir otros que reflejan mejor la planificación actual. Adicionalmente se han borrado productos que fueron erróneamente cargados en el PMR e ingresado productos que debieron estar incluidos en un principio. Este reordenamiento implica un reordenamiento financiero que requiere de la reconstrucción del plan financiero original. Para este producto se reconstruyó la P original a partir del cuadro de costos original en el que la provisión de servicios de nutrición y salud estaba dividida entre el componente 1 y el componente 2 y no solamente en el componente 1 como se cargó originalmente en el PMR. (Cuadro de costos detallado original; hoja costos componente 1, fila 6; hoja de costos componente 2, fila 6).	04/18/2017	03/02/2017
Output	Auxiliares de enfermería comunitarias que finalizan la formación descentralizada en las sedes cubiertas por el proyecto	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMIs e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Número de niños en comunidades cubiertas por AIMN-C fortalecido bajo estrategia GMI (en miles)	Modify Output	Este indicador está incluido en la Matriz de Resultados original y debió de haber sido cargado en el PMR. Se reconstruyó el valor de P a partir de la Matriz de Resultados aprobada, componente 2, indicador de producto 2.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Áreas de salud con conectividad de unidades de prestación de servicios	Reassign Output	Producto cargado en el componente erróneo. Se asignó al componente correspondiente de acuerdo al POD aprobado.	03/31/2017	03/02/2017
Output	Niños entre 0 y 24 meses que fueron pesados por AIMN-C la misma cantidad de veces como meses en edad menos uno	Modify Output	Este indicador está incluido en la Matriz de Resultados original y debió de haber sido cargado en el PMR. Se reconstruyó el valor de P a partir de la Matriz de Resultados aprobada, componente 2, indicador de producto 4 y utilizando como universo la suma de los productos 1 y 2.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Áreas de salud con conectividad de unidades de prestación de servicios	Modify Output	Este producto fue cargado erróneamente en el PMR original, ya que no formaba parte de la planificación original del proyecto. De acuerdo al cuadro de costos aprobado, los servicios de internet solamente se establecerían en los distritos de salud y no en las áreas de salud. Se acordó con SPD su eliminación.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Áreas de salud dotadas de infraestructura informática	Reassign Output	Producto cargado en el componente erróneo. Se asignó al componente correspondiente de acuerdo al POD aprobado.	03/31/2017	03/02/2017
Output	Número de niños en comunidades cubiertas por AIMN-C fortalecido bajo estrategia GMI (en miles)	Modify Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMIs e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). El producto fue inactivado para consolidar el reporte de los productos derivados de los servicios de nutrición en el indicador Niños entre 0 y 24 meses de edad que ingresan al programa de monitoreo de crecimiento en los 17 municipios priorizados en Huehuetenango y San Marcos. El nuevo producto refleja mejor la nueva planificación del proyecto en base al Modelo Incluyente en Salud.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Población atendida por servicios de salud del primer nivel (beneficiarios directos)	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMIs e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). El Ministerio solicitó incluir este indicador que reflejara de mejor manera la cobertura del programa y el modelo de atención que el indicador "Población cubierta por Grupos Móviles Institucionales GMI (beneficiarios-año)", el cual ha sido inactivado.	04/05/2017	03/02/2017
Output	Documento propuesta para el Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Supervisión del Primer y Segundo Nivel de Atención	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMIs e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.	03/06/2017	03/02/2017

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Construcción de unidades de manejo de desechos sólidos hospitalarios	Modify Output	Este producto fue cargado erróneamente en el PMR original, ya que la operación solamente financia actividades realizadas en el primer y segundo nivel de atención. Este producto corresponde a actividades en el tercer nivel de atención por lo que se acordó con SPD su eliminación.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Unidad Central de Sistemas de Información Gerencial en Salud (SIGSA) dotada con equipo y capacitada para acceso remoto y resguardo de base de datos del Sistema	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Auxiliares de Enfermería formadas en multiculturalismo	Reassign Output	Producto cargado en el componente erróneo. Se asignó al componente correspondiente de acuerdo al POD aprobado.	03/31/2017	03/02/2017
Output	Auxiliares de Enfermería con grado profesional	Reassign Output	Producto cargado en el componente erróneo. Se asignó al componente correspondiente de acuerdo al POD aprobado.	03/31/2017	03/02/2017
Output	Documento de sistematización del proceso de dotación y permanencia del personal en los servicios de salud	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Documento propuesta para el Reglamento de la Red de Servicios de Salud	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Puestos de Salud construidos y equipados	Modify Output	Según la planificación realizada para 2017 y dado los tiempos de ejecución del programa, ya no hay tiempo para realizar la construcción de puestos de salud, por lo que se eliminó la meta física. El equipamiento se realizará a diversos servicios de salud. Para el seguimiento de este producto se creó un nuevo indicador que refleje únicamente el equipamiento para 2017: "Servicios de salud del primer nivel dotados con equipamiento y mobiliario"	04/05/2017	03/02/2017
Output	Servicios de salud del primer nivel de atención dotados con equipamiento y mobiliario	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En el nuevo modelo de atención, el primer nivel de atención incluye puestos y otros servicios como Centros de Convergencia. Se creó un nuevo indicador que refleja el cambio en el universo de servicios de salud a equipar y amueblar (no solamente puestos): "Servicios de salud del primer nivel dotados con equipamiento y mobiliario."	04/05/2017	03/02/2017
Output	Niños entre 0 y 24 meses que fueron pesados en dos meses consecutivos en el último trimestre por AIMN-C	Modify Output	Este indicador está incluido en la Matriz de Resultados original y debió de haber sido cargado en el PMR. Se reconstruyó el valor de P a partir del cuadro de costos original, hoja costos componente 2, filas 10, 15, y 16 y dividiéndola en partes iguales entre los dos productos que miden la calidad de la provisión de los servicios de salud. Los recursos incluidos para este producto se tomaron del producto 1.1 "Población cubierta por Grupos Móviles Institucionales GMI". Esto debido a que al cargar el PMR se eliminaron los costos de los servicios de nutrición y se incluyeron como parte de los servicios de salud. De acuerdo al cuadro de costos original, estos recursos estaban separados.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Áreas de salud con conectividad de unidades de prestación de servicios	Modify Output	Este producto fue cargado erróneamente en el PMR original, ya que no formaba parte de la planificación original del proyecto. De acuerdo al cuadro de costos aprobado, los servicios de internet solamente se establecerían en los distritos de salud y no en las áreas de salud. Se acordó con SPD su eliminación.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Puestos de salud remozados	Modify Output	Se modificó la meta física según la última planificación del proyecto, realizada a partir de la aprobación extensión del Programa.	04/05/2017	03/02/2017
Output	Territorios que reportan la producción de servicios de salud a	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088).	03/06/2017	03/02/2017

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	traves del sistema de información		Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.		
Output	Niños entre 0 y 24 meses que fueron pesados en dos meses consecutivos en el ultimo trimestre por AIMN-C	Modify Output	Este indicador está incluido en la Matriz de Resultados original y debió de haber sido cargado en el PMR. Se reconstruyó el valor de P a partir de la Matriz de Resultados aprobada, componente 2, indicador de producto 3 y utilizando como universo la suma de los productos 1 y 2.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Fortalecimiento de los sistemas de información y de la capacidad de supervisión y monitoreo del MSPAS	Create Component	Este componente no fue cargado al PMR, sin embargo es parte de la Matriz de Resultados original a la aprobación del programa y corresponde a los components del Contrato de Préstamo por lo que fue incorporado al monitoreo del proyecto.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Municipios cuyos trabajadores de salud del primer nivel (institucional: GMI, puestos; comunitario: comadronas, educadores) han sido capacitados en prácticas de atención y prevención incluyendo nutrición	Reassign Output	Producto cargado en el componente erroneo. Se asignó al componente correspondiente de acuerdo al POD aprobado.	03/31/2017	03/02/2017
Output	Niños entre 0 y 24 meses que fueron pesados por AIMN-C la misma cantidad de veces como meses en edad menos uno	Modify Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMIs e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079) . El producto fue inactivado para consolidar el reporte de los productos derivados de los servicios de nutrición en el indicador Niños entre 0 y 24 meses de edad que ingresan al programa de monitoreo de crecimiento en los 17 municipios priorizados en Huehuetenango y San Marcos. El nuevo producto refleja mejor la nueva planificación del proyecto en base al Modelo Incluyente en Salud.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Municipios cuyos trabajadores de salud del primer nivel (institucional: GMI, puestos; comunitario: comadronas, educadores) han sido capacitados en prácticas de atención y prevención incluyendo nutrición	Modify Output	Se realizaron los ajustes financieros necesarios para la reconstrucción de la P original, después de la eliminación de indicadores. Para este producto la P fue reconstruidaa a partir del cuadro de costos original en el que la inversión para capacitación es mayor a lo cargado en el PMR. Cuadro de costos original, hoja costos componente 3, fila 6.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Población adicional de niños de 0 a 24 meses en comunidades cubiertas por AIMN-C fortalecido bajo estrategia de extensión vía ONGs (en miles)	Modify Output	Este indicador está incluido en la Matriz de Resultados original y debió de haber sido cargado en el PMR. Se reconstruyó el valor de P a partir de la Matriz de Resultados aprobada, componente 2, indicador de producto 1.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Áreas de salud con conectividad de unidades de prestación de servicios	Modify Output	Este producto fue cargado erroneamente en el PMR original, ya que no formaba parte de la planificación original del proyecto. De acuerdo al cuadro de costos aprobado, los servicios de internet solamente se establecerían en los distritos de salud y no en las áreas de salud. Se acordó con SPD su eliminación.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Áreas de salud dotadas	Modify	Se realizaron los ajustes financieros necesarios para la reconstrucción de la P original, después de la eliminación de indicadores. Para este	04/18/2017	03/02/2017

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	de infraestructura informática	Output	producto la P fue reconstruidaa a partir del cuadro de costos original en el que esta actividad tenía una asignación de \$181,697, mucho menor a la cargada en el PMR. Por lo tanto se extrae el monto de \$900,000, para asignarlo al producto de la evaluación.		
Output	Áreas con dotación de equipo de aire y video	Modify Output	Este producto fue cargado erroneamente en el PMR original, ya que no formaba parte de la planificación original del proyecto. Se acordó con SPD su eliminación.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Niños entre 0 y 24 meses que fueron pesados en dos meses consecutivos en el ultimo trimestre por AIMN-C	Modify Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079) . El producto fue inactivado para consolidar el reporte de los productos derivados de los servicios de nutrición en el indicador Niños entre 0 y 24 meses de edad que ingresan al programa de monitoreo de crecimiento en los 17 municipios priorizados en Huehuetenango y San Marcos. El nuevo producto refleja mejor la nueva planificación del proyecto en base al Modelo Incluyente en Salud.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Niños entre 0 y 24 meses que fueron pesados por AIMN-C la misma cantidad de veces como meses en edad menos uno	Modify Output	Este indicador está incluido en la Matriz de Resultados original y debió de haber sido cargado en el PMR. Se reconstruyó el valor de P a partir del cuadro de costos original, hoja costos componente 2, filas 10,15, y 16 y dividiéndola en partes iguales entre los dos productos que miden la calidad de la provisión de los servicios de salud. Los recursos incluidos para este producto se tomaron del producto 1.1 "Población cubierta por Grupos Móviles Institucionales GMI". Esto debido a que al cargar el PMR se eliminaron los costos de los servicios de nutrición y se incluyeron como parte de los servicios de salud. De acuerdo al cuadro de costos original, estos recursos estaban separados.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Auxiliares de Enfermería formadas en multiculturalismo	Modify Output	Este producto fue cargado erroneamente en el PMR original, ya que no formaba parte de la planificación original del proyecto. Se acordó con SPD su eliminación. La formación de auxiliares de enfermería que se incluye en el nuevo modelo de atención MIS, incluye formación en la atención intercultural de la salud y está reflejado el indicador de producto: "Recurso humano que completa el Diplomado del Modelo Incluyente en Salud (MIS)".	04/18/2017	03/02/2017
Output	Mujeres embarazadas que recibieron suplemento de hierro y ácido fólico	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Auxiliares de Enfermería con grado profesional	Modify Output	Se realizaron los ajustes financieros necesarios para la reconstrucción de la P original, después de la eliminación de indicadores. Para este producto la P fue reconstruidaa a partir del cuadro de costos original en el que la inversión para capacitación es mayor a lo cargado en el PMR. Cuadro de costos original, hoja costos componente 3, fila 6.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Documento propuesta de mecanismos de gestión de recursos humanos y calidad de la atención	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Puestos de salud rehabilitados	Reassign Output	Este producto estaba asignado a un componente equivocado. Se reasignó al componente 1 que es el que le corresponde según la Matriz de Resultados original del proyecto al momento de la aprobación.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Auxiliares de Enfermería Comunitarios dotados con equipo médico básico	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). El nuevo modelo basa la atención en salud en auxiliares de enfermería, las cuales recibirán equipamiento básico para la provisión de servicios. Se incluyó este nuevo indicador refleja esta actividad.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Niños entre 0 y 24 meses de edad que ingresan al programa de monitoreo de crecimiento en los 17 municipios priorizados en Huehuetenango y San Marcos	Create Output	Se creo el producto que debió de haber sido cargado en el PMR de acuerdo a la Matriz de Resultados original.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Construcción de unidades de manejo de desechos sólidos hospitalarios	Modify Output	Este producto fue cargado erroneamente en el PMR original, ya que la operación solamente financia actividades realizadas en el primer y segundo nivel de atención. Este producto corresponde a actividades en el tercer nivel de atención por lo que se acordó con SPD su eliminación.	04/18/2017	03/02/2017

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Documento propuesta para modificar el Reglamento Orgánico Interno del MSPAS	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Número de niños en comunidades cubiertas por AIMN-C fortalecido bajo estrategia GMI (en miles)	Modify Output	Este indicador está incluido en la Matriz de Resultados original y debió de haber sido cargado en el PMR. Se reconstruyó el valor de P a partir del cuadro de costos original, hoja costos componente 2, fila 8. Los recursos incluidos para este producto se tomaron del producto 1.1 "Población cubierta por Grupos Móviles Institucionales GMI". Esto debido a que al cargar el PMR se eliminaron los costos de los servicios de nutrición y se incluyeron como parte de los servicios de salud. De acuerdo al cuadro de costos original, estos recursos estaban separados.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Población adicional de niños de 0 a 24 meses en comunidades cubiertas por AIMN-C fortalecido bajo estrategia de extensión vía ONGs (en miles)	Modify Output	El cambio se debe a que el producto actual mide todos los habitantes de los municipios donde se esta implementado el servicio, pero dado el bajo nivel de cobertura esto no es apropiado. Se inactivó este producto y la población beneficiaria será medido con el producto Población atendida por servicios de salud del primer nivel (beneficiarios directos).	04/18/2017	03/02/2017
Output	Áreas con dotación de equipo de aire y video	Modify Output	Este producto fue cargado erroneamente en el PMR original, ya que no formaba parte de la planificación original del proyecto. Se acordó con SPD su eliminación.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Auxiliares de Enfermería formadas en multiculturalismo	Modify Output	Este producto fue cargado erroneamente en el PMR original, ya que no formaba parte de la planificación original del proyecto. Se acordó con SPD su eliminación. La formación de auxiliares de enfermería que se incluye en el nuevo modelo de atención MIS, incluye formación en la atención intercultural de la salud y está reflejado el indicador de producto: "Recurso humano que completa el Diplomado del Modelo Incluyente en Salud (MIS)".	04/18/2017	03/02/2017
Output	Recurso humano que completa el Diplomado del Modelo Incluyente en Salud (MIS)	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Kits de equipo para la implementación de huertos medicinales entregados en los Servicios de Salud	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). El nuevo modelo implementa huertos medicinales en los servicios de salud. Se incluyó este nuevo indicador refleja esta actividad.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Evaluación de Impacto	Modify Output	Este producto no fue cargado en el PMR original y es un producto de la Matriz de Resultados. Se reconstruyó el valor de P a partir del cuadro de costos original, hoja de costos componente 4, fila 38.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Auxiliares de enfermería comunitarios dotados con equipo médico básico	Modify Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). El nuevo modelo basa la atención en salud en auxiliares de enfermería, las cuales recibirán equipamiento básico para la provisión de servicios. Se incluyó este nuevo indicador refleja esta actividad.	04/05/2017	03/02/2017
Output	Sectores que reciben asistencia técnica por parte del Equipo de Apoyo al Primer Nivel de Atención	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Documento propuesta para modificar el Manual de Organización y Funciones del MSPAS	Create Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). En febrero del 2016 el Ministerio envió al Banco una nueva planificación del proyecto (IDBDOCS# 40845088). Este indicador ha sido incorporado para reflejar la nueva actividad. Las metas físicas y financieras para 2017 han sido incluidas.	03/06/2017	03/02/2017
Output	Población cubierta por Grupos Móviles Institucionales GMI (beneficiarios-año)	Modify Output	En Julio del 2016 hubo cambio de Ministro de Salud. La nueva administración informó al Banco que a partir del 2017 se iba a cambiar el modelo de provisión de servicios, quedando sin validez la atención a través de GMI's e introduciendo el Modelo Incluyente en Salud (nota enviada al Banco IDBDOCS# 40845079). El Ministerio solicitó cambiar este indicador por otro que reflejara de mejor manera la cobertura del programa y el modelo de atención. El indicador será desactivado y no habrá planificación física para 2017. el indicador que reflejará el avance de este producto sera "Población atendida por servicios de salud del primer nivel", el cual ha sido incluido en el PMR, así como su planificación física y financiera	04/05/2017	03/02/2017

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
			para 2017.		
Output	Puestos de salud con reparaciones menores realizadas	Modify Output	Este producto fue cargado erroneamente en el PMR original, ya que no forma parte de la planificación original ni en el POD ni en el cuadro de costos aprobado. Se acordó con SPD su eliminación.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Población adicional de niños de 0 a 24 meses en comunidades cubiertas por AIMN-C fortalecido bajo estrategia de extensión vía ONGs (en miles)	Modify Output	Este indicador está incluido en la Matriz de Resultados original y debió de haber sido cargado en el PMR. Se reconstruyó el valor de P a partir del cuadro de costos original, hoja costos componente 2, fila 9. Los recursos incluidos para este producto se tomaron del producto 1.1 "Población cubierta por Grupos Móviles Institucionales GMI". Esto debido a que al cargar el PMR se eliminaron los costos de los servicios de nutrición y se incluyeron como parte de los servicios de salud. De acuerdo al cuadro de costos original, estos recursos estaban separados.	04/18/2017	03/02/2017
Output	Puestos de salud remozados	Modify Output	Se modificó el nombre de "Puestos de salud rehabilitados" a "Puestos de salud remozados" para ser consistentes con el lenguaje que utiliza el Ministerio. No existe diferencia entre rehabilitar y remozar por lo que el cambio no conlleva un cambio sustancial al alcance del indicador.	03/06/2017	02/28/2017
Output	Evaluación de Impacto	Create Output	Se creó el producto que debió haber sido cargado en el PMR de acuerdo a la Matriz de Resultados original y que corresponde a la planificación 2017.	03/06/2017	03/02/2017
