

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1269	Chief of Operations Validation Date	04/10/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/11/18
Last Update	03/23/18	Country Representative Validation Date	04/12/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Modernization of Pension System Management II 2 (PROPREV II	Loan Number	2791/OC-BR
Executing Agency	MINISTERIO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	Sector/Subsector	IS-PSS - SOCIAL INVESTMENT-PENSIONS & SOCIAL SECURITY
Team Leader	CALDAS DE ANDRADE, FRANCISCO ANTONI	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1269	10,000,000	6,000,000	6,000,000	0	16,000,000	6,000,000	3,787,000	63.12%	2,213,000
Aggregated	10,000,000	6,000,000	6,000,000	0	16,000,000	6,000,000	3,787,000	63.12%	2,213,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

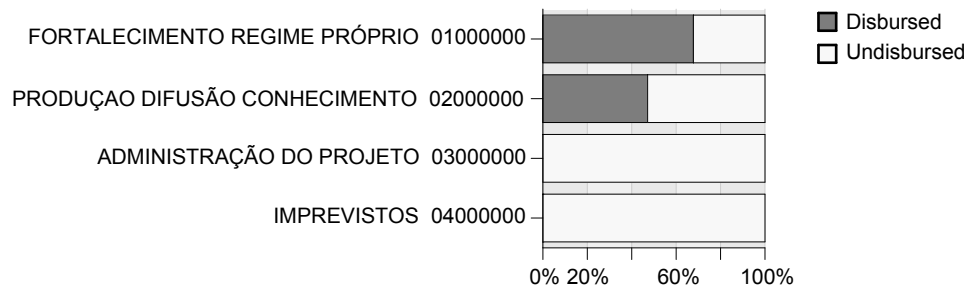

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Redução do déficit de no mínimo 50 entes federativos beneficiários do Programa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Déficit de atualização dos registros cadastrais de servidores inativos e pensionistas	R\$ milhões a preços constantes de 2010	102.90	2010	P					86.90
					P(a)					86.90
					A					

Details

Means of verification: Avaliação final independente

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Redução da inconsistência dos dados dos segurados dos RPPS

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Taxa de inconsistência	%	90.00	2010	P		30.00				30.00
					P(a)		30.00				30.00
					A			47.00			
Details											
Means of verification: Relatório Semestral											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 2: Propostas de políticas setoriais

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Proposta de política previdenciária apresentada a partir dos estudos realizados	unidade	3.00	2003	P						5.00
					P(a)					5.00	
					A			2.00			
Details											
Means of verification: Avaliação intermediária e final											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Outcome Nbr. 3: Municípios com compensação previdenciária entre entes federativos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Compensação previdenciária	Município	0.00	2010	P		45.00				45.00
					P(a)		45.00				45.00
					A						
Details											
Means of verification: Relatório Semestral											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimento dos Regimes Próprios de Previdência Social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Entes federados com registros atualizados	Ente	P		50		12,755,000
			P(a)	0	47	0	4,532,340.5
			A	0	47	0.21	4,532,340.5
1.2	Equipamentos de informática instalados	Equipamento	P		500		1,450,000
			P(a)	0	939	0	916,597.32
			A	0	939	0	916,597.32

Component Nbr. 2 Produção, Internalização e Difusão do Conhecimento para Secretaria de Pol. Prev. Social (SPPS/MPS)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Municípios com assistência técnica prestada pelos servidores temporários contratados.	Government agencies (#)	P		50		1,408,000
			P(a)	0	38	1,000,000	2,513,026
			A	1	38	842,074.06	1,978,353.28
2.2	Estudos sobre a previdência social realizados	Estudo	P		6		3,299,000
			P(a)	0	2	0	745,755.92
			A	0	2	0	745,755.92
2.3	Publicações sobre temas previdenciários	Publicação	P		6		153,000
			P(a)	3	3	152,533	39,999.26
			A	0	0	0	0
2.4	Cursos a distância realizados	Curso	P		3		199,000
			P(a)	1	1	276,903.08	348,951
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Imprevistos	P				250,000
		P(a)			100,000	249,997
		A			0	0
	Avaliações Independentes	P				53,000
		P(a)			26,666.5	53,333
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P				20,000,000
		P(a)			1,556,102.58	9,400,000
		A			842,074.27	8,173,047.02

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Gestores capacitados	Modify Output	A Coordenação do Programa encaminhou Ofício nº. SEI Nº 2/2018/CPROJ/COGPM/SPOA/SE-MF, datado de 22 de fevereiro de 2018, solicitando renúncia parcial de recursos do financiamento e de contrapartida local, no qual consta que este produto não será realizado.	03/14/2018	03/16/2018
Output	Servidores dos RPPS capacitados	Modify Output	A Coordenação do Programa encaminhou Ofício nº. SEI Nº 2/2018/CPROJ/COGPM/SPOA/SE-MF, datado de 22 de fevereiro de 2018, solicitando renúncia parcial de recursos do financiamento e de contrapartida local, no qual consta que este produto não será realizado.	03/14/2018	03/16/2018
Output	Servidores dos RPPS capacitados	Modify Output	A Coordenação do Programa encaminhou Ofício nº. SEI Nº 2/2018/CPROJ/COGPM/SPOA/SE-MF, datado de 22 de fevereiro de 2018, solicitando renúncia parcial de recursos do financiamento e de contrapartida local, no qual consta que este produto não será realizado.	03/14/2018	03/16/2018
Output	Servidores dos RPPS capacitados	Modify Output	A Coordenação do Programa encaminhou Ofício nº. SEI Nº 2/2018/CPROJ/COGPM/SPOA/SE-MF, datado de 22 de fevereiro de 2018, solicitando renúncia parcial de recursos do financiamento e de contrapartida local, no qual consta que este produto não será realizado. Este item não foi alterado.	03/14/2018	03/16/2018
Output	Gestores capacitados	Modify Output	A Coordenação do Programa encaminhou Ofício nº. SEI Nº 2/2018/CPROJ/COGPM/SPOA/SE-MF, datado de 22 de fevereiro de 2018, solicitando renúncia parcial de recursos do financiamento e de contrapartida local, no qual consta que este produto não será realizado.	03/14/2018	03/16/2018
Output	Gestores capacitados	Modify Output	A Coordenação do Programa encaminhou Ofício nº. SEI Nº 2/2018/CPROJ/COGPM/SPOA/SE-MF, datado de 22 de fevereiro de 2018, solicitando renúncia parcial de recursos do financiamento e de contrapartida local, no qual consta que este produto não será realizado. Este item não foi alterado.	03/14/2018	03/16/2018
Output	Cursos a distância realizados	Modify Output	Programa encerrará em 10 de junho de 2018 e foi realizado o replanejamento das metas financeiras do programa.	03/14/2018	03/16/2018
Output	Entes federados com registros atualizados	Modify Output	Programa encerrará em 10 de junho de 2018 e foi realizado o replanejamento das metas financeiras do programa.	03/14/2018	03/16/2018
Output	Estudos sobre a previdência social realizados	Modify Output	Programa encerrará em 10 de junho de 2018 e foi realizado o replanejamento das metas financeiras do programa.	03/14/2018	03/16/2018
Output	Municípios com assistência técnica prestada pelos servidores temporários contratados.	Modify Output	Programa encerrará em 10 de junho de 2018 e foi realizado o replanejamento das metas financeiras do programa.	03/14/2018	03/16/2018
Output	Publicações sobre temas previdenciários	Modify Output	Programa encerrará em 10 de junho de 2018 e foi realizado o replanejamento das metas financeiras do programa.	03/14/2018	03/16/2018
Output	Estudos sobre a previdência social realizados	Modify Output	Programa encerrará em 10 de junho de 2018 e foi realizado o replanejamento das metas físicas do programa.	03/15/2018	03/16/2018
