

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1051	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/30/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/07/17
<b>Last Update</b>	03/23/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/04/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Employment	<b>Loan Number</b>	2365/BL-BO
<b>Executing Agency</b>	Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social	<b>Sector/Subsector</b>	IS-EMP - SOCIAL INVESTMENT-HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	URQUIDI ZIJDERVELD,MANUEL ENRIQUE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BOLIVIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE BOLIVIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1051	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	18,562,532.98	92.81%	1,437,467.02
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	18,562,532.98	92.81%	1,437,467.02

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

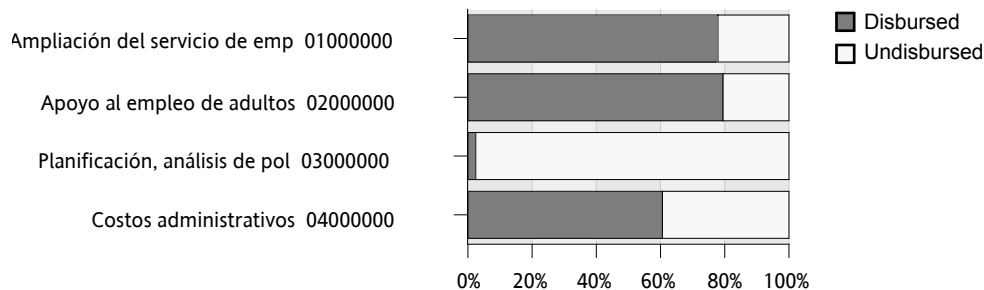

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Capacidad de diseño, ejecución, análisis y evaluación de políticas activas de empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTEPS) mejoradas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Buscadores de trabajo que son atendidos por año.	Persona	10000.0	2009	P	10,000.00	12,000.00	15,000.00	18,000.00	20,000.00		20,000.00
					P(a)	10,000.00	12,000.00	15,000.00	18,000.00	20,000.00		20,000.00
					A	10,788.00	12,261.00	14,480.00	13,172.00	23,688.00		

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.2	Vacantes que los empleadores anuncian anualmente en el servicio.	Vacante	3000.0	2008	P	3,000.00	3,500.00	4,500.00	5,500.00	6,000.00		6,000.00
					P(a)	3,000.00	3,500.00	4,500.00	5,500.00	6,000.00		6,000.00
					A	6,919.00	8,606.00	5,790.00	4,576.00	8,397.00		

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.3	Beneficiarios del programa de apoyo a adultos que obtienen empleo en relación al grupo de control	Porcentaje		2010	P							0.00
					P(a)							0.00
					A							

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de impacto

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.4	Beneficiarios del programa de apoyo de adultos del mismo perfil que obtienen un trabajo mejor remunerado con relación al grupo de control	Porcentaje		2010	P							0.00
					P(a)							0.00
					A							

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Evaluación de impacto

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.5	Beneficiarios del programa de apoyo a adultos que reducen su periodo de búsqueda de empleo con relación a personas del mismo perfil en el grupo de control	Porcentaje		2010	P							0.00
					P(a)							0.00
					A							

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de impacto

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.6	Nuevas empresas que registran sus vacantes en el sistema	Empresa	0.0	2010	P							
					P(a)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		1,000.00
					A	148.00	596.00	517.00	1,428.00	1,602.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes de sistemas del proyecto

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No
------------	--	----	---------------	--	----

**Outcome Nbr. 2:** Inserción laboral de adultos buscadores activos de empleo apoyados por el programa mejorada.

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.1	Tasa de colocación de los beneficiarios del programa de apoyo de adultos	Porcentaje	2010	P		40.00	50.00	50.00			60.00
				P(a)		40.00	50.00	50.00	60.00		60.00
				A		53.06	66.20	62.30			

#### Details

**Means of verification:** Encuestas de seguimiento al Programa

**Observations:** Financiadas por TC y contratadas por el Banco

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.2	Beneficiarios del programa de apoyo de adultos	Porcentaje	0.0	2010	P		20.00	25.00	30.00			30.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.2	que se mantienen en su empleo después de tres meses de terminado el estipendio	Porcentaje	0.0	2010	P(a)		20.00	25.00	30.00	30.00		30.00
					A		35.31	42.11	45.60			
Details												
Means of verification: Encuestas de seguimiento al Programa												
Observations: Financiadas por TC y contratadas por el Banco.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 COMPONENTE 1: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
1.1	Oficinas del servicio de empleo nacional y locales funcionando.	oficina	P		12	678,715.5	5,781,800
			P(a)	1	12	1,402,921.97	6,632,089.74
			A	2	13	1,348,400	5,309,788.03
1.2	Portal de empleo funcionando	portal	P		1	10,000	80,000
			P(a)		1	25,000	80,000
			A		1	21,965	75,964

## Component Nbr. 2 COMPONENTE 2: APOYO AL EMPLEO DE ADULTOS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
2.1	Personas beneficiadas con estipendios	Beneficiaries (#)	P	6,000	20,000	1,700,382	11,942,382
			P(a)	4,265	18,686	3,446,685.94	12,367,650.2
			A	5,554	18,326	3,715,738	10,980,695.68

## Component Nbr. 3 COMPONENTE 3 PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE EMPLEO Y EVALUACIÓN

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2017	2016	EOP 2017
3.1	Sistema de Monitoreo y Evaluación en funcionamiento.	sistema	P		1	110,000	710,000
			P(a)	1	1	478,050	259,866.76
			A	1	1	74,852	82,050

## Other Cost

	Administración del programa	P			104,954	515,304
		P(a)			109,971.84	336,041.1
		A			6,321	314,051.3
	Auditorías	P			40,000	90,000
		P(a)			24,138.61	114,352.2
		A			19,131.96	74,993.6
	Evaluación	P			100,000	300,000
		P(a)			154,227	210,000
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			2,887,565.5	20,000,000
		P(a)			5,640,995.36	20,000,000
		A			5,186,407.96	16,837,542.61

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistema de Monitoreo y Evaluación en funcionamiento.	Modify Output	Se redirigió fondos del sistema de monitoreo y evaluación a fortalecimiento de las oficinas a fin de garantizar el empalme con el Programa de Apoyo al Empleo II.	03/22/2017	03/20/2017
Output	Personas beneficiadas con estipendios	Modify Output	Debido al aumento del monto del salario mínimo el costo final de los estipendios fue más alto del esperado al inicio del programa. Gracias a algunos remanentes en el componente 2 se logró sobrepasar los 18 mil beneficiarios, meta ajustada en el presente ciclo.	03/13/2017	03/20/2017
Output	Oficinas del servicio de empleo nacional y locales funcionando.	Modify Output	Se ajustó el monto global del costo de oficinas para reflejar la ampliación del tiempo de operación necesario para el empalme con el PAE II.	03/23/2017	03/20/2017
Outcome	Beneficiarios del programa de apoyo de adultos que se mantienen en su empleo después de tres meses de terminado el estipendio	Modify Outcome Indicator	Debido a falencias del sistema de reporte del Minsiterio se acordó realizar una encuesta anual de seguimiento de beneficiarios con fondos de cooperación técnica y bajo la supervisión del Banco.	03/23/2017	01/30/2015
Output	Personas beneficiadas con estipendios	Modify Output	Se dirigieron fondos remanentes del componente tres a apoyos económicos para lograr financiar más inserciones laborales.	03/22/2017	03/20/2017
Outcome	Tasa de colocación de los beneficiarios del programa de apoyo de adultos	Modify Outcome Indicator	Debido a falencias del sistema de reporte del Minsiterio se acordó realizar una encuesta anual de seguimiento de beneficiarios con fondos de cooperación técnica y bajo la supervisión del Banco.	03/23/2017	01/30/2015
