

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1387	Chief of Operations Validation Date	03/29/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/26/19
Last Update	03/28/19	Country Representative Validation Date	04/27/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Present State Project: Citizen Security in Espírito Santo	Loan Number	3279/OC-BR
Executing Agency	Secretaria de Estado de Governo	Sector/Subsector	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	SERRANO BERTHET, RODRIGO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO ESPIRITU SANTO		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1387	56,000,000	56,000,000	14,000,000	0	70,000,000	56,000,000	5,821,701	10.40%	50,178,299
Aggregated	56,000,000	56,000,000	14,000,000	0	70,000,000	56,000,000	5,821,701	10.40%	50,178,299

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

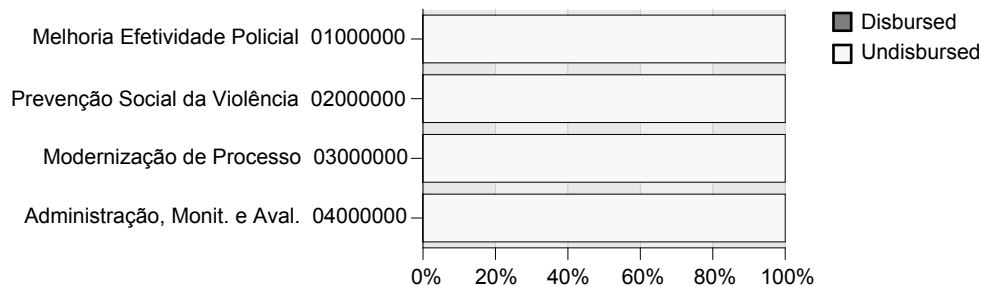

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Contribuir para a redução dos índices de crimes violentos (homicídios e roubos) em 09 municípios no ES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Homicídios nos 09 Municípios	Taxa por 100 Mil Hab.	49.70	2013	P	31.05	31.05
					P(a)	31.05	31.05
					A		0.00

Details

Means of verification: SESP

Observations: A taxa foi calculada em função de 1.133 homicídios em uma população total de 2.280.501. O monitoramento deste indicador como dos outros se realizara como parte da implementação do Programa. A metodologia para a projeção da meta para 2022 tem como referência o alinhamento nacional para a redução das taxas de homicídio que é de 5% ao ano. As taxas para 2018 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2013) e um impacto conversador de 20% considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vivo impacto atribuível de uma redução de 69% no número de homicídios; Diadema, alcançou redução de 85% de homicídios de jovens entre 16 a 20 anos de idade.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	Roubos nos 09 Municípios	Taxa por 100 Mil Hab.	694.90	2013	P	555.92	555.92
					P(a)	555.92	555.92
					A		0.00

Details

Means of verification: SESP

Observations: O número de roubos observado em 2013 foi de 15.847 nos 09 municípios, cuja população era de 2.280.501. Foram considerados os seguintes incidentes de roubos: roubo a pessoa em via pública, em transporte coletivo, em estabelecimento comercial, em residência e condomínio e de veículo. A meta de redução de taxa é de 20% em função dos programas de policiamento comunitário e de prevenção: Programa IGESP contribuiu com uma redução de 24% nos delitos contra o patrimônio, o que significa voltar à taxa observada em 2011.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Cidades beneficiadas com projetos de Segurança Cidadã	Subnational governments (#)	9.00	2015	P	9.00	9.00
					P(a)	9.00	9.00
					A		0.00
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
	Municipal				P	9.00	9.00
					P(a)	9.00	9.00
					A		0.00
	Subnational				P	9.00	9.00
					P(a)	9.00	9.00
					A		0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado 1: Aumentar a efetividade das Polícias Civil e Militar no controle e investigação da criminalidade violenta em 09 Municípios do Espírito Santo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Homicídios de jovens de 15 e 24 anos de idade nos 09 Municípios	Taxa por 100 Mil Hab.	130.40	2013	P	96.50	96.40
					P(a)	96.50	96.40
					A		0.00

Details

Means of verification: SESP

Observations: A taxa foi calculada em função de 533 homicídios com uma população total de jovens de 15 a 24 anos de 372.114. O monitoramento deste indicador e de outros será realizado como parte da implementação do programa. A projeção das taxas para (2020 e 2022) toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2013), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vivo impacto atribuível de uma redução de 69% no número de homicídios; Diadema, alcançou redução de 85% nos homicídios de jovens entre 16 a 20 anos de idade. A taxa foi calculada em função de 533 homicídios com uma população total de jovens de 15 a 24 anos de 372.114. O monitoramento deste indicador e de outros será realizado como parte da implementação do programa. A projeção das taxas para 2022 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2013), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Homicídios de jovens afrodescendentes de 15 e 24 anos de idade nos 09 Municípios	Taxa por 100 Mil Hab.	179.70	2013	P	125.60	125.60
					P(a)	125.60	125.60
					A		0.00

Details

Means of verification: SESP

Observations: No ano de 2013 havia nos 09 municípios 237061 afrodescendentes de 15 a 24 anos de idade. Destes, 468 foram vítimas de homicídio (estimativa com base no IBGE e Informação da GEAC/SESP-ES). A projeção das taxas para 2022 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2103), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vivo impacto atribuível de uma redução de 69% no número de homicídios; Diadema, alcançou redução de 85% nos homicídios de jovens entre 16 a 20 anos de idade. No ano de 2013 havia nos 09 municípios 412.907 afrodescendentes de 15 a 24 anos de idade. Destes, 468 foram vítimas de homicídio (estimativa com base no IBGE e Informação da GEAC/SESP-ES). A projeção das taxas para 2022 toma em conta a tendência de redução observada nos três anos (2011 a 2103), e um impacto conservador de 30%, considerando as intervenções propostas e os resultados alcançados em outros programas: Fica Vi

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	Investigação de homicídios esclarecidos no Espírito Santo dentro de 01 ano e enviados ao Ministério Público - Resolutividade de inquéritos de homicídios dolosos no Estado.	%	54.00	2014	P	66.00	66.00
					P(a)	66.00	66.00
					A		0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: SESP

Observations: Este indicador refere-se a porcentagem de todas as investigações de homicídios dolosos registrados pela Polícia Civil, nas quais: (i) - é identificado o autor material do crime; e (ii) - o caso é enviado à consideração do Ministério Público. Em 2014 foram instaurados 1.379 inquéritos de homicídios dolosos, dos quais 751 foram esclarecidos e enviados ao Ministério Público (fonte SESP - Fevereiro 2014). O dado da linha de base corresponde aos casos do Espírito Santo no ano de 2014. O impacto reconhece que o maior esforço para redução do estoque de investigações já foi realizado, e que o programa continuará seu esforço dentro da tendência observada entre 2011 e 2012 de um incremento anual de 4 pontos percentuais, e que o projeto terá como foco a melhora da qualidade das investigações. A meta proposta é consistente com o desempenho da Polícia Civil, no cumprimento dos objetivos do Programa Federal Meta 2 (alcançando a solução de 55% nos crimes em aberto cometidos antes de 2008), é consiste

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 0: Resultado 3: Reduzir a reincidência delitiva dos jovens

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Jovens egressos do ano anterior e que voltaram a ingressar aos centros IASES para servir uma nova medida de internação no Espírito Santo.	Taxa	48.80	2013	P	38.00	38.00
					P(a)	38.00	38.00
					A		0.00

Details

Means of verification: SEAE e IASES

Observations: Em 2012, havia 62 jovens com menos de 17 anos de idade cumprindo medida de internação, dos quais 30 retornaram ao IASES para servir uma nova medida de internação em 2013, o que significa uma taxa de reingresso de 48,8%. A meta foi estimada em função de que serão implementados serviços para apoio à reinserção social dos egressos e um impacto conservador de redução de 20%. Este impacto é consistente com a evidência internacional, que sugere uma redução de 53%. "Metodología de Tratamiento del Comportamiento Cognitivo de Infractores Jóvenes y Adultos", Lipsey, M. Landenberger, N.A., Wilson, S. J. (2007).

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 0: Resultado 2: Incrementar as oportunidades de inclusão social dos jovens entre 15 a 24 anos de idade, em condições de risco à violência

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.4	Roubos cometidos que tiveram como autor um jovem de 15 a 24 anos de idade nos 09 Municípios.	%	96.00	2012	P	77.00	77.00
					P(a)	77.00	77.00
					A		0.00

Details

Means of verification: SESP

Observations: A linha de base foi calculada em função de 08 municípios. A SESP fará atualização conforme os dados a serem entregues pelas Delegacias do Estados nos municípios e posteriormente será atualizada. A taxa de participação presume uma taxa de êxito de 20% como resultado dos programas de prevenção. Este resultado é consistente com a evidência preliminar vinculada ao uso produtivo do jovem em comunidades, que indica uma redução de 33%. "New pool programs help to reduce local crime", Smith, B. (1993), Recreation Exchange, vol. 5, no. 3. Resultado: O vandalismo e os roubos diminuíram me 85% graças ao Programa com o uso de Piscinas. A linha de base, em 96%, corresponde a 622 jovens de 648 casos de roubo com autoria identificada.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I - Melhoria da efetividade policial para o controle e investigação do crime

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1	1.1 - Módulos de Delegacia Online DEON/BAON e BI para estatística e análise criminal e Observatório da Violência desenvolvidos e implementados.	Módulos	P	1	14	200,000	5,736,772
			P(a)	1	17	200,000	8,674,401
			A	1	1	405,882	405,882
1.2	1.2 - Efetivos policiais capacitados em Policiamento Comunitário, atendimento à Comunidade, Direitos Humanos e Análise Criminal.	Efetivos	P	0	1,700	0	500,000
			P(a)	0	1,000	0	500,000
			A	0	0	0	0
1.3	1.3 - 30 núcleos de polícia comunitária implantados.	Núcleos	P	25	108	2,447,916	9,921,875
			P(a)	25	30	2,447,916	5,889,255
			A	25	25	2,490,267	2,490,267
1.4	1.4 - Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica do Espírito Santo, desenhado, construído, equipado e em funcionamento.	Centro	P	0	2	0	11,450,173
			P(a)	0	2	0	11,270,173
			A	0	0	0	0
1.5	1.5 - Fóruns comunitários de Segurança nos Bairros do Programa fortalecidos e em funcionamento.	Fóruns	P	0	26	0	141,180
			P(a)	0	30	0	140,000
			A	0	0	0	0
1.6	1.6 - Certificação Semestral do funcionamento adequado do controle interno e externo da polícia nos territórios do programa.	Certificate	P	1	10	75,000	250,000
			P(a)	1	10	75,000	250,000
			A	0	0	0	0
1.7	1.7 - Reformas e ampliação do Centro Integrado de Operações e Defesa Social (CIODES) Metropolitano e melhoria dos espaços de formação da Polícia Militar voltados à capacitação do efetivo em policiamento comunitário.	Unidades	P		0		0
			P(a)		2		1,276,171
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente II - Prevenção Social da Violência para a População Jovem

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1	2.1 - Rede de Centros de Cidadania Jovem de serviços de prevenção da violência juvenil nos 10 municípios do programa funcionando anualmente.	Redes	P	0	1	938,453	28,000,000
			P(a)	0	1	938,453	28,000,000
			A	0	0	91,425	91,425

Component Nbr. 3 Componente III - Modernização do Processo de Ressocialização

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
3.1	3.1 - Servidores públicos que atuam nos centros IASES capacitados.	Servidores	P	0	2,570	0	907,400
			P(a)	0	2,570	0	462,108
			A	0	0	0	0
3.2	3.2 - Modelo de atendimento aos jovens infratores desenvolvido e implementado anualmente.	Modelo	P	1	5	809,608	9,692,600
			P(a)	1	5	809,608	10,137,892
			A	1	1	197,127	197,127

Component Nbr. 4 Administração do Projeto

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
4.1	4.1. - Administração, monitoramento e avaliação do Programa.		P	1	5	250,000	3,400,000
			P(a)	1	5	250,000	3,400,000
			A	1	1	9,208	9,208

Total Cost

	Total Cost	P			4,720,977	70,000,000
		P(a)			4,720,977	70,000,000
		A			3,193,909	3,193,909

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.1 - Módulos de Delegacia Online DEON/BAON e BI para estatística e análise criminal e Observatório da Violência desenvolvidos e implementados.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
				Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
	1.2 - Efetivos policiais capacitados em Policiamento Comunitário, atendimento à Comunidade, Direitos Humanos e Análise Criminal.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/22/2019
				Modify Output name	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
						03/25/2019
						03/25/2019
	1.3 - 30 núcleos de polícia comunitária implantados.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/25/2019
						03/25/2019
						03/25/2019
				Modify Output name	KATIAS	03/25/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/25/2019
	1.3 - Equipamentos para os 26 núcleos de polícia comunitária implantados (inclui as bases móveis comunitárias, microônibus e ônibus implantados nos territórios de Ocupação Social).		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/21/2019
	1.3 - Equipamentos para os 30 núcleos de polícia comunitária implantados.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/22/2019
				Modify Output name	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
						03/25/2019
						03/25/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	1.4 - Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica do Espírito Santo, desenhado, construído, equipado e em funcionamento.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
	1.5 - Encontros Comunitários de Segurança nos municípios do Programa fortalecidos e em funcionamento.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/22/2019
				Modify Output name	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
				Modify Unit of Measure	KATIAS	03/22/2019
	1.5 - Fóruns comunitários de Segurança nos Bairros do Programa fortalecidos e em funcionamento.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Output	Modify Output name	KATIAS	03/25/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/25/2019
				Modify Unit of Measure	KATIAS	03/25/2019
	1.6 - Certificação Semestral do funcionamento adequado do controle interno e externo da polícia nos territórios do programa.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/21/2019
	1.7 - Reformas e ampliação do Centro Integrado de Operações e Defesa Social (CIODES) Metropolitano e melhoria dos espaços de formação da Polícia Militar voltados à capacitação do efetivo em policiamento comunitário.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto..	Create Output	N/A	KATIAS	03/22/2019
	2.1 - Rede de Centros Comunitários de serviços de prevenção da violência juvenil nos 09 municípios do programa funcionando anualmente.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/21/2019
	2.1 - Rede de Centros de Cidadania Jovem de serviços de prevenção da violência juvenil nos 10 municípios do programa funcionando	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia	Modify Output	Modify Output name	KATIAS	03/22/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	anualmente.	Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.				
	2.1.1 - Projetos executivos para os Centros de Cidadania realizados.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
	2.1.10 - Jovens que recebem Bolsas atuando como promotores dos centros de cidadania.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/21/2019
						03/22/2019
	2.1.12 - Programa de Valorização da Vida: acompanhamento dos jovens dependentes de álcool e drogas implementado	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/21/2019
						03/22/2019
	2.1.13 - Centros de acolhimento e acompanhamento de jovens dependentes de álcool e outras drogas implantados e em funcionamento	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Create Milestone	N/A	KATIAS	03/22/2019
	2.1.14 - Jovens atendidos com atividades itinerantes de esporte, cultura, métodos de resolução de conflitos, promoção de cidadania e direitos humanos, educação e qualificação profissional	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Create Milestone	N/A	KATIAS	03/22/2019
	2.1.15 - Jovens atendidos e acompanhados nos Centros de Cidadania Jovem com serviços de esporte, cultura, métodos de resolução de conflitos, promoção de cidadania e direitos humanos, educação e qualificação profissional.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Create Milestone	N/A	KATIAS	03/22/2019
	2.1.2 - Centros de Cidadania construídos.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	2.1.2 - Centros de Cidadania construídos.	Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
	2.1.3 - Centros de Cidadania equipados.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
	2.1.4 - Organizações da sociedade civil para gestão dos Centros de Cidadania contratadas.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
	2.1.5 - Jovens atendidos com serviços de esporte, cultura, recreação, métodos de resolução de conflitos e promoção de uma cultura de paz e desenvolvimento pessoal.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/25/2019
						03/21/2019
						03/22/2019
						03/25/2019
	2.1.6 - Jovens beneficiados em atividades escolares de aceleração e alfabetização (EJA)	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/21/2019
	2.1.7 - Jovens que recebem capacitação laboral.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/21/2019
						03/22/2019
	2.1.8 - Aquisição de veículo para transporte de apoio aos Centros de Cidadania.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/21/2019
	2.1.9 - Sistema para a gestão, monitoramento e	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da	Modify Milestone	Modify Financial EOP	KATIAS	03/22/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	avaliação da Rede implantado e em funcionamento.	Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.		P(a)		
	3.1 - Servidores públicos que atuam nos centros IASES capacitados.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/22/2019
	3.2 - Modelo de atendimento aos jovens infratores desenvolvido e implementado anualmente.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/21/2019
						03/22/2019
						03/22/2019
						03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/21/2019
						03/21/2019
	3.2.1 -Atividades de esporte, cultura e recreação para jovens internados implementadas.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/21/2019
						03/25/2019
	3.2.2 - Modelo de Práticas Restaurativa nas 13 unidades do IASES implantado	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Milestone name	KATIAS	03/21/2019
	3.2.3 - Atividades escolares de aceleração e alfabetização realizadas	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASSES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Milestone EOP to Autocalculated	KATIAS	03/21/2019
				Modify Milestone EOP to Not-Autocalculated	KATIAS	03/21/2019
				Modify Milestone name	KATIAS	03/21/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	3.2.3 - Atividades escolares de aceleração e alfabetização realizadas	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
	3.2.3 - Modelo da Nova Unidade		Modify Milestone	Modify Milestone name	KATIAS	03/21/2019
	3.2.4 - Atividades de capacitação laboral para jovens internados implementadas.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
	3.2.5 - Construção da nova Unidade de Internação Socioeducativa - UNIS, espaço para servidores do IASES entregues e em funcionamento e humanização das Unidades Socioeducativas	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Milestone name	KATIAS	03/22/2019
	3.2.5 - Construção unidade internação provisória de Linhares e reformas unidade internação de Montanha da Esperança, e espaços para servidores do IASES entregues e em funcionamento.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
	3.2.6 - 13 Unidades IASES equipadas em quatro etapas.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Milestone name	KATIAS	03/25/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/25/2019
				Modify Unit of Measure	KATIAS	03/25/2019
	3.2.6 - Unidade IASES equipadas.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	KATIAS	03/22/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/22/2019
	3.2.7 - Modelo de Revista	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito	Modify	Modify	KATIAS	03/22/2019

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Humanizada equipado e implementado nas Unidades de IASES.	Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Milestone	Financial EOP P(a)		
	3.2.7 - Modelos de Revista Humanizada equipado e implementado nas 13 Unidades de IASES em duas etapas.	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Modify Milestone	Modify Milestone name	KATIAS	03/25/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/25/2019
				Modify Unit of Measure	KATIAS	03/25/2019
	3.2.8 - Egressos do IASES acompanhados	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Create Milestone	N/A	KATIAS	03/21/2019
			Create Output	N/A	KATIAS	03/21/2019
			Delete Output	N/A	KATIAS	03/21/2019
	3.2.9 - Modelo de escolarização específica para as Unidades de Internação e Internação Provisória	Alterações realizadas em função da Missão de Supervisão no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo, ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, integrada pela equipe do Banco e as autoridades e servidores da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento; da Secretaria de Estado da Cultura; da Secretaria de Estado da Justiça; da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH); da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP); Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PM); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PC); Perícia Técnico-Científica (PTC); do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), do Instituto Jones dos Santos Neves e Equipe Técnica do Projeto (UGP). A Missão possibilitou também revisar as metas físicas e financeiras (PMR), com vistas ao cumprimento dos objetivos do projeto.	Create Milestone	N/A	KATIAS	03/22/2019
	4.1. - Administração, monitoramento e avaliação do Programa.		Modify Output	Modify Financial P(a) value	KATIAS	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	KATIAS	03/21/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
